

PORTADA O GUARDA EXTERIOR

Área productora de la documentación:

Dirección de Obra Pública

Responsable del archivo de trámite:

José Luis Flores Amastal

Clasificación archivística

Sección

7S Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Subsección

N/A

Serie

7S.0.5 Obra Publica

Subserie

7S.0.5.4 Evaluaciones Externas

Identificación de expediente

ACM-DOP/7S.0.5.1/FORTA-18-14

Descripción del expediente/asunto

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE TANQUE DE AGUA Y CALLE 7 DE DICIEMBRE.

Tradición documental

Original

X

Copia

X

Soporte documental

Papel / Físico

X

Electrónico

Fechas

De apertura

De cierre

Volumen

No. de fojas

No. de legajos

16/04/2018

02/07/2018

0312

1/1

Valor documental

Administrativo

X

Legal

X

Fiscal o contable

X

Vigencia documental (años)

En trámite

En concentración

Evidencial

Testimonial

Informativo

X

5

5

Carácter de la información

Fecha de clasificación:

Área:

Información reservada:

Periodo de reserva:

Fundamento legal:

Ampliación del periodo de reserva:

Confidencial:

Fundamento legal:

Rúbrica del titular del área:

Fecha de desclasificación:

Partes o secciones reservadas o
confidenciales:

Rúbrica y cargo del servidor público:



164

Dirección de Obras Públicas

0159

Licitación: OPC-R33-2018-005

Obra: Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Reforma entre Tanque de Agua y calle 7 de Diciembre.

Localidad: Cuautlancingo.

Acta de Fallo

Siendo las 10:00 hrs., del día 30 de Abril de 2018, estando reunidos en las Instalaciones de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en calle El Carmen No. 3, Colonia Estrellas del Mar, C.P. 72700, Cuautlancingo, Puebla, el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Para llevar a cabo el FALLO, Procedimiento de Licitación Pública Para la obra: No. FORTA-18-14 denominada: Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Reforma entre Tanque de Agua y calle 7 de Diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 46 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente y una vez analizadas las propuestas de los participantes y resumiendo las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautlancingo Puebla. A razón de la evaluación dada las propuestas rechazadas se sustentan en los Artículos 36 fracción I, párrafos primero y tercero, 48 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Este Comité tiene a bien otorgar el Fallo de Asignación de Obra No. FORTA-18-14 de conformidad a las bases de Licitación No. OPC-R33-2018-005, al Ing. María Silvia Arroyo Bass Persona física con Actividad Empresarial, quien presentó su propuesta más baja y es solvente para la realización de los trabajos requeridos con el siguiente monto de \$ 2,271,738.12 (Dos Millones Doscientos Setenta y Un Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 12/100 M.N.) I.V.A. incluido. La fecha de inicio de los trabajos, será el día 04 de Mayo de 2018 y la fecha estimada de terminación será el día 02 de Julio de 2018. El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales; sin embargo el licitante podrá comprometerse a terminar los trabajos de obra en el tiempo menor especificado. En base a lo establecido en el artículo 54 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma se otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestal aprobada para el inicio de los trabajos. El licitante ganador deberá constituir las garantías de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, no obstante, deberá de presentar ante la Tesorería del Municipio de Cuautlancingo relativa al cumplimiento del contrato, para que formalice con este H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, el día 02 de Mayo de 2018, se firma el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado correspondiente a los trabajos.

Para constancia de los efectos legales inherentes firman el presente documento quienes intervinieron en dicho acto.

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Presidente



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. José Félix Casiano Tlahqué
Presidente Municipal Constitucional 2014 - 2018
Presidente del Comité de Obra y S.R.M

Dirección de Obras Públicas

0160



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

C. José Manuel Arturo Sánchez Cid
Contralor Municipal
2014 - 2018

Director de Obras Públicas



G.P. G. Gabriel Marcial Atempa

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018**

Por las Empresas Participantes



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE
2014 - 2018

o.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física	Firmas
1	C. Edgar Santos Hernández Representante Legal de Constructora y Comercializadora Santos & Santos SA de CV	
2	Ing. María Silvia Arroyo Bass Persona física con Actividad Empresarial	
3	C. Carmen Helena Aguilar Lugo Representante Legal de Corporativo DACMV SA de CV	

Fecha: 4 mayo 2018

No. 04

Con esta fecha se apertura la presente bitácora para la obra denominada: "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Reforma entre trunque de agua y calle 7 de Diciembre." en la colonia Nuevo León.

Contratista: María Silvia Arroyo Bass

No. Contrato: FORTA-18-14 Monto: \$2'271,738.12

Periodo de ejecución: 4 mayo al 2 julio, 60 días naturales


El H. ayuntamiento a través del departamento de obras públicas asigna a la Arquitecta Estela Lopez Mendora para la supervisión de la obra antes mencionada.


1.- Se inicia con la limpieza, trazo y nivelación referenciando los banos de nivel.

2.- Se hace un cadeneramiento del tramo 0+000 con el trunque de agua e inicia en donde termina el adoquin y el cadeneramiento 0+570 en donde finaliza los límites de Cuatlamanga y Santa Barbara (San Pedro Chidula).

Con un promedio de 7mts libros de calzada mas las guarniciones.

3.- Se inicia con el corte en caja con motorizada.


Ing. María Silvia Arroyo Bass


Arq. Estela Lopez Mendora

Fecha:

9 mayo 2018

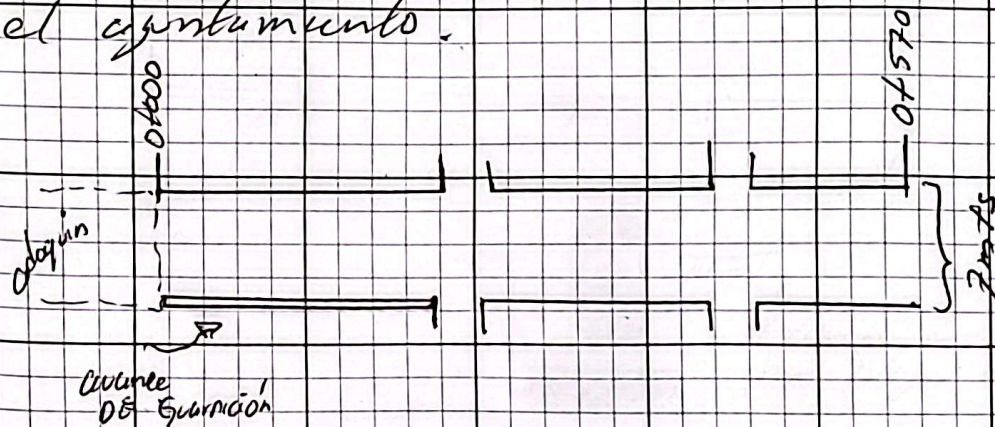
0291

No.

02

Con esta fecha se informa a la supervisión que se reporta un avance en las guarniciones de lado derecho del codenamiento 0+000 al 0+140. Se presentó al laboratorio a tomar muestra de concreto con una resistencia $f'_{c} = 150 \text{ kg/cm}^2$. Se continúa con la excavación en cega para alojar las guarniciones del lado izquierdo.

También se informa el corte en caga y se reporta un avance de 100 mts lineales y el material producto de la excavación se dispone en el banco de tiro asigando por el asentamiento.



~~Ing. María Silvia Arroyo Bass~~
Contratista.

s/o

~~Ing. Iván Viqueiro Ortiz~~
~~Ing. Estela Mancera López~~
Supervisores de
Asentamiento

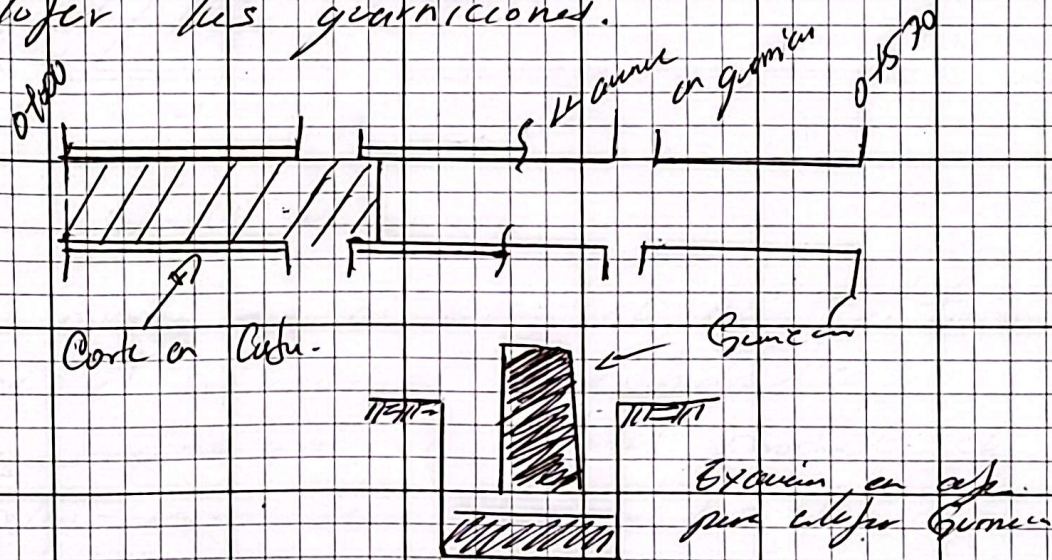
Fecha: 15 mayo 2018


0292


No. 03

Con esta fecha se informa a la supervisión que se presenta al laboratorio CH ingeniería para tomar las muestras de concreto en las guarniciones del lado izquierdo y se informa que se tiene un avance del tramo 0+200 al 350 lado izquierdo.

También se informa que se tiene el corte en caja al km 200, y se continúa con la excavación en caja para colocar las guarniciones.

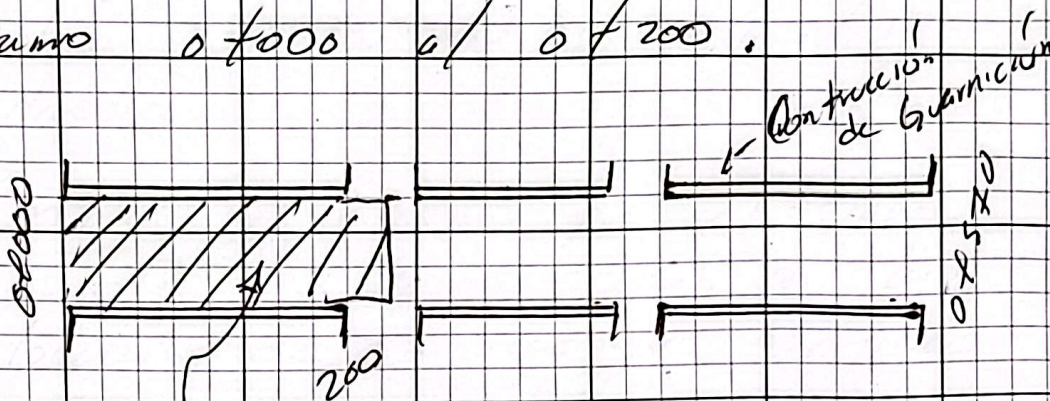



Mariana Silva Carrasco Bess


Estela López Mendoza

Fecha: 18 mayo 2018


Con esta fecha se informe a la supervisión que se ha terminado de colocar las guarniciones al um 570 por ambos lados, tambien se informa que se presente al sitio de los trabajos el laboratorio CH ingenieria para la revisión del terreno natural del tramo 0+000 al 0+200.




Umbral en T.H.

Se informe que el laboratorio libera el tramo para el suministro de base hidráulica.

Se informa que el material producido de excavaciones se coloca en los bancos de tiro.


Ing. Mario Silva Carrero


Arg. Estela Mandoz Lopez

Fecha:

23 mayo 2018

0294


No.

05


Con esta fecha se reporta a la supervisión un avance del ordenamiento 01000 al 0104300 en cuanto a la compactación del terreno natural al 95%.

Se informa que asistió el laboratorio CH ingeniería para liberar los tramos y continuar con los trabajos en la base hidráulica.


Además se informa que el tramo siguiente los vecinos siguen con la colocación de sus descargas sanitarias y que posteriormente la empresa compactará la zona que se realizó.


Mr. Silvia Arroyo Bass

Contratista



Eng. Estela Mendoza Lopez

Supervisor





Con esta fecha se reporta un avance de obra sobre el terreno natural del 100%, y se informa que se presenta el laboratorio para liberar la resante del proyecto hasta el km 0+50.

Se informa que se continua con el suministro de base hidráulica y q' se sigue con la compactación de la misma.



Se informa que se presento al comité de obra y solicita la colocación de poste de semáforo y topes. Se le informo que esta situación no era correcta y que se solicite a la entidad su respectivo dictamen.


 Ing. Mario Silva Arango Bass
 Contratista


 Ing. Estela Huadza Lopez
 Supervisor


Fecha: 6 Junio 2018

02960. 07


Con esta fecha se informa que se
presentó a la obra el laboratorio
CH ingeniería y la supervisión, la Ing.
Estela Mendoza, y por parte de la
empresa la ing. Maria Silvia Arroyo Bass
para revisión de la base del tramo
que comprende el km 0+000 a/
0+300.

Por parte del laboratorio hace 3 calas
y da por libando los trabajos para
poder continuar con el proceso de
construcción.

Se informa que se ha terminado de
taper los drenajes que se concretaron
en el km 0+450 a/ 0+570.


Ing. Maria Silvia Arroyo Bass


Contratista



Ing. Estela Mendoza


Supervisión

Con esta fecha se informa que la obra se presentó el laboratorio CH ingeniería para liberar la compactación de la base hidráulica en el tramo que comprende del Km 0+300 al 0+570.

Se informa que los próximos días se reanudarán los pozos quedando 7cm por encima del nivel de la base para alcanzar los niveles de proyecto y de la superficie de rodamiento.


Ing. Melissa Arango Buss


Org. Estela Lopez Mendonza

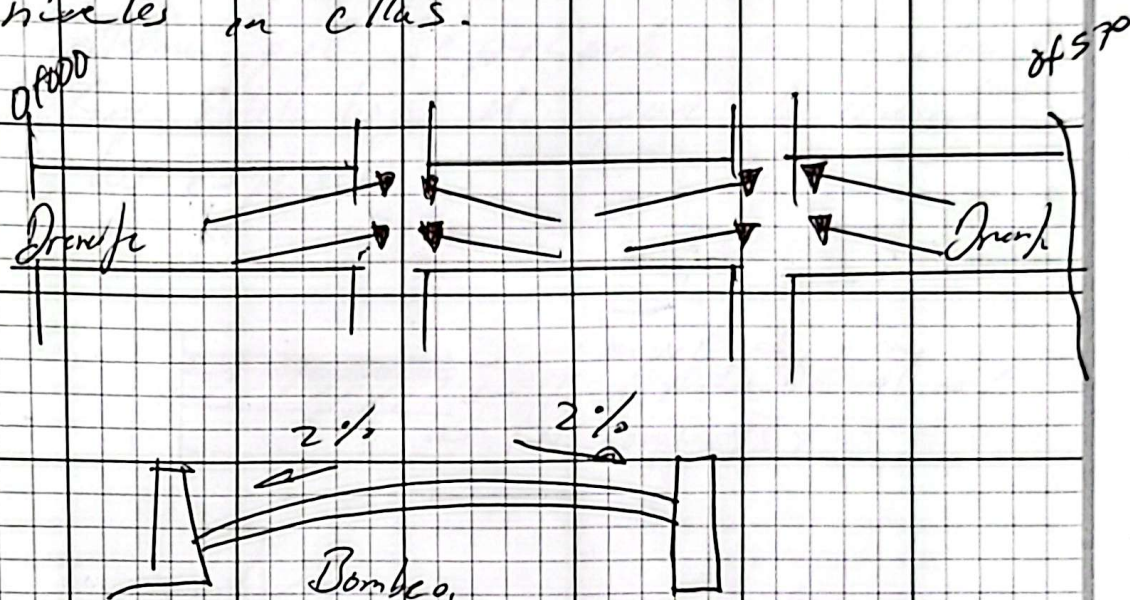



Fecha:


15 Junio 2018


029809

Con esta fecha se informa que se ha comenzado a la colocación del riezo de sello, y se revisa la nivelación para las pendiente de agua, así como los pozos y brachos que se enciende ya terminado. se hace una revisión de las guarniciones y niveles en ellas.




Ing. María Silvia Arango B.


Dr. Estela Lopez Mendez




Fecha: 19 Junio 2018

No. 10

Con esta fecha se informa que se ha tendido un total de 200 metros lineales de Carpeta asfáltica de 7 cm de espesor. Se tendió en dos cuerpos de 3.5 mts de ancho.

Se informa que hizo presencia el laboratorio para la toma de muestra de la carpeta.


Se informa que se presenta a la obra la Arq. Estela Lopez M. para la revisión de los planos.



~~134~~

~~Problemas de obra~~

Ing. María Silvia Arroyo Bass Arq. Estela Lopez M.



23

23 Junio 2018

0300


11

Con esta fecha se informa que se han colocado hasta el momento 3 brachos y en el tramo que se encuentra en proceso de asfalto.


Se reporta un avance del tramo del km 0+200 al 0+400 por ambas curvas del camino.

Se informa que cumple las pendientes y controla el agua hacia las calle principales del lado izquierdo.

Se informa que se presenta el conteo de obra y solicita la colocación de topes en las pocas calles, se informa que ese concepto no se encuentra en los alcances del contrato, por lo que se sugiere, asistir al vicelocal para solicitar un dictamen, quien es el area correspondiente.


Ingrid Maria Silota Araya B.

Contratista
Bass Ingenieros



Rg. Estela Lopez Mendoza

Supervisión del
cemento.

27 Junio 2018

0302

Con esta fecha se informa que hasta la fecha se lleva un avance de obra del 80% que comprende del km 0+000 al 0+570, se informa que sobre Orquesta castañica por lo que a petición del comité de obra solicite topes pero no en la boca calle, solo se coloca 2 topes de los 8 solicitados, y estos se ubican en las dos partes iguales del tramo en cuestión.


Se informa que se ha concluido con la colocación de Orquesta castañica teniendo un total de 3190 m² con un ancho promedio de 7 mts, un cobramiento total de 0+000 al 0+570.

Se informa que hasta la fecha no se ha encontrado ningún contratista. Por lo que se cumple con el avance de la obra.

34

[Signature]

Ing. María Silvia Orrego B. - Ing. Estela Lopez M.



Fecha:

2 Julio 2018



0302 No. 13

Con esta fecha se informa que se presente a la obra la Orquidea Estela Lopez Manduca y la ingeniero Maria Silvia Arango Bass para corroborar los trabajos y entrega de la misma.

Se informa que se termino con la limpieza general de obra, tambien se informa que se coloco pintura en ambos lados de las guarniciones.

Tambien se colocaron flechas y marcos en los cruces de calle, tambien se informa que se coloco al centro de la via para la separacion de carriles.


Se informa que se entrega la estimación correspondiente y el Presupuesto para su revisión. Se pide se notifique la verificación de los trabajos para cierre de la presente.



Ing. Maria Silvia Arango Bass
Orq. Estela Manduca Lopez

4 Julio 2018

Con esta fecha se informa que se presenta a la obra el ingeniero María Silvea Araya B. por parte de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, así como la eny. Estela Lopez mandosa encargada de la supervisión de los trabajos para dictaminar que después de la reunión y medición no se encuentra diferencia alguno de lo contratado vs lo real efectuado.

Siendo las 13:30 hrs del día 4 de julio se cierra la presente Bitácora y se entrega el acta - entrega por tramite de scania correspondiente.


Ing. María Silvea Araya B.


Ing. Estela Lopez Mandosa
