

Dirección de Obras Públicas

0152

Licitación: OPC-R33-2018-006
Obra: Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Uranga entre Av. México- Puebla y calle San Lorenzo.
Localidad: Cuautlancingo.

Acta de Fallo

Siendo las 11:00 hrs., del día 30 de Abril de 2018, estando reunidos en las Instalaciones de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en calle El Carmen No. 3, Colonia Estrellas del Mar, C.P. 72700, Cuautlancingo, Puebla, el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Para llevar a cabo el FALLO, Procedimiento de Licitación Pública Para la obra: No. FORTA-18-15 denominada: **Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Uranga entre Av. México- Puebla y calle San Lorenzo.**

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 46 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente y una vez analizadas las propuestas de los participantes y resumiendo las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautlancingo Puebla. A razón de la evaluación dada las propuestas rechazadas se sustentan en los Artículos 36 fracción I, párrafos primero y tercero, 48 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Este Comité tiene a bien otorgar el Fallo de Asignación de Obra No. FORTA-18-15 de conformidad a las bases de Licitación No. OPC-R33-2018-006, al C. Edgar Santos Hernández Representante Legal de **Constructora y Comercializadora** quien presentó su propuesta más baja y es solvente para la realización de los trabajos requeridos con el siguiente monto de **\$ 4,229,148.31 (Cuatro Millones Doscientos Veintinueve Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 31/100 M.N.) I.V.A. incluido.** La fecha de inicio de los trabajos, será el día 04 de Mayo de 2018 y la fecha estimada de terminación será el día 02 de Julio de 2018. El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales; sin embargo el licitante podrá comprometerse a terminar los trabajos de obra en el tiempo menor especificado. En base a lo establecido en el artículo 54 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma se otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestal aprobada para el inicio de los trabajos. El licitante ganador deberá constituir las garantías de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos, no obstante, deberá de presentar ante la Tesorería del Municipio de Cuautlancingo relativa al cumplimiento del contrato, para que formalice con este H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, el día 02 de Mayo de 2018, se firma el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado correspondiente a los trabajos.

Para constancia de los efectos legales inherentes firman el presente documento quienes intervinieron en dicho acto.

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Presidente

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. José Félix Casiano Tlahque
Presidente Municipal Constitucional

to
ix
z,
El
y

le
á
te
la

3-
e

1



IDENCIA
MUNICIPAL

ANCINGO, PUE
4-2018

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Dirección de Obras Públicas

0153

Presidente del Comité de Obra y S.R.M



C. José Manuel Arturo Sánchez Cid
Comisario Municipal




CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018

Director de Obras Públicas



DIRECCIÓN
C.P. G. Gabriel Marcial Atempa
OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018

Por las Empresas Participantes

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física	Firmas
1	Ing. Sergio Almeida Jiménez Persona física con Actividad Empresarial	
2	C. Edgar Santos Hernández Representante Legal de Constructora y Comercializadora Santos & Santos SA de CV	
3	Ing. María Silvia Arroyo Bass Persona física con Actividad Empresarial	

Fecha 04 / Mayo / 2018

Folio N° 00 // Anexo N°


0286


Con esta fecha se apertura la presente bitácora para la obra "Rehabilitación con concreto Hidráulico de la calle Uranga entre av. Mexico Puebla y calle San Lorenzo". Con el número de contrato: FORTA-18-15, con un monto de \$ 4,229,148.31 y que se celebra con la comercializadora Santos y Santos Representada por el Ing. Edgar Santos Hernandez, quien impuso como residente de obras en la cual se lleva a cabo en un periodo de 60 días, iniciando el 04 de mayo y terminando 02 Julio.

Por parte del Ayuntamiento se presenta Ap. Ing. Luis Vazquez Ortiz. quien sera el supervisor de Obra.

Por el Ayuntamiento

Contratista


 Ap. Ing. Luis Vazquez Ortiz
 Residente de Obra


 Ing. Edgar Santos Hernandez
 Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

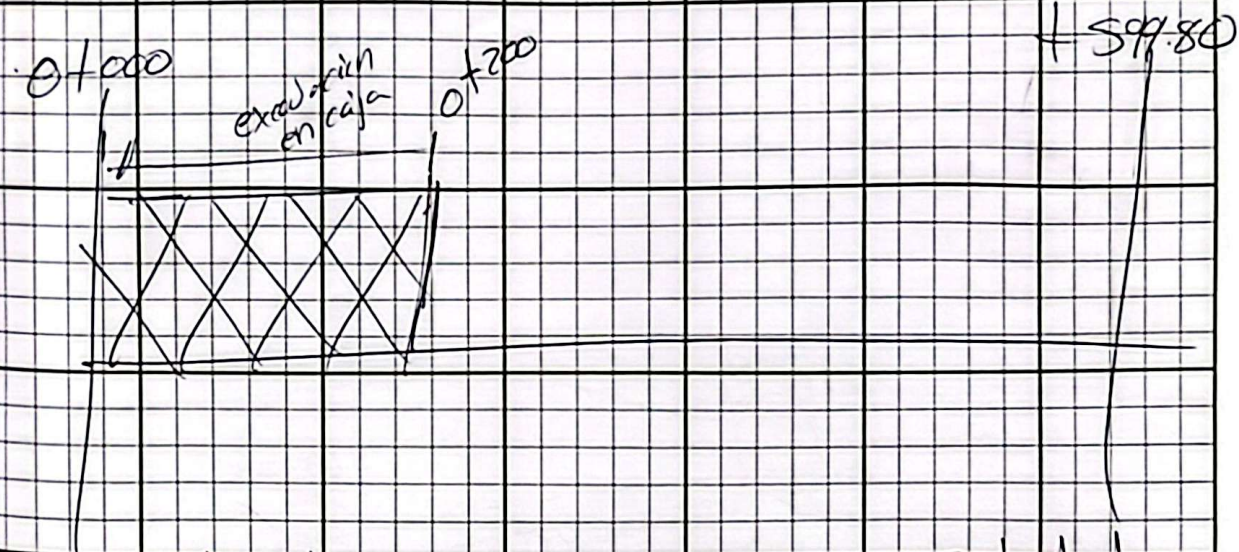
Fecha 08 / Mayo / 2018

Folio N° 002 / Anexo N°

0287

Nota: 002

Con esta fecha se informa la supervisión que se lleva un avance en la demolición del remanente del tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 0+300. Y que el material producido de la demolición se ha dispuesto en el banco de material asignado por el ayuntamiento. También se informa que se lleva una excavación en caja al 0+000 al 0+200.



Agente de Obra

Controlista

Arg. Irving Noguera Ochoa

Ing. Edgar Santos Hernández

Elaborado por:

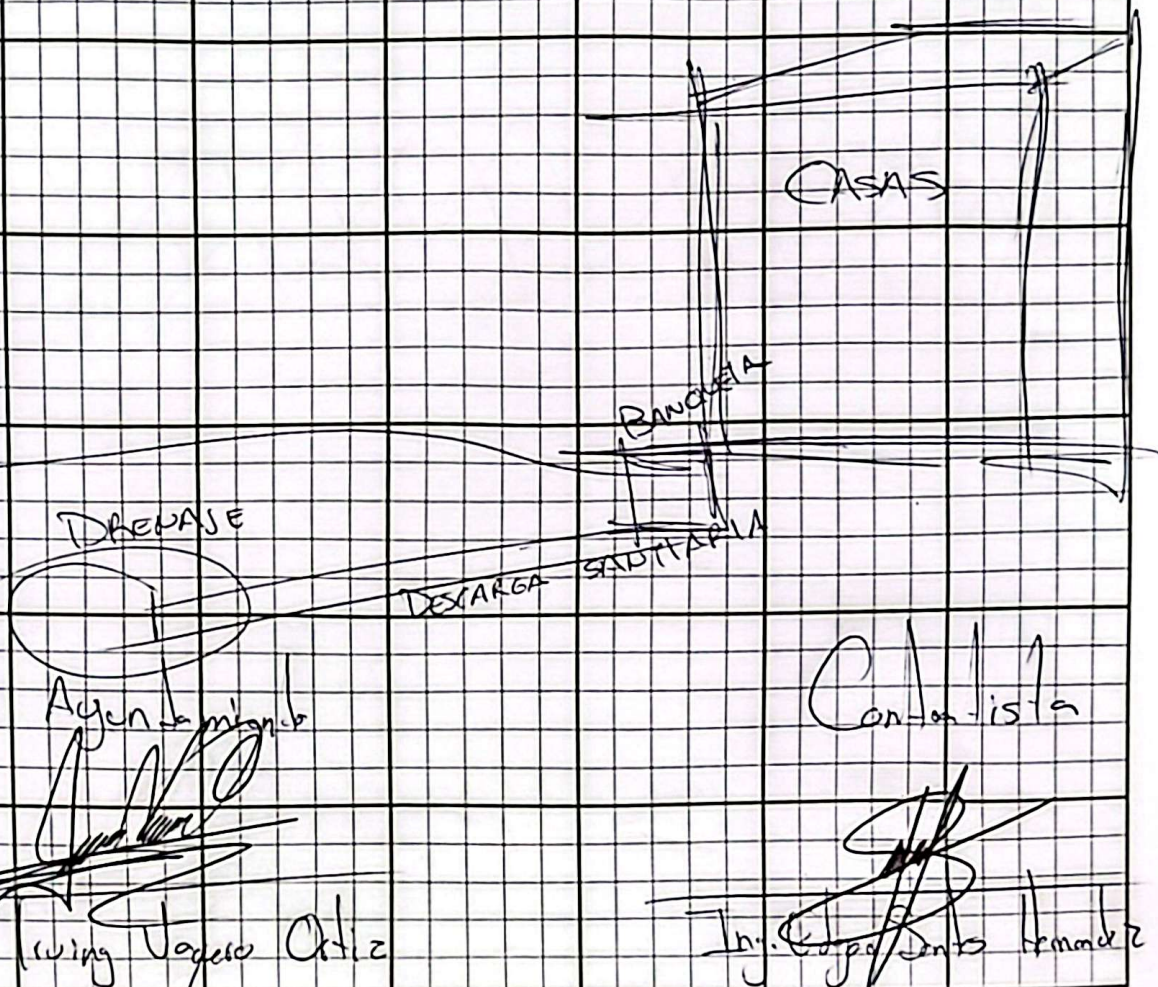
Recibido por:

Fecha 12 Mayo / 2018

Folio N° 003 / Anexo N° 0238

Nota: 003

Con cada fecha se informa la supervisión que se lleva un avance en la demolición al km. 0+500 y también se informa el avance en obra al 0+400. se informa que aplicación de los vecinos se dirige para creación de bombas y conexión al drenaje Sanitario.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 16 Mayo / 2018

Folio N° 004 / Anexo N°

0289

Nota: con

Con esta fecha se informa el termino de la demolicion de concreto llegando al Km. 594.80 al igual se informa que la excavacion en caliza llega a su fin al igual llegando a los 594.80.

0+000

+594.80

Agen-termino

Contratista

Arg. Iván Vargas Ortiz

Ing. Edgar Santos Hernandez

Elaborado por:

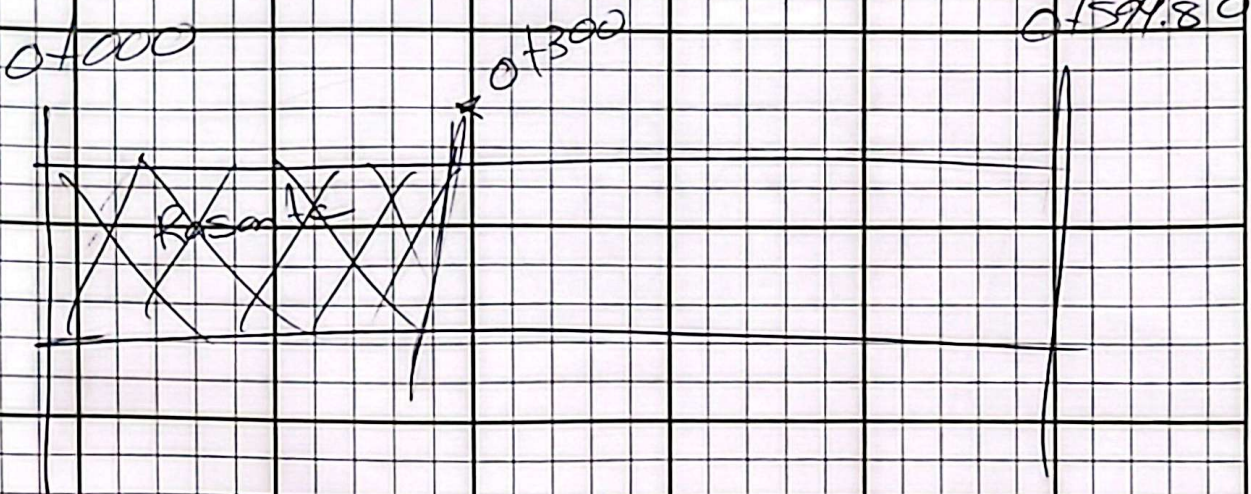
Recibido por:

Fecha 23 / Mayo / 2018

Folio N° 005 / Anexo N° 0290

Notas:

Con esta fecha se informa el termino de la excavacion en caja y se hace notificacion de la intrusion del laboratorio para toma de muestras de caja. asi mismo se notifica se continúe con el rasante al Km 200.00



Ayudemiendo

Contratista

Ing. Edwin Lopez Ortiz

Ing. Edgar Soto Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 26 / Mayo / 2018

Folio N° 006 / Anexo N°

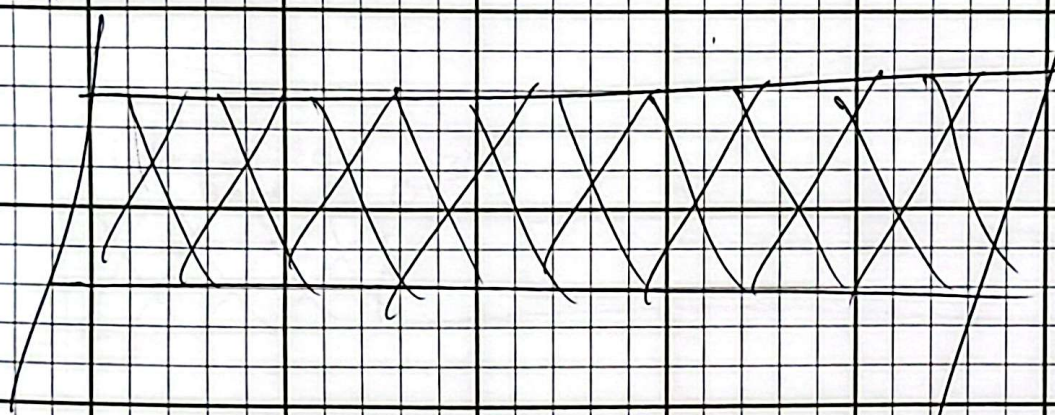
0291

Nota: 006

Con esta fecha se informa el termino de 0+300 al Km 0+594.80, en el cual se presenta a la Intervención el laboratorio para la toma de muestras de resaca. Para medir el grado de compactación de la resaca de 0+300 al 0+594.80.

0+000

0+594.80



Argentiniano

Controlado

Arg. Uruguay
Uruguay Ortiz

Ing. Edgar Soto Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 29 / Mayo / 2018

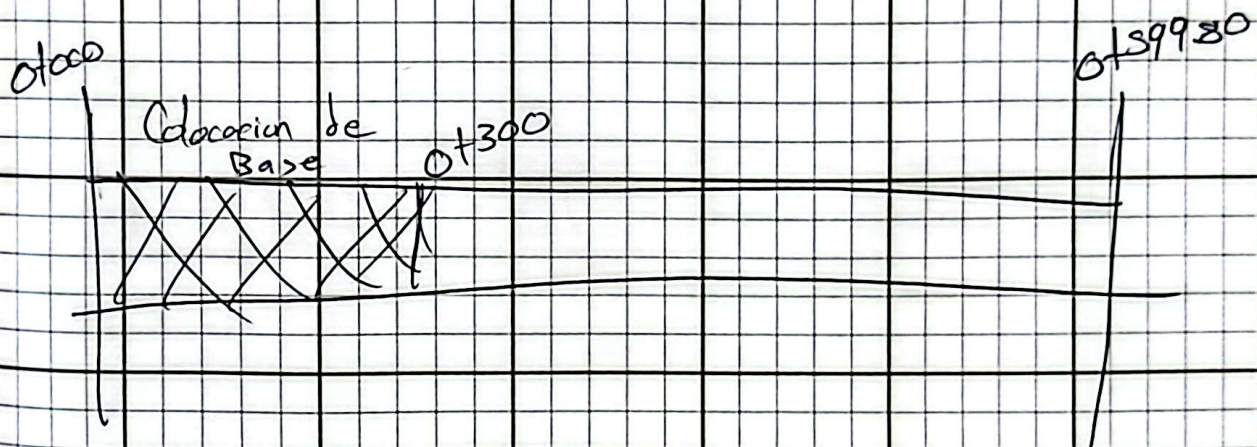
Folio N° 007 / Anexo N° :

0292

Nota: 007

Por la presente nota se informa el suministro y tendido de la base hidráulica al km. 0+000 al 0+300.

Se informa que se presente al Ing. Loring Vazquez Ortiz para la supervisión de los materiales.



Ing. Loring Vazquez Ortiz

Contratista

Ing. Loring Vazquez Ortiz

Ing. Edgar Soto Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 01 / Julio / 2018


Folio N° 003 / Anexo N°

0293

Wlo: 008

Por la presente no se informa se informa
la colocación de Base hidráulica y el laboratorio
hace inspección para obtener muestras y del liberar
la base. Se informa.


La realización de pozos de visita de alta densidad.



Aguilante

Contraste


Arq. Irving Lopez Ortiz


Ing. Edgar Santos Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 07 Mayo / 2016

Folio N° 009 / Anexo N°

0294

Nota: con


Por la presente note se informa que se terminó el suministro, tendido y compactación de Base hidráulica dando un tramo total de 0400 mts + 594.80.

Así mismo el laboratorio termina de recolectar sus muestras.

0400

BASE HIDRAULICA

0/599.80



Ayudante

Contratista


Ing. Iván Viquez Ortiz


Ing. Edgar Santos Hernández

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 11 / Junio / 2018

Folio N° 010 / Anexo N°

0295

Nota: 010


Con la Presente nota se informa se ha finalizado el rigo de Sello, y se continua con el rigo de liga de 0150 al 01350. asi mismo tambien se informa hizo presencia laboratorio Gylh Ingente para la toma de muestras del concreto del Armo antes mencionando.


Se informa qe se continua con el corte de losa con el calmemiento 01000 al 01750.



Ayuntamiento

Controlista

Arg.  Edgardo Viqueza Ortiz

Ing.  Edgar Santos Hunder

Elaborado por:

Recibido por:

205

Fecha 14/ Junio / 2018

Folio N° 011/ Anexo N°

0296

Nota: 011

Se informe por la presente nota se libera el tabuchado del lado izq. 0100 al 0190 del colado y se continua con el corte de losa 350 al 510.

Ayuntamiento

Contratista

Arg. Arving Vagueros Ortiz

Arg. Edgar Santa Hernandez

18/ Junio / 2018

Nota: 012

Se informa por la presente nota se libera el lado izq. dado un cadena mienta de 0190 al 510.00 asi mismo se informa se continua con el colado del lado derecho.

Ayuntamiento

Contratista

Arg. Arving Vagueros Ortiz

Arg. Edgar Santa Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 22 / Junio / 2018

Folio N° 013 / Anexo N°

0297

Obra: 013

Por la presente nota se informa se continua con el colado de lado izq. de tramo S10 al S99 al lado derecho igual queda terminado.

Asi mismo se menciona que las Pruebas de laboratorio terminaron y se comienza con la limpieza de toda la obra.


0000

0159950

lado Izquierdo

Ayuntamiento

C. A. H. S. / 2


Ing. Jorge Vazquez Ochoa


Ing. Edgar Santos Andrade

Elaborado por:

Recibido por:

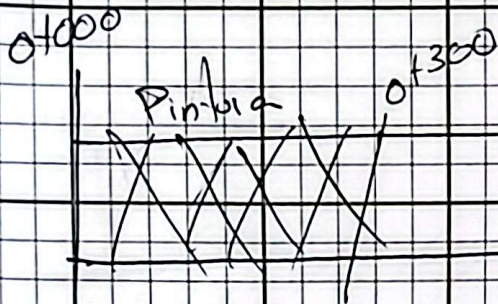
Fecha 27 / Junio / 2018

Folio N° 014 / Anexo N°

No. 014

0298

Por la presente se informa se continua con la limpieza de toda la obra. asi mismo se da inicio a la colocacion de la pintura a los primeros 300 Km.



Agendado

Contratista

Arq. Irving Noguera Ortiz

Ing. Edgar Santos Amador

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 30 / Junio / 2018

Folio N° 015 Anexo N°

0299

Nota: 015

Por la presente note se informa se continua con la colocacion y suministro y pintura. Terminado hasta los \$99.80. asi mismo se continue a la Supervision por el Arg. Inyng Vazquez Ortiz para realifcar los trabajos de la obra.

\$0.000

\$99.80

Ayuntamiento

Contratista

Arg. Inyng Vazquez Ortiz

Inyng Edgar Soto Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 02 / Julio / 2018

Folio N° 016 / Anexo N°

0300

Folio: 016

Por la Presente nota se informa que se han terminado todos los trabajos llegando a una superación de la ejecución de los trabajos, así mismo se procede al cierre de notas de la bitácora. Para poder Reditar el Finiquito de Obra.

Agradeciendo

Contratista


Ing. Irving Vazquez Ortiz
Ing. Edgar Santos Hernandez

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 03 / Julio / 2016

Folio N° 017 / Anexo N°

Nota: 017 0301

Obr: Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Calle
Uruanga entre la calle A.V. Mexico Puebla y Calle San Lorenzo".

No. de obra: FORTA - 18 - 15


Con esta fecha se informa que después de haber realizado
la supervisión y medición los trabajos ejecutados de
toda la obra.


"Rehabilitación con concreto Hidráulico de la Calle Uruanga
entre A.V. Mexico Puebla y calle San Lorenzo".

Con la presencia del comité de obra, asimismo
se realizaran los tramites correspondientes para el
finiquito de obra, se procedera a la presente
Bitácora conformada por 017 notas y 017 hojas
útiles.

Aguatemiento

Contratista


Arq. Víctor Nájera Ortiz
Residente de obra


Ing. Edgar Flores Hernández
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:
