


Nota # 13

Con esta fecha se suministra base del banco "Tante" una vez que se a avalado por parte del laboratorio.

Se comenta que mientras Sean suministrados los materiales y acarreos de base para la calle, son detalladas las guarniciones y se limpian con cepillo de alambre para retirar el aceite quemado pegado sobre la superficie debido a la protección de la simbra.

Se continua con la simbra de guarnición en ambos lados del o+240 al o+280.



Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Nota #16


Se realiza la excavación a mano para la construcción de guarniciones con el tramo del ot 280 al ot 292.97 en ambos lados.

Se llega al nivel de subrasante en el tramo del ot 100 al ot 240. Se afina y se compacta. Se solicita al laboratorio checar el % de compactación y liberarnos la capa para poder suministrar base hidráulica.

El laboratorio hace sus calas y da un resultado de 95.8 % de compactación.




Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 17

Con esta fecha se inicia el suministro del material para base hidráulica del ot 100 al ot 240.

Se inicia con el corte en caja del ot 240 al ot 292.97 así como el retiro del material producto de la excavación al banco de tiro propuesto en proyecto.

Se realiza el colado de la guarnición del ot 280 al ot 292.97 en ambos lados con esto se da por terminado el total de construcción de guarnición en todo el tramo.

Ing. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente

Arq. Joaquín Rosano Roso
Residente de obra

Nota # 14


Se continua con la excavación en capa para llegar a nivel de Subrasante del 0+100 al 0+240 así como el retiro del material producto de la excavación al banco de tiro.


Se realiza el tendido del material suministrado base hidráulica con la motoconformadora no sin antes darle el tratamiento, revolver y acamellonar dicho material y agregarle agua hasta obtener su humedad óptima para posteriormente ser tendida sobre la superficie.

Se colocaron también los niveles necesarios a lo largo y ancho de este tramo, verificando espesor y pendiente, longitudinal y transversal de acuerdo a como lo indica proyecto.

Una vez tendida el material se procede a la compactación de la base con el vibrocompactador en toda el área terminada.

Durante todo este proceso se cuida la humedad óptima del material.


Ing. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquin Rosano Razo
Residente de obra

ESTR.

Fecha: 20 - 08 - 2021

BITÁCORA DE OBRA

000179

No.

Nota # 15

Con esta fecha se le solicita al laboratorio que Verifique la compactación de dicho tramo para que quede liberado, el personal del laboratorio hace sus calas y nos indica que la compactación de 96.5 % con lo cual la capa del tramo 0+000 al 0+100 queda liberado para Continuar con los demás trabajos correspondientes.

Se continua con la excavación en caja en el tramo del 0+100 al 0+240.

Se realiza el colado de la guarnición del 0+240 al 0+280 en ambos lados.

Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente

Ara. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 01

APERTURA DE BITÁCORA.

Siendo las 9:00 horas del día, reunidos en el lugar de la obra, privada revolución de la localidad de Sanctorum, Cuautlanango Pue. los representantes de la Contratante y Contratista con el fin de realizar la apertura de la presente "Bitacora de Obra" de conformidad con el artículo 63 de la ley de obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

Nombre de la Obra: Adoquinamiento de la Privada Revolución entre Privada Revolución y Calle Calvario
Localidad de Sanctorum, Cuautlanango Pue.
No de Contrato: MCP-DOP/FORTA-21-17

Importe del Contrato: \$ 1,482,684.81. Con millón Cuatrocientos Ochenta y dos mil Dieciochos ochenta y Cuatro pesos 81/100 m.u).

Fecha de Inicio: 2 de Agosto del 2021

Fecha de Término: 15 de Septiembre del 2021.

Contratista: Constructora Tiyaca S.A de C.V.

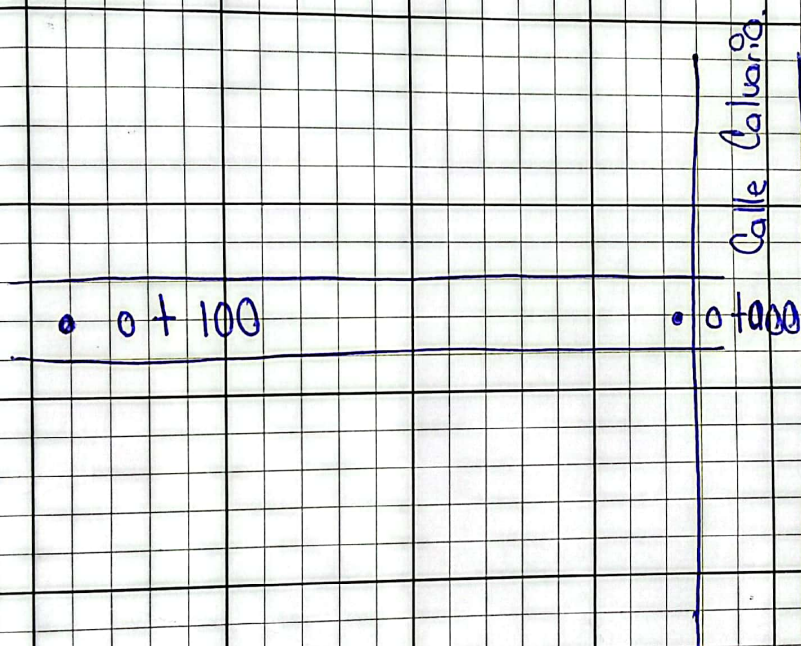
Administrador Unico: Israel Cuaya Chiquito


Contratante: Hl. Ayuntamiento de Cuautlanango, Pue.


Tomando en Consideración que la presente Bitacora es el instrumento técnico del Control de los trabajos el cual servirá como medio de comunicación Convencional entre las partes que firman el contrato y estará Vigente durante el desarrollo de los trabajos y al que referir los trabajos.

Nota # 2

Con esta fecha se inician los trabajos de la obra "Adoquinamiento de la Privada Revolución" entre Privada Revolución y Calle Calvario - Mopnerá. Se inicia con la limpia y trazo entre los Cadena-
mientos ~~0+00~~ al 0+100.
Actualmente los trabajos se hacen con una Retro Excavadora.




Ing. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosendo Roza
Residente

Fecha:


3/08/2021

No.

Nota # 3

Se continua con la limpieza y retiro de la maleza que hay a los lados de la calle para dar con el ancho marcado en el proyecto del adoquinamiento a +000 a 0+100

Así misma se empieza con la excavación de para alear la guarnición del lado derecho del Km 0+000 al 0+060.




Ing. Rubén García Bancelas
Superintendente


Arq. Jacuín Rosendo Razo
Residente


Fecha:


4 / 08 / 2021

No.

Nota # 4

Se realiza Excavación para alojar la guarnición del lado izquierdo del Cadenamiento ot 000 al ot 060 así mismo se empieza con la colocación de cimbra para guarnición del lado derecho entre el Cadenamiento ot 000 al ot 060.




Ing. Ruben García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosendo Roza
Residente



Fecha:


5 / 08 / 2021


BITÁCORA DE OBRA


No.

Nota # 5

Se continua con excavación para alojar la guarnición de Km ot 060 al ot 120 lado derecha. También se realiza colado de guarnición del Cadenamiento ot 000 al ot 060 en ambos lados. Se continua con la limpia y trazo del Cadenamiento ot 180 a ot 260.




Ing. Rubén García Barrios
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Fecha:

6 / 08 / 2021

No.


Nota #6


Se realiza el desimbrado de la guarnición colocada entre el Cadenamiento del 0+000 al 0+060 de ambos lados.

Se continúa con la colocación de símbra del cadenamiento del 0+060 al 0+120 lado derecho.

Se continúa con la excavación para bajar la guarnición del cadenamiento 0+060 al 0+120 lado izquierdo.

Se realiza el relleno en la guarnición con material producto de la excavación.




Ing. Ruben García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Fecha:

9 / 08 / 2021

No.


Nota # 7


Con esta fecha se continua con la colocación de la cimbra metálica del Cadenamiento ot+060 al ot+120 lado izquierdo.

Se realiza relleno de la guarnición con material producto de la excavación.

Se continua con excavación para alojar la guarnición del Cadenamiento ot+120 al ot+180 del lado derecho.

Se realiza el colado de la guarnición cimbrada entre los cadenamientos ot+060 al ot+120 en ambos lados.


Ing. Ruben Garcia Barrios
Superintendente


Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra

Fecha:

10 / 08 / 2021

BITÁCORA DE OBRA 000187

No.


Nota #8


Se continua con la colocación de la ~~rimbra~~ ~~del~~ cadahamiente 0+120 al 0+180 en ambos lados.

Se continua con la excavación a mano para la colocación de las guarniciones del 0+180 a 0+240 en ambos lados.

Se realiza el colado de guarniciones en el tramo del 0+120 al 0+180 en ambos lados.

Se empieza a realizar el corte en caja con una motoconformadora a partir del 0+000.




Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente


Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Fecha:

12 / 08 / 2021


No.

Nota #9

Se continua con el corte en caja por parte de la mota conformadora entre el Cadenamiento et 100 al et 100.

Se realiza el retiro de material producto de la excavación contando para esta actividad con 3 Camiones Con Capacidad de 7m³ y una retro excavadora para la carga del material a los Vehículos.

Se continua con la construcción de la guarnición del Cadenamiento et 180 al et 240 en ambos lados el día de hoy se realiza el Colado de las mismas. Con estas fechas se checa con personal de obras públicas. nueva ubicación del poste de CFE que se reubicara debido a que la posición actual del poste queda 120mtrs dentro del arrollo vehicular del proyecto.



Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Fecha:

14 / 08 / 2021

BITÁCORA DE OBRA


000189

No.

Nota # 10

Se realiza el colado de guarnición del
Cadenamiento ot 180 al ot 240

Se continua con los trabajos de corte en caja
de ot 000 al ot 100 así como el retiro
de material producto de la excavación.




Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente

Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 11

En el tramo del 0+000 al 0+100 se llega a nivel de subrasante por lo que se procede al afinado de la subrasante para posteriormente compactar con el vibro compactador para llegar al % de compactación requerido en proyecto.

Se le solicita al laboratorio la compactación del tramo trabajado, al hacer la cala correspondiente se nos informa que el resultado fue del 96.4% con lo cual el tramo del 0+000 al 0+100 queda liberado.


Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Resano Razo
Residente de obra

Fecha:

17 | 08 | 2021

BITÁCORA DE OBRA


000191


No.


Nota # 12

Con esta fecha se continua con el corte en caja en el tramo del $0+100$ al $0+240$, así como el retiro de material producto de la excavación hacia el banco de tiro propuesto en el proyecto.

Se continua con la excavación a mano en el tramo del $0+240$ al $0+280$ en ambos lados para la construcción de la guarnición.





Arg. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente


Arg. Joaquin Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 18.

Se continua el suministro de material de base hidráulica traída desde el banco "TOME" propuesto por la dependencia.

Se realiza el afine de la sobrasante para su posterior Compactación y solicitar al laboratorio su Verificación para saber si cumple con el % de Compactación.



Ing. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente

Arq. Joaquin Rosano Razo
Residente de Obra

Fecha:


26 - 08 - 2021

No.

Nota # 19

Se solicita al laboratorio verifica la compactación del tramo ot 240 al ot 292.97 el laboratorio indica que los resultados obtenidos son del 96.5%. Con lo cual nos libera para seguir con el suministro de la base hidráulica.

en el tramo del ot 100 al ot 220 se empieza con los trabajos acamellonamiento mezclado, tendido y compactación de la base hidráulica.




Ing. Robert García Bañuelos
Intendente

Arq. Joaquín Rosano Pazo
Residente de Obra

Nota # 20

Con esta fecha se continua en el tramo 0+100 al 0+220 con el tendido y compactación de la base hidráulica pidiendo al laboratorio se realice la verificación de la Capa para saber su grado de Compactación el laboratorio indica que la Compactación dio 96.0% por lo cual hace la indicación de darle una riego de agua y compactarle para que alcance mas del 96% y así queda librado el tramo.

Se hace mención que la superficie Compactada del tramo anterior librado se mantiene 0+000 al 0+100 con una humedad Optima aplicandole riegos de agua.




Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra

Nota # 23

Se realizan las revelaciones de los pozos de visita hasta el nivel de la base se toma encuenta el nivel del piso terminado del adoquín y la tapa para dar acabado al mismo pozo. así tambien se empieza a recibir la arena para realizar la cama de arena, se recibe tambien un viaje de adoquín.

Se empieza a colocar la capa de arena regleando de acuerdo al nivel y bombeo necesario, los trabajos se empiezan a partir del 0+000.


Se le hace saber al laboratorio que se tiene en el sitio el adoquín por lo que se presenta a la obra para tomar 10 piezas para realizar las pruebas de resistencia necesarias las observaciones al adoquín fueron buenas ya que presentan características favorables en tamaño y peso.


Ing. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente


Arg. Joaquin Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 22

Con esta fecha laboratorio realiza las pruebas de compactación de la base hidráulica haciendo 3 muestras en el último tramo, obteniendo un promedio de 97% de su PUSM., por lo consiguiente laboratorio da luz Verde para realizar el riego de impregnación con emulsión asfáltica sobre la superficie de la base hidráulica. Llegada la emulsión, laboratorio estuvo presente para verificar el contenido y calidad de la emulsión procediendo a realizar la impregnación en toda la superficie de rodamiento de la calle del ot 000 al ot 292.97. También se procede a realizar el peneo con arena para la protección de la emulsión en toda el área de la calle.



Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra


Nota # 21

Con esta fecha se continua con la mezcla y acaramelamiento de la base hidráulica del tramo 0+220 al 0+292.97 se hace el tendido de la base y se compacta con vibrocompactador.

Se realiza la limpieza, retirando material sobrante de la excavación en caja y sobrante de base hidráulica.




Ing. Rubén García Barrios
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra


Fecha:


01-09-2021

No.

Nota # 24

Se continua con el suministro de adoquín donde se distribuyen a lo largo de la privada para ser colocado, así también la arena es suministrada para ser tendida.
Se continua con la colocación de adoquín se deja el espacio para el colado de los dentellones




Ing. Rubén García Barcelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra


Fecha: 03-09-2021


No.


Nota # 25

Con esta fecha se continua colocando
cama de arena y colocación de adoquines
con un avance del cadenamiento 0+000 al
0+100, Se realiza la remoción y colocación
de la tapa de 2 pasos de visita.

Se realiza el colado de los dentellones
laterales y longitudinales del tramo avanzado.





Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 26

Se continua con el suministro y colocación de adoquín con un avance hasta el 0+200 se realizan las nivelaciones de 2 pasos más con su colocación de tapas. Se hace el colado de dentellones laterales y transversales.

Se realiza el relleno de la junta con arena cernida sobre los adoquines, posteriormente su barrido para nivelar y retirar el exceso de arena.




Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente

Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Nota # 27

Con esta fecha se termina de colocar el adoquín, así como de colocar los dentellones transversales y longitudinales faltantes. Se realiza un levantamiento de lo real ejecutado junto con personal de obras públicas para saber si el área realizada de adoquín es igual al área de catálogo dando como resultado que faltan por ejecutar 72 m^2 por lo que el supervisor de obras públicas el arq. Joaquín Rosano indica que para cumplir las metas se realicen la colocación de adoquín en las privadas ubicadas en los Cadenamientos 0+175 y 0+213.00 en las bocanillas calles para cumplir con las metas de catálogos.


Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

Fecha:

11-09-2021

BITÁCORA DE OBRA


000202

No.

NOTA # 28

Con esta Fecha se realiza limpieza en todo el tramo, retirando el material sobrante de arena y de adoquin que se encuentra sobre la superficie de la privada.

Se hace limpieza de guarniciones para retirar el material salpicado por la impregnación, para que al dar el acabado con la pintura tenga una buena adherencia.



Ing. Rubén García Bañuelos
Superintendente

Atq. Joaquín Rosano Rozado
Residente de obra


Fecha:

13/09/2021

No.

NOTA # 29

Con esta fecha se inician los trabajos de pintura de guarniciones en toda lo largo del tramo, así como también pintura de las Flechas de sentido vehicular línea Central y líneas de cruce peatonal, esto cumpliendo con el tipo de Pintura y dimensiones de las líneas de acuerdo a como lo marca el proyecto.



Ing. Rubén García Barzuelos
Superintendente

Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra

EST

Fecha:

15-09-2021


BITÁCORA DE OBRA


000204

No.

NOTA # 30

Con esta fecha se dan por terminados todos los trabajos referente al contrato: MCP-DOP/FORTA-21-17 "Adecuamiento de la privada Revolución entre Privada Revolución y Calle Calvario-mojonera" de la localidad de Sanctorum, Cuautlancingo, Pue. Cumpliendo con todos los conceptos y metas que marca el catalogo de conceptos.


Ing. Ruben Garcia Bañuelos
Superintendente


Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000275

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-17

ACTA DE FALLO

Siendo las 12:00 horas del día 29 de julio de 2021, estando reunidos en las oficinas que ocupa el Comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, cita en Calle El Carmen No. 10 de la Colonia Estrellas del Mar, Edificio de Servicios Municipales 2º. Piso, de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente **Acta de Fallo** y dar a conocer el resultado referente al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a **cuando menos cinco personas** No. MCP-DOP/FORTA-21-17. Referente a la obra denominada **ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE PRIVADA REVOLUCIÓN Y CALLE CALVARIO – MOJONERA**. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se procede al pase de lista de los licitantes invitados, posteriormente el Comité de obra pública procede el a emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos.

En relación con el Acto de Presentación y Apertura de propuestas, celebrado el día 27 de julio de 2021, correspondiente al procedimiento de adjudicación antes señalado; se emite el resultado del análisis detallado de las propuestas legales, técnicas y económicas de las empresas participantes siguientes

No.	LICITANTES INVITADOS
1	HUMBERTO PÉREZ COTE
2	JR INGENIERÍA INTEGRAL APLICADA S.A. DE C.V.
3	DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ.
4	CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V.
5	CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V.

Una vez efectuada la evaluación cualitativa a las proposiciones técnicas y económicas, tomando en consideración los puntos establecidos en las bases del proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por invitación a Cuando Menos Cinco Personas MCP-DOP/FORTA-21-17, que se han incumplido, se determinó desechar las propuestas de los siguientes licitantes invitados, por las razones legales, técnicas y económicas que a continuación se enlistan: -----

EMPRESA	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
JR INGENIERÍA INTEGRAL APLICADA S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
HUMBERTO PÉREZ COTE.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.

El comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, para realizar la evaluación de proposiciones y con fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla., resuelve que la proposición presentada por la siguiente participante:



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

**ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-17**

000278

ACTA DE FALLO

CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V.

Incluye toda la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, el programa de ejecución es factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos por cada uno considerados; el personal técnico cuenta con la experiencia y capacidad necesaria; la documentación financiera cumple con lo requerido. -----

La maquinaria y el equipo de construcción es la adecuada y suficiente para ejecutar la obra; el personal técnico, administrativo y de obra es el adecuado y suficiente para efectuar la obra; las características y calidad de los materiales son los requeridos; el procedimiento de construcción es adecuado y acorde con el programa de ejecución de obra y con la maquinaria y equipo de construcción. -----

Los precios propuestos por el licitante son aceptables, es decir, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado o la zona en donde se ejecutarán los trabajos. -----

El Comité de Obra Pública verificó que en todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto se establezca el importe del precio unitario. -----

Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y letra, debiendo ser coincidentes, en caso de diferencia, prevaleció el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra en caso de no tener dicho análisis. -----

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más presentaron errores, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes, considerando el monto correcto para el análisis comparativo. -----

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, así como los análisis de costos directos e indirectos se hayan estructurado conforme a lo previsto en el Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado considerando que el anticipo se encuentre deducido del monto de las estimaciones, considerando la periodicidad y plazo de trámite de pago, que el costo financiero este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico específico. -----

Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, este estructurado y determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias que estime debe percibir el contratista por la ejecución de los trabajos con las deducciones e impuestos correspondientes.

Que el importe total de la propuesta es congruente con todos los documentos que la integran, así como los programas de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción son



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-17

000277

ACTA DE FALLO

congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y con los programas presentados en la propuesta técnica por lo que se hace constar su aceptación legal, técnica y económica, para efectos de continuar en el proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por Invitación a Cuando Menos Cinco Personas.

El Comité Municipal de Obra Pública, para hacer la evaluación de las proposiciones, en base a los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, verifico que la selección correspondiente debiera fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio; también verificó el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas; que los recursos propuestos por el licitante invitado sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la persona física o moral, cuya propuesta sea solvente tanto técnica como económica, que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité Municipal de Obra Pública y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

La propuesta que resultó ganadora del presente procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, corresponde al licitante invitado CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V. con un importe de \$ 1,278,176.56 (Un millón doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos 56/100 M.N.) toda vez que reúne las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, por lo que en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La fecha de formalización del contrato se llevará a cabo el día 30 de julio de 2021 a las 12:00 horas en las oficinas del Comité Municipal de Obra, debiendo presentar en original y copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir contrato. -----

Para lo cual el licitante invitado ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. -----



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

**ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-17**

000278

ACTA DE FALLO

Después de la formalización del contrato, el contratista deberá tramitar y entregar las garantías de cumplimiento del mismo y en su caso la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El pago del anticipo correspondiente estará condicionado a la entrega de dichas garantías. -----

Con relación a la garantía para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, se observará lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato respectivo, la invitación y demás normatividad aplicable. -----


La fecha de inicio de los trabajos será el día 2 de agosto de 2021, y el plazo de ejecución del mismo es de 60 (Sesenta) días naturales. -----

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 12:30 horas del día de su inicio, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidenta del comité de obra pública


C. María Guadalupe Daniel Hernández



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000279

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-17

ACTA DE FALLO

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

Ing. José Luis Flores Amastal

C. José María Meza Pérez

Titular del Órgano Interno de Control

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000280

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-17

ACTA DE FALLO

LICITANTES

Humberto Pérez Cote.
C. Humberto Pérez Cote

JR ingeniería Integral Aplicada S.A. de C.V.
C. José Juan Mendoza Fabian

David López Domínguez.
C. David López Domínguez

Constructora Tiyaca S.A. de C.V.
C. Israel Cuaya Chiquito

CO-WORK Construction S. de R.L. de C.V.
C. Ana Patricia Sánchez Parraguirre

