

BITÁCORA DE OBRA

No. 1

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.

Dirección de Obras.

OBRA: Adoquinamiento de la calle Cañada entre
progreso y fondo de la misma

LUGAR: Municipio de Cuautlancingo, Pue.

No. Contrato: MCP-DOP/FORTA 21-18

No. Obra: FORTA - 21-18


FONDO: FORTAMUN

Plazo de
ejecución: Del 02 de Agosto de 2021 al
15 de Septiembre de 2021.MONTO de
la OBRA: \$ 2'275,501.66Contratante: H. Ayuntamiento del Municipio de
CuautlancingoRepresentante
legal: Mariano Realí Maldonado

Residente: Vicente de Paul Goya Tepeyahuitl.


Mariano Realí Maldonado

Representante Legal


Ing. Nahum Martín Goyota
Superintendente
Vicente de Paul Goya T.
Residente


2 Agosto / 2021


No.

2

Se inicia los trabajos de adoquinamiento de la calle cañada entre calle progreso y fondo de la misma.

Primeramente con el trazo y nivelación del terreno para el corte del terreno natural de las áreas inscritas en el proyecto, así como su debida limpieza


Ing. Nahum Martín Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Cuaya T.
Residente

4/Agosto/2021

BITÁCORA DE OBRA

000422


No.

3


En este día se inicia con la ruptura y demolición con el debido equipo del concreto hidráulico.

Así como se inicia con la excavación para la conformación de la subrasante y llegar al nivel del proyecto.

Posteriormente se realiza la limpieza y desenraice del terreno a mano en las áreas designadas, junto con el acarreo de los materiales producto de la demolición.



g. Nahum Martín Coyota
Superintendente



Vicente de Paul Cuaya T.
Residente


9/Agosto/2021

No.

4

Se inicia con la demolición de las
guarniciones y banquetas deterioradas en los
tramos

de la misma manera se inicia la cimbra
para la colocación de las mismas banquetas
que serán demolidas, incluyendo la limpieza
de la superficie.


Ing. Nahum Martín Coyota
Superintendente



Vicente de Paul Guaya T.
Residente


12/Agosto 2021

No. 5

En este día se continúa con el escarificado del terreno por medios mecánicos (motoniveladora) y realizando cortes del terreno para subnivelación.

De igual manera se realizó la reparación de disparos de tomas de agua potable, continuando con la conformación de la subrasante.


Ing. Nahum Martín Cogola.
Superintendente


Vicente de Paul Guaya T.
Residente


16 / Agosto / 2021

No.

6

Se continúa con la compactación de la subrasante al 95% proctor empleando maquinaria con espesor de 15 cm incluyendo incorporación de agua, así como se inicia con el colado de las nuevas banquetas y guarniciones que fueron removidas ocupando concreto $f'c = 150 \text{ cm}^2$.

Laboratorio estaba presente para las pruebas correspondientes de compactación de la subrasante, así como supervisión de los niveles correspondientes del proyecto.


g. Nahum Martín Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Caya T.
Residente

BITÁCORA DE OBRA

19/Agosto /2021

No.

7

En este día laboratorio liberó tramos
aprobando la compactación de la subrasante
y se comienza con la conformación de la
base hidráulica con material cumpliendo con
las normas vigentes de la S.C.T.
compactando al 95% de su p.v.s.m.
(Comprendido entre 1.850 y 1.950 Kg/cm³)
Incluyendo agua, incorporación de suministro
de materiales, mano de obra, maquinaria,
equipo y herramientas.

~~Ing. Nahum~~
Superintendente

Martín Coyata

~~Vicente de Paul~~
Residente

En este día laboratorio liberó tramos
aprobando la compactación de la subrasante
y se comienza con la conformación de la
base hidráulica con material cumpliendo con
las normas vigentes de la S.C.T.
compactando al 95% de su p.v.s.m.
(Comprendido entre 1.850 y 1.950 Kg/cm³)
incluyendo agua, incorporación de suministro
de materiales, mano de obra, maquinaria,
equipo y herramientas.

~~Nahum~~ ~~Martín~~ Coyota
Superintendente

~~Vicente~~ de Paul Cuaya T.
Residente


21/Agosto/2021


No. 8

Se continúa con el afinado y conformación de la base hidráulica de los tramos

Así como se continúa con la compactación de la subrasante, incluyendo incorporación de agua.

Laboratorio estuvo presente para muestreo y supervisión de la compactación de la misma en los tramos.


Nahum Martín Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Goya T.
Residente

31 Agosto / 2021


BITÁCORA DE OBRA

000428

No.

9

En este día laboratorio libera tramos
de la subrasante y se
continúa con la conformación de la base
hidráulica en los tramos
así como laboratorio libera los tramos
de la base hidráulica
para realizar el riego de emulsión asfáltica
de tipo ECI-60 a razón de 15 lt/m^2 ,
inmediatamente se realizó el poreo en los tramos


Nahum Martin Cogota
Superintendente


Vicente de Paul Cuaya T.
Residente

25/Agosto/2021

No.

10

Se continúa con el afinado y conformación y compactación de la base hidráulica de los tramos reparando las afectaciones consecuentes a las lluvias, tales como baches.

~~Nahum~~
Nahum Martín Cayula
Superintendente

~~Nicente~~
Nicente de Paul Caya T.
Residente

27/Agosto/2021

BITÁCORA DE OBRA


090430

No.

11

En este día laboratorio libera tramo
de la base así como se inicia con el riego
de impregnación con emulsión asfáltica de
tipo ECI-60 a razón de 1.5 lb/m^2
en los tramos

incluyendo barrido, equipo, maquinaria,
herramientas, materiales en obra y acarreos.


Nahum Martín Cogota
Superintendente


Vicente de Paul Cuaya T.
Residente

28 / Agosto / 2021

BITÁCORA DE OBRA


000431


No.

12

Se continúa con el viego de impregnación, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y maquinaria.

Laboratorio estuvo presente para la liberación de los tramos correspondientes así como para verificar el tendido de emulsión asfáltica.


Nahum Martín Coyata
Superintendente


Vicente de Paul Cordero T.
Residente


30 / Agosto / 2021

No.

13

Se inicia con la colocación de los adoquines hexagonales del tramo 0+317.00 al 0+270.00 resistencia $f'c = 300 \text{ Kg / cm}^2$, con una cama de arenilla de 3 a 5 cm, colocando niveles correspondientes para darle el bombeo adecuado a la obra.



Nahum Martín Coyota
Superintendente



Vicente de Paul Guaya T.
Residente

11 Septiembre 2021

No. 14

Se continúa con la colocación de los adoquines hexagonales del tramo 0+270.00 al 0+220.00 resistencia $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$, con una cama de arenilla de 3 a 5 cm, así como los dentellones longitudinales y transversales para la buena conformación de la carpeta de rodamiento.


Nahum Martín Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Cuaga T.
Residente

21 Septiembre / 2021


BITÁCORA DE OBRA

000434

No.

15

En este día se continúa con la colocación de adoquines tipo i o cruz en color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, de 8 cm de espesor en los tramos $0+220.00$ al $0+180.00$ asentado sobre cama de arena, así como la construcción de dentellones o reten transversal.


Nahum Martin Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Guaya T.
Residente

3/Septiembre/2021


BITÁCORA DE OBRA

000435

No.

16

Se continúa con la colocación de los adoquines del tramo 0+180.00 al 0+190.00 resistencia $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$, con una cama de arenilla de 3 a 5 cm, así como la colocación de los dentellones longitudinales y transversales de rodamiento.


Nahum Martín Coyota
Superintendente



Vicente de Paul Cuaya I.
Residente

4/Septiembre/2021

No. 17

Se continúa con la colocación de los adoquines Tipo i o cruz en color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ del tramo $0+140.00$ al $0+100.00$ asentado sobre cama de arenilla así como los dentellones longitudinales y transversales para la buena conformación de la carpeta de rodamiento.


Ing. Nahum Martín Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Cuayat.
Residente

6/Septiembre/2021


BITÁCORA DE OBRA


990437

No.

18

Se continúa con la colocación de los adoquines del tramo 0+100.00 al 0+060.00 de tipo i o cruz en color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor asentado sobre cama de arenilla, así como la construcción de dentellones o reten transversal para la buena conformación de la carpeta de rodamiento.


Ing. Nahum Martín Coyota
Superintendente


Vicente de Paul Caya T.
Residente

Septiembre / 2021


BITÁCORA DE OBRA


090438

No.

19.

En este día se continúa con la colocación de los adoquines hexagonales resistencia $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ en los mismos tramos $0+100.00$ al $0+0.60.00$ asentado sobre cama de arenilla, ya que la obra se detuvo momentaneamente por las condiciones climáticas.


Ing. Nahem Martín Coyota.
Superintendente


Vicente de Paul Guaya T.
Residente

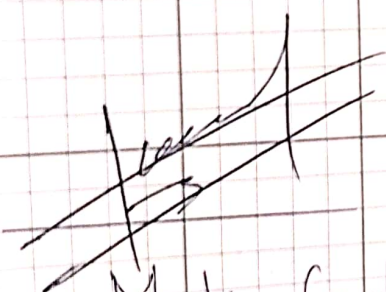
11 Septiembre 12021


BITÁCORA DE OBRA

000439

No. 20

Se continúa con la colocación de los adoquines del tramo 0+060.00 al 0+000.00 resistencia $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ asentado sobre cama de arenilla, así como los dentellones longitudinales y transversales para la buena conformación de la carpeta de rodamiento.


Nahum Martín Coyota
Superintendente



Vicente de Paul Caya T.
Residente

11/Septiembre/2021

No.

21

Se concluye con la colocación de los adoquines tipo i o cruz en color $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor asentado sobre cama de arenilla, así como la construcción de dentellones o reten transversal para la buena conformación de la carpeta de rodamiento.


Ing. Nahum Martín Coyata
Superintendente


Ing. Vicente de Paul Guaya T.
Residente

13/Septiembre/2021


BITÁCORA DE OBRA


000441

No.

22

Se inicia el barrido con arena
fina para el sello de adoquin y así
tener una buena conformación del
mismo.


g Nahum Martín Coyola
Superintendente


Vicente de Paul Guaya T.
Residente

Septiembre/2021

No.

23

Se inicia con la limpieza general de la obra de los tramos 0+000.00 al 0+317.00, así como la preparación del terreno para el pintado de señalética horizontal en toda la calle.

~~Recibido~~
3

~~[Signature]~~
Vicente de Paul Cupya T.

5/Septiembre/2021

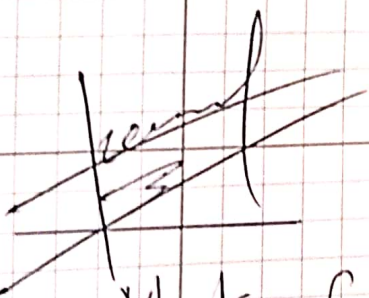
BITÁCORA DE OBRA

090443


No. 24

Se concluye con la obra de nombre
pavimentación de la calle cañada entre progreso y
de la misma, la cual tenía fecha de
inicio y término del 02 de Agosto de 2021
15 de Se

La obra se realizó de acuerdo con los
conceptos que estaban dentro del catálogo y
con la calidad adecuada.



Nahum Martín Coyola
Superintendente



Vicente de Paul Guaya T.
Residente



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000178

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-18

ACTA DE FALLO

Siendo las 13:00 horas del día 29 de julio de 2021, estando reunidos en las oficinas que ocupa el Comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, cita en Calle El Carmen No. 10 de la Colonia Estrellas del Mar, Edificio de Servicios Municipales 2º. Piso, de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente Acta de Fallo y dar a conocer el resultado referente al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a cuando menos cinco personas No. MCP-DOP/FORTA-21-18. Referente a la obra denominada ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAÑADA ENTRE PROGRESO Y FONDO DE LA MISMA. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se procede al pase de lista de los licitantes invitados, posteriormente el Comité de obra pública procede el a emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos.

En relación con el Acto de Presentación y Apertura de propuestas, celebrado el día 27 de julio de 2021, correspondiente al procedimiento de adjudicación antes señalado; se emite el resultado del análisis detallado de las propuestas legales, técnicas y económicas de las empresas participantes siguientes

No.	LICITANTES INVITADOS
1	Proveedora de Suministros y Servicios MAXXON S.A. de C.V.
2	Infraestructuras PTAH S.A.P.I. de C.V.
3	Estructuras y Edificaciones ROHIN S.A.P.I. de C.V.
4	Constructora ATLAMAXAC S.A. de C.V.
5	Constructora Herguin S.A.P.I. de C.V.

Una vez efectuada la evaluación cualitativa a las proposiciones técnicas y económicas, tomando en consideración los puntos establecidos en las bases del proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por invitación a Cuando Menos Cinco Personas MCP-DOP/FORTA-21-18, que se han incumplido, se determinó desechar las propuestas de los siguientes licitantes invitados, por las razones legales, técnicas y económicas que a continuación se enlistan: -----

EMPRESA	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS PTAH S.A.P.I. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
CONSTRUCTORA HERGUIN S.A.P.I. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

070179

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-18

ACTA DE FALLO

CONSTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN
S.A. DE C.V.

Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.

El comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, para realizar la evaluación de proposiciones y con fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla., resuelve que la proposición presentada por la siguiente participante:

Constructora ATLAMAXAC S.A. de C.V.

Incluye toda la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, el programa de ejecución es factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos por cada uno considerados; el personal técnico cuenta con la experiencia y capacidad necesaria; la documentación financiera cumple con lo requerido. -----

La maquinaria y el equipo de construcción es la adecuada y suficiente para ejecutar la obra; el personal técnico, administrativo y de obra es el adecuado y suficiente para efectuar la obra; las características y calidad de los materiales son los requeridos; el procedimiento de construcción es adecuado y acorde con el programa de ejecución de obra y con la maquinaria y equipo de construcción. -----

Los precios propuestos por el licitante son aceptables, es decir, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado o la zona en donde se ejecutarán los trabajos. -----

El Comité de Obra Pública verificó que en todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto se establezca el importe del precio unitario. -----

Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y letra, debiendo ser coincidentes, en caso de diferencia, prevaleció el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra en caso de no tener dicho análisis. -----

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más presentaron errores, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes, considerando el monto correcto para el análisis comparativo. -----

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, así como los análisis de costos directos e indirectos se hayan estructurado conforme a lo previsto en el Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado considerando que el anticipo se encuentre deducido del monto de las estimaciones, considerando la periodicidad y plazo de trámite de pago, que el costo financiero este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico específico. -----

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-18

077180

ACTA DE FALLO

Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, este estructurado y determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias que estime debe percibir el contratista por la ejecución de los trabajos con las deducciones e impuestos correspondientes.

Que el importe total de la propuesta es congruente con todos los documentos que la integran, así como los programas de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción son congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y con los programas presentados en la propuesta técnica por lo que se hace constar su aceptación legal, técnica y económica, para efectos de continuar en el proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por Invitación a Cuando Menos Cinco Personas.

El Comité Municipal de Obra Pública, para hacer la evaluación de las proposiciones, en base a los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, verifico que la elección correspondiente debiera fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio; también verificó el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas; que los recursos propuestos por el licitante invitado sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la persona física o moral, cuya propuesta sea solvente tanto técnica como económica, que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité Municipal de Obra Pública y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

La propuesta que resultó ganadora del presente procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, corresponde al licitante invitado **Constructora ATLAMAXAC S.A. de C.V.** con un importe de \$ 1,961,639.36 (Un millón novecientos sesenta y un mil seiscientos treinta y nueve pesos 36/100 M.N.) toda vez que reúne las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, por lo que en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La fecha de formalización del contrato se llevará a cabo el día **30 de julio de 2021 a las 13:00 horas** en las oficinas del Comité Municipal de Obra, debiendo presentar en original y copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000181

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-18

ACTA DE FALLO

Para lo cual el licitante invitado ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Después de la formalización del contrato, el contratista deberá tramitar y entregar las garantías de cumplimiento del mismo y en su caso la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El pago del anticipo correspondiente estará condicionado a la entrega de dichas garantías.


Con relación a la garantía para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, se observará lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato respectivo, la invitación y demás normatividad aplicable.

La fecha de inicio de los trabajos será el día 2 de agosto de 2021, y el plazo de ejecución del mismo es de 60 (Sesenta) días naturales.

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 13:30 horas del día de su inicio, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidenta del comité de obra pública


C. María Guadalupe Daniel Hernández

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000132

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-18

ACTA DE FALLO

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo



Ing. José Luis Flores Amastal



C. José María Meza Pérez

Titular del Órgano Interno de Control



L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

000183

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-18

ACTA DE FALLO

LICITANTES



Proveedora de Suministros y Servicios MAXXON S.A. de C.V.
C. Juan Miguel Pacheco López



Infraestructuras PTAH S.A.P.I. de C.V.
C. Lady Jeanette Marín Cisneros



Estructuras y Edificaciones ROHIN S.A.P.I. de C.V.
C. Indira Nohemí Velarde Báez



Constructora ATLAMAXAC S.A. de C.V..
C. Mariano Realí Maldonado



Constructora HERGUIN S.A.P.I. de C.V.
C. José Raúl García Flores
