

Fecha:

No.

Obras: "Pavimentación con adoquín de la calle 20 de Enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y calle Cuauhtémoc"

Municipio: Cuauhtémoc

Localidad: San Lorenzo Almorada

No. obra: FISM-22-02

Contratista: C. Verónica Pérez



C. Verónica Pérez Cruz.
Contratista.

Tec. Oscar Quetzolac Sastre.
Supervisor de obra.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez.
Supervisor de obra.

Fecha:

01/03/2022

Con esta nota se abre la presente bitácora de obra de la
iv Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle
Josefa Ortiz de Domínguez y calle Cuastecum, iniciando a partir
de los siguientes conceptos:

- Trazo y nivelación de plazas, arbolados, banquetas y pavimentos.
- Excavación en caja por medios mecánicos en el terreno natural,
al igual que el acarreo del material en camion fuera de la
obra por una zona sub-urbana, incluyendo la carga mecánica.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha: 04/03/2022.

No. 2

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance
de la obra conforme a los conceptos del presupuesto.

- Se tiene un avance hasta el cadenamiento ± 0.60 en la
excavación en caja por medios mecánicos, al igual que el
acarreo de material producto de la excavación a una distancia
de 9.5 km fuera de la obra por una zona sub-urbana
incluyendo la carga mecánica.
- El día de hoy se inician los trabajos para la construcción de la
guardería de $15 \times 20 \times 40$ cm, preparando el terreno para la cimbra
con charolas metálicas.
- Se informa que se ha realizado la ubicación del primer
poste de TELMEX.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha:

09/03/2022.

No.

3

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Hasta el día de hoy se tiene un avance al cadenamiento $0+220$ en la excavación en caja por medios mecánicos, al igual que el acarreo de material suelto por una zona sub-urbana a una distancia de 9.0 Km fuera de la obra, incluyendo la carga mecánica.

→ Se tiene un avance hasta el cadenamiento $0+160$ en la construcción de las guardarríos de concreto $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con una dimensión de $15 \times 40 \times 40 \text{ cm}$.

→ Se informa que se terminaron los trabajos de ubicación de los 4 postes de TEMEX.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quicholac Santos.
Supervisor de obra.

Fecha: 15/03/2022.

No. 4.

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se tiene un avance hasta el cadenamiento $0+300$ en la excavación en caja por medios mecánicos, al igual que el acarreo de material producto de la excavación a una distancia de 9.0 Km fuera de la obra.

→ Se tiene un avance hasta el cadenamiento $0+260$ en la construcción de la guardarríos de concreto.

→ El día de hoy se iniciaron los trabajos para la mampostería, realizando la excavación y la planilla de concreto simple $F'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quicholac Santos.
Supervisor de obra.

Fecha:

21/03/2022.

No.

5

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto detallado.

→ Se completaron los trabajos de excavación en caja por medios mecánicos, así como el acarreo de material procedente de la excavación.

→ Se modificó las dimensiones del proyecto y trabajos del mampostearlo con 0.80 m de base, 0.30 m de corona y 1.40 m de altura y 12 m de largo, con mortero cemento-arena, 1:4, cumpliendo con la meta de 8.85 m³.

→ Se completó la construcción de guardería de concreto simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha: 25/03/2022.

No. 6.

Con esta fecha se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto.

→ Se completó los trabajos de compactación de terreno natural en capas de 20 cm, por medios mecánicos.

→ Con esta nota se informa que se inicia con el acarreo de material para base hidráulica, desde las minas denominadas, "los derreumbados" a una distancia de 140 km.

NOTA: El día de hoy laboratorio, recibió la compactación del terreno natural, cumpliendo con la compactación requerida.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha:

29/03/2022

No.

7

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se tiene un avance del cadenciamiento 0+220 al 0+351.00 en la colocación de la base hidráulica de 20 cm de espesor, incluyendo el acarreo del material desde la mina denominada "Las derrumbadas" a 140 km, sobre carretera, incluyendo: la carga mecánica.

Guarnición

15cm

40cm

Base

20cm

20cm

Arq. Miguel Angel Morales Ramirez

Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholac Sastre

Supervisor de obra.

Fecha: 04/04/2022.

No. 8

Con esta nota informo a la supervisión sobre el avance de la obra, conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se completaron los trabajos de la base hidráulica así como el acarreo de esta desde las minas "Las derrumbadas" a una distancia de 140 km de la obra.

→ El día de hoy se realiza el recibo de impermeabilización con emulsión asfáltica tipo EC-60 a razón de 1.5 lt/m², al mismo tiempo se protegió con arena la emulsión colocada.

NOTA: El día de hoy laboratorio realizó las pruebas correspondientes para verificar el grado de compactación de la base hidráulica aprobando esta misma.

Arq. Miguel Angel Morales Ramirez

Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholac Sastre


Supervisor de obra.

Fecha: 03/04/2022.

No. 9

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra, conforme a los conceptos del proyecto contratado.

→ El día de hoy se inicia el suministro de adoqueto tipo I en color f/c = 300 kg/cm² de 8 cm de espesor, al igual que el suministro de la arena para las juntas de pisos.

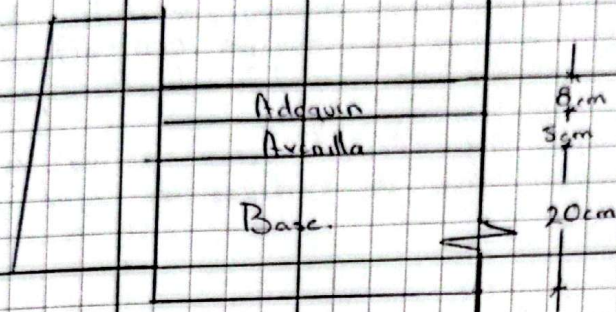

Arg. Miguel Ángel Morales Ramírez.
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quechobac Sastre.
Supervisor de obra.

No. 10

Fecha: 11/04/2022.

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance que tiene la obra, conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se inicia la colocación de adoqueto tipo I en color f/c = 300 kg/cm² de 8 cm de espesor asentado sobre una cama de arena, así como el barrido y junta de pisos con la arena.

→ Se inicia con los trabajos de construcción de dentellón para el confinamiento de adoquín a base de concreto simple f/c = 200 kg/cm² con una sección de 10 x 20 cm. Incluyendo la excavación, el acabado con volcador metálico en aristas del dentellón.

Arg. Miguel Ángel Morales Ramírez.
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quechobac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha:

16/04/2022.

No.

11

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se tiene un avance del codornamiento 0+1000 al 0+120 en la colocación de piso de adoquero tipo I en color = 300 Kg/lemt de 8cm de espesor acabado sobre cama de arena, incluyendo el barrido y juntas de pisos con la arena; de la misma forma se tiene el avance en la construcción de detalles para el confinamiento del adoquero a base de concreto simple $f'c = 200$ Kg/cm² con una sección de 15x20 cm, incluyendo el acabado con volterete metálico en aristas.

→ Se realizó el primer incremento del piso de visita, así como la colocación del brocal y tapa de polietileno de media densidad.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quechabac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha: 22/04/2022.

No. 12.

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Hasta el día de hoy se tiene un avance al codornamiento 0+240 en la colocación de piso de adoquero tipo I en color $f'c = 300$ Kg/lemt de 8cm de espesor acabado sobre cama de arena, incluyendo el barrido y juntas con arena.

→ Se tiene un avance al codornamiento 0+270 en la construcción de detalles o retas para el confinamiento del adoquero a base de concreto simple de 15x20 cm, incluyendo el acabado con volterete metálico en las aristas.

→ Se realizó el segundo incremento de piso de visita tipo común, incluyendo el sombreado y colocación de brocal y tapa de polietileno de media densidad.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quechabac Sastre.
Supervisor de obra.

Fecha:

30/04/2022

No.

13

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se completa el 100% todos los trabajos en la colocación de piso de adoquero tipo la en color f'c = 300 kg/cm² de 8 cm de espesor, asentado sobre una cama de arcilla. Incluyendo: el barrido y junta de pisos con arcilla.

→ Se completa al 100% la construcción del dentellón transversal como longitudinal para el confinamiento del adoquín a base de concreto simple f'c = 200 kg/cm² con una sección de 15 x 20 cm. Incluyendo el acabado con volteador metálico en aristas.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obras.

Fecha: 06/05/2022.

No. 14

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se terminan al 100% los 6 incrementos de pozo de visita. Incluyendo la colocación de brocal y tapa de polietileno de media densidad asentado con mortero de cemento-arena 1:4.

→ Se realiza la canalización de agua de valvulas de agua potable con tabique y mortero de cemento-arena 1:4. Incluyendo la instalación de contramarco sencillo de 1.70 m con canal de 4" e instalación de marcos con tapa de hierro fundido de 30 x 30 cm.

→ Se completa la construcción al final de la calle el dentellón transversal para el confinamiento del adoquín a base de concreto simple f'c = 200 kg/cm² con una sección de 15 x 40 cm.

Arq. Miguel Ángel Morales Ramírez
Superintendente de obra.

Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obra.

Fecha:

16/05/2022.

No.

15

Con esta nota se informa a la supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado.

→ Se completa la aplicación de pintura tipo tráfico color amarillo en guardarríos de 30 cm, al igual que la viga para cruz peatonal de 2 metros de largo y 60 cm de ancho.

→ Se completa al 100% la línea blanca de 10 cm de ancho con pintura tipo tránsito, así como la flecha blanca de 300 x 0.40 m.

→ Se realiza la limpieza final de la obra, incluyendo el acarreo de escombros fuera de la obra.

Nota: Con estos trabajos se completa al 100% todos los conceptos del presupuesto contratado, por lo tanto se cierra la presente bitácora de obra.



Arg. Miguel Morales Ramirez.

Superintendente de obra.



Tec. Oscar Quecholas Sastre.

Supervisor de obra.



Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS

Licitación No. FISM-22-02
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla
Obra: "Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Cuauhtémoc."
No. Obra: FISM-22-02

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-02, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Cuauhtémoc.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 25 de Febrero de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-02, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Cuauhtémoc.", ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

1 000340



Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento
de
Cautlancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas

Enseguida el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Verónica Pérez Cruz** con un importe total de su propuesta de **\$2,019,478.28 (Dos Millones Diecinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 32/100 MN)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **13:58** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000350

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento
de
Cautlancingo, Puebla 2021 - 2024


Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.



C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras



Mtra. Sandra María T...
DIRECTORA DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2



TESORERÍA
MUNICIPAL
C. Roberto López Tepoxtecatl
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024


000351

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V. Ing. Marcos Varela Izquierdo. Representante Legal o Apoderado.	
4	Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz. Representante Legal o Apoderado.	
5	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca. Representante Legal o Apoderado.	

000352



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FISM-22-02

OBRA : "Pavimentación con adoquín de la calle 20 de enero entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Cuauhtémoc"

OBRA No: FISM-22-02

FECHA : 25 de Febrero de 2022

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: San Lorenzo Almecatla

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	Francisco Pérez Zapata Representante legal	
Verónica Perez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial	
Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V.	Ing. Marcos Varela Izquierdo Representante legal	
Corporativo y Proyectos Mantra S.A de C.V.	Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
Creciente Construcciones S.A. de C.V.	Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	

000353
