



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP-RF-22-02

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-DOP-RF-22-02, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-DOP-RF-22-02, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE \$ 12,874,072.36 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V., POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 13:00 HORAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO

03030202



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP-RF-22-02

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 11:10 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

00000203




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP-RF-22-02


POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.
Directora de Obras.


C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



00000204




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP-RF-22-02

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS


ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTES


ING. MARCOS VARELA IZQUIERDO
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL, S.A. DE C.V.


ARQ. MAURO JUAN RAMIREZ HUERTA
CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V.


C. EDUARDO RODRIGUEZ SORIANO
INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA,
S.A. DE C.V.

00000205

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes, para el uso de esta bitácora al Arg. Diego Antonio Sarmiento Morales que se identifica con credencial para votar No. 0327093443213 y que será residente de obra por parte de la Supervisión y al Arg. Mauro Juan Ramirez Huerta que se identifica con credencial para votar No. 0339044405959. Como representante técnico y superintendente por parte de la contratista que aceptan, y manifiestan que conocen las reglas generales para el uso de la bitácora y los diferentes ordenamientos legales en materia de obra pública y firman al calce como constancia.

FIRMAS AUTORIZADAS

Por la contratante
Ayuntamiento del Municipio
de Cuautlancingo Puebla

Por la Contratista
Construcciones U.U.V. SA de C.V.

Mtra. Sandra Maria Hogue Gomez
Directora de Obras publicas

Mauro Juan Ramirez Huerta
Responsable tecnico y residente
de obra

Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Mauro Juan Ramirez Huerta
Representante legal
Construcciones U.U.V. SA de C.V.

Nota 2

Se valida la presente bitácora como parte del contrato de la obra que se señala en la Nota No. 1 de la presente bitácora.

Mauro Juan Ramirez Huerta.


00000330

9-Abril-2022

LP-DOP-RF-22-02

NOTA No 3

Con esta fecha damos inicio a los trabajos de la obra denominada CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE MARGARITAS --- ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL --- MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA "se recibe por parte de la direccion de obras publicas del Municipio de Cuautlancingo, el area liberada donde se realizaran los trabajos de la obra antes citada, asi como el proyecto ejecutivo, trazo y bancos de nivel, la contratista por su parte inicia actividades realizando levantamiento topografico para verificar --- bancos de nivel y trazo del proyecto



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento Morales

NOTA No. 4

4-Mayo-2022

Despues de verificar planos y bancos de nivel con esta fecha damos inicio a los trabajos de trazo y nivelacion en la calle Margaritas y, al mismo tiempo iniciamos excavacion con medios mecanicos en el area donde se construira el canal pluvial a base de piedra brasa en el tramo comprendo entre Calle 5 de Mayo y Calle Xicotencatl. aproximadamente 150 mts.



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento Morales


00000001

10 - Mayo - 2022

LP-DOP-RF-22-02

NOTA No. 5

En esta fecha se inician los trabajos de mampostería base de piedra brasa, acentada con mortero cemento arena 1:3 previo al inicio de la mampostería se realiza el nivel y compactado del terreno natural así como la colocación de plantilla a base de concreto $f'_c = 100 \text{ kg/cm}^2$

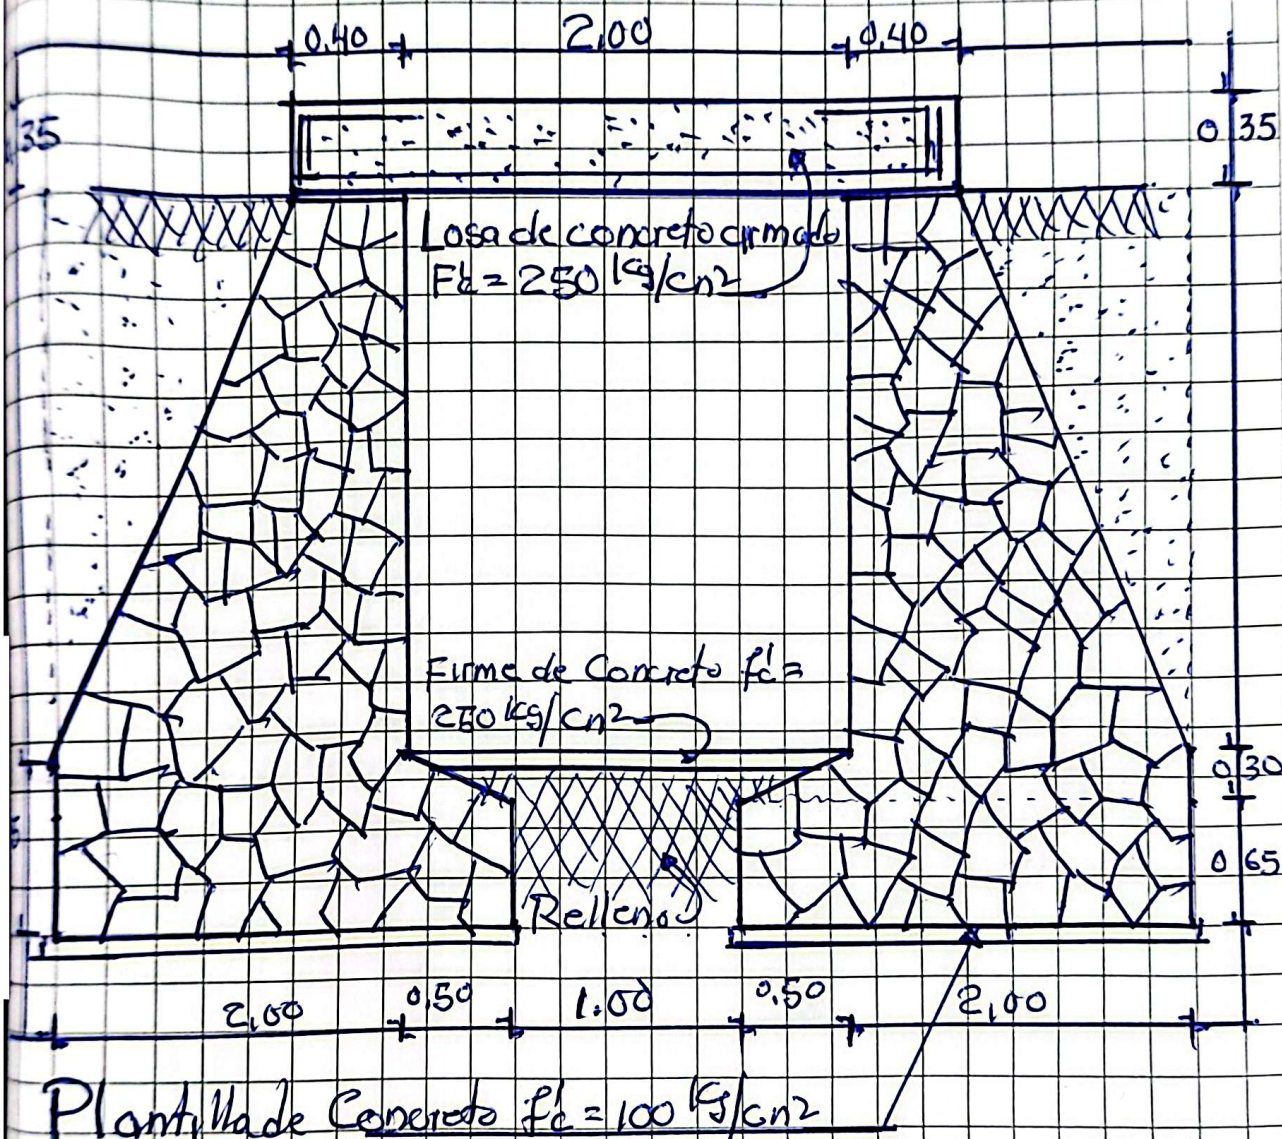

Se sugiere sin embargo de las dimensiones del canal pluvial corte transversal

[Signature]

[Signature]

Mauro Juan Ramirez Huerta

Diego Antonio Ramirez Huerta

Mayo - 2022

LP-DOP-RF-22-02

ATA No. 6

Continuamos con trabajos de excavación y acarreo del material producto del corte así mismo se continuó con la construcción del canal pluvial a base de mampostería, compactación de terreno natural y colocación de planilla con concreto $F_c = 100 \text{ kg/cm}^2$



Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

ATA No. 7

21-Mayo-2022

Continuamos con acarreo del material producto del corte alanco autorizada por la supervisión, también seguimos con construcción de planilla a base de concreto $F_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ seguimos con trabajos de corte así como la construcción de canal pluvial a base de mampostería echa a base de - - - - - piedra brasa acantada con mortero cemento arena 1:3



Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

00000033

27-Mayo-2022

LP-DOP-RF-22-02

ATA No. 8

En esta fecha terminamos la excavacion de el tramo comprendido entre calle xicotencatl y calle 5 de Mayo, tambien continuamos con la construccion del canal a base de amposteria



Juan Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento


ATA No. 9

1-Junio-2022

En esta fecha iniciamos relleno compactado al 90% de material de banco, tambien se continua con la excavacion para la construccion del canal pluvial en el tramo comprendido entre calle xicotencatl y calle 16 de septiembre, se realiza plantilla a base de concreto simple $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, tambien se continuan acarrees de material producido del corte al banco de tiro autorizada por la supervision



Juan Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento.

00000034

JUNIO - 2022

LP-DOP-RF-22-02

ATA No. 10

Continuamos con relleno compactado al 90%, con material de banco (tepetate) también se continúa con la construcción de canal pluvial en el tramo comprendido entre calle xicotencatl y calle 16 de septiembre así mismo se continúa con colado de plantilla con concreto $F_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, también se continúa excavando y corriendo el material producto de la excavación al banco autorizado por la supervisión.



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento


ATA No. 11

11 - JUNIO - 2022

Terminamos relleno con material de banco (tepetate) compactado al 90% en el tramo entre calle 5 de mayo y calle xicotencatl, continuamos trabajando excavación con medios mecánicos en el tramo comprendido entre calle xicotencatl y calle 16 de septiembre, se continúa con la construcción del canal pluvial a base de mampostería



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento


0.000005

JUNIO - 2022

LP-DOP-RF-22-02

OTA No. 12

continúan rellenos en el tramo comprendido entre la xicotencatl y calle 16 de septiembre, así mismo, termina excavación con medios mecánicos en el tramo antes citado, también se termina de colar - - - antilla con concreto $F_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$ y continuamos con construcción de los muros de mampostería del canal pluvial a base de piedra brasa acantada con mortero cemento arena 1:3



Mauro Juan Ramirez Huerta




Diego Antonio Sarmiento

OTA No. 13

20-JUNIO-2022

continuamos con la construcción del canal pluvial y también se sigue con el relleno compactado al 90% a base de material de banco (tepetate), se realiza suministro y - - - colocación de malla y se procede al vaciado de concreto $F_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ en la parte interior del canal (arrastré Hidráulica)



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento M.

00000038

25-JUNIO-2022


LP-DOP-RF-22-02

ATA No 14

En esta fecha se termino la construccion de los muros de mamposteria que forman el canal pluvial y se continua con rellenos en el tramo comprendido entre Av. Ncotencatl y Av. 16 de septiembre, tambien se continua con el vaciado de concreto en el interior del canal $F_c = 250 \text{ kg/cm}^2$



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento

ATA No. 15

27-JUNIO-2022

Se termina en su totalidad la construccion de los muros del canal pluvial a base de mamposteria, asi como los rellenos con material de banco (tepetate), tambien se termina con el suministro y colocacion de malla electro soldada en el arrastre hidraulico del canal asi como el vaciado del concreto $F_c = 250 \text{ kg/cm}^2$



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento

00000337

Julio-2022

Nota No. 18

LP-DOP-RF-22-02

Continuamos con cimbrado, Armado y habilitado de losa de canal pluvial entre calle 5 de Mayo y calle xicotencatl, se pospone a los involucrados de la obra que el día de mañana se iniciara el colado de losa a las 8 de la mañana.



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento H.

Julio-2022

Nota No. 19

Con esta fecha iniciamos colado de canal ciase de concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ premezclado el laboratorio hace acto de presencia chequeando asentamiento y sacando muestras de concreto y vaciado de concreto se realiza en tiempo y forma sin ningun contratiempo, entre Calle 5 de mayo y calle Xicotencatl.



Mauro Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento H.

000000

29 - JUNIO - 2022

LP-DOP-RF-22-02

OTA : No. 16

Continuamos actividad de habilitado de acero para losa de canal, en el sentido transversal y longitudinal con varilla del No. 5 y elaboración de losastones con varilla del No. 4



Mauro Juan Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento M.

OTA No. 17

2 de Julio - 2022

Continuamos con abilitado de acero y tambien iniciamos cimbrado para elaboracion de losa de canal, asi mismo se realiza armado de acero con varilla del No. 5 y varilla del No. 4



Mauro Juan Ramirez Huerta.



Diego Antonio Sarmiento M.

00000038

Julio-2022

LP-DOP-RF-22-02

OTA No. 20

se realizan actividades de cimbrado en el canal pluvial, para losa entre calle 5 de mayo y calle Xicotencatl, se realiza curado de losa



Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento

OTA No. 21

11-Julio-2022

continuamos con Habilitado y Armado de acero y refuerzo en losa de canal, tambien se continua con cimbra entre calle 5 de mayo y calle Xicotencatl, se notifica que el día de mañana se realizara colado en segundo tramo (entre) el tramo antes citado quedando cubierto este tramo al 100%



Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento

00000140

Julio-2022

LP-DOP-RF-22-02

ATA No. 22

se vaciaron de concreto en el segundo tramo entre Calle 5 de mayo y calle xicotencatl, el laboratorio chequea reventamiento de una de las ovas de concreto, todas cumplen con el reventamiento solicitado, el concreto es de resistencia $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y el colado se termina en tiempo y forma sin ningún contratiempo



Juan Ramirez Huerta, Diego Antonio Sarmiento M.

ATA No. 23

14-Julio-

en esta fecha se realizan trabajos de decimado en el tramo entre Calle 5 de mayo y Calle xicotencatl, y tambien se inician trabajos de mbrado en el tramo entre Calle xicotencatl y calle 16 de Septiembre asi mismo se va armado de acero de refuerzo para losa canal



Juan Ramirez Huerta, Diego Antonio Sarmiento M.

00000041

CAPSI

17-Julio-2022

LP-DOP-RF-22-02

OTA No. 24

Continuamos con armado de acero como se indica en el proyecto, a si mismo se continuan trabajos cimbrado y decimbrado se forma a las involucrados que se realizara entre calle xicotencatl y calle 16 de septiembre el proximo lunes 18 de julio a las 8 de la mañana



Auto Juan Ramirez Huerta Diego Antonio Sarmiento M.

OTA No. 25

18-Julio-2022

Comenzamos a las 8 de la mañana colado de losa del canal entre calle xicotencatl y calle 16 de septiembre, concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ laboratorio, chequea control de calidad y termina el colado sin ningun contratiempo



Auto Juan Ramirez Huerta Diego Antonio Sarmiento

00000342

Julio-2022

LP-DOP-RF-22-02

ATA No. 26

se realizan actividades de cimbrado y -
cimbrado en el subtramo, calle Xicotencatl
16 de Septiembre, tambien se realizan -
trabajos de armado de acero con varilla del
No 5 y varilla del No 4 de acuerdo a especi-
ficaciones del proyecto.



Juan Ramirez Huerta

Diego Antonio Samiento

ATA No. 27

22-Julio-2022

on esta fecha se terminan trabajos de
cimbrado en el tramo comprendido entre
calle Xicotencatl y calle 16 de Septiembre se
continuan con trabajos de armado de acero con
varilla del No 5 y varilla del No 5 de acuerdo
a especificaciones del proyecto se informa
a los participantes en la obra que se celebrara
la de mañana



Juan Ramirez Huerta

Diego Antonio Samiento

00000043

13-Julio-2022

LP-DOP-RF-22-02

OTA No. 28

Se inicia colado a las 8 de la mañana en el
tmo tramo de losa entre calle xicotencatl
calle 16 de Septiembre, el laboratorio
realiza revision de revenimiento y toma
muestras de concreto, se termina el colado
sin ningun contratiempo tambien se
realizan trabajos de decimbrado y se
hace limpieza general de obra.



Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento


OTA No. 29

25-Julio-2022

La limpieza general de obra se realiza
tramo de losa y ademas se inicia
actividad de limpieza general de obra, la losa
del canal a quedado terminada al 100%.



Juan Ramirez Huerta



Diego Antonio Sarmiento

00000044

LP-DOP-RF-22-02

Se termina el acimbrado
de losa entre calle Xicotencatl
y Morelos. También se termina
de obra y con esta actividad
se termina en su totalidad
los conceptos de acuerdo
al presupuesto. También se
presenta bitácora y se entrega
recibo de obra para que sea
del expediente.



Ramiro Huerta. Dado Antonio Sarmiento M.

0.000.43

ABRIL - 2022

No. CONTRATO - LP-DOP-RF-22-02

No. 1

Entramiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla Direccion de

Contratista : Construcciones J.W.V. SA de C.V.

Calo : Calle Benito Juarez N. 37 Barrio del Alto Cuautlancingo.

Representante legal: Mauro Juan Ramirez Huerta

Contratante : H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla.

Supervision : Direccion de Obras

Director de Obras: Mtra. Sandra Maria Hogue Gomez

Contrato : LP-DOP-RF-22-02

de Obra : LP-DOP-RF-22-02

Nombre de la obra: Construcción de canal pluvial en la calle Margaritas, entre calle 5 de mayo y Av. 16 de septiembre en el Municipio de -- San Juan Cuautlancingo Puebla

Localidad : San Juan Cuautlancingo

Objeto de los trabajos: Pavimentación Calle Margaritas

Monto de Contrato: 12,874,072.36 (Doce millones ochocientos setenta y Cuatro mil setenta y dos pesos -- 36/100 M.N)

(Continúa Nota No. 1 en la Siguiente hoja)

00000348

CARSI
