

SUJETO DE REVISIÓN:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	CLAVE ASP:	28/04
PERIODO DE REVISIÓN:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.		
PROGRAMA	UNO MAS UNO	NUMERO:	
SUBPROGRAMA	APORTACIÓN	NUMERO:	

RECURSOS DEL PROGRAMA O SUB FUNCIÓN	
PRESUPUESTADOS	\$4,903,518.87
AFECTADOS	\$4,903,518.87
SALDOS COMPROBADOS	\$4,903,518.87

4º DE LA OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIFICACIÓN O REFERENCIA A OBRA Y SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCIÓN DE METAS CUMPLIDAS / MONEDERO DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO	OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL	IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN	OPERA ELECCIONADA PARA REVISIÓN FISCAL O REVISIÓN DEL AGUADO
FORTAMUN 2019	CUAUTLANCINGO / APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA UNO MAS UNO, TRES OBRAS	Convenio	4,903,518.87	*	4,903,518.87	4,903,518.87	REGISTRO CONTABLE, CONVENIO			
	Pago de Aportación para el convenio UNO más UNO.									
	55,456 habitantes									
			4,903,518.87	3.00	4,903,518.87	4,903,518.87			0.00	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNADEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. EZEQUIEL MARTIN HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. Y S.A. JOSE BRAULIO PEREZ CURVAS,
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/15.



Consultores Asociados Angelópolis, S.A. de C.V.

REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LOS FONDOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 5-1
PARTICIPACIONES 20-19
1/2

SUJETO DE REVISIÓN:	MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	CLAVE ASP:	2804
PERIODO DE REVISIÓN:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.		
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NUMERO:	
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCIÓN	NUMERO:	

RECURSOS DEL PROGRAMA O SUB FUNCIÓN	
PRESUPUESTADOS	434,203.23
APLICADOS	434,203.23
SALDOS COMPROBADOS	434,203.23

PUENTE DE MONITOREO	Nº DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO	UBICACIÓN / NOMBRE DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCIÓN DE METAS O ACTIVIDADES / NOMBRE DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	CONCEPTO Y/O DOCUMENTO	OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL	IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN	OTRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN TÉCNICA O MPY CORRELACIONADO
PARTICIPACIONES 20-19	PAR - 19 - 05	LA TRINIDAD SANCTORUM / CONCLUSIÓN DE AULAS EN OBRA GRUPE EN LA UNIDAD EDUCATIVA PRIDA KAH-L, EN EL NIVEL BACHILLER	Contrato	434,203.23	434,203.23	434,203.23	434,203.23	REGISTRO CONTABLE, EXPEDIENTE TECNICO, VALIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
				434,203.23	434,203.23	434,203.23	434,203.23			0.00	

C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.
RECIBIDA

DIRECCIÓN
C. EZEQUIEL MARQUEZ HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. M.A. JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/15.

C. CUATLANCINGO, PUEBLA
2019 - 2021

C. CUATLANCINGO, PUEBLA
2019 - 2021




Consultores Asociados Angelópolis, S.A. de C.V.
REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LOS FONDOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN


ANEXO 5.1
PARTICIPACIONES 2019
2/2


SUJETO DE REVISIÓN:	MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	CLAVE ASP:	0904
PERIODO DE REVISIÓN:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.		
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA	NUMERO:	
SUBPROGRAMA	BANQUETAS	NUMERO:	

RECURSOS DEL PROGRAMA O SUB FUNCIÓN	
PRESUPUESTADOS	5686,935.94
APLICADOS	436,935.94
SALDOS COMPROBADOS	436,935.94

PUENTE DE ENLACE	Nº DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO	UNIFICACIÓN DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS / MONEDERO DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO	OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL	IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN	OTRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FISCAL O SERVICIO RELACIONADO
PARTICIPACIONES 2019	PAR - 19 - 01	SAN ILAN CUATLANCINGO / CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO.	Contrato	686,935.94	686,935.94	686,935.94	686,935.94	REGISTRO CONTABLE, EXISTENTE TECNICO, VALIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
				686,935.94	686,935.94	686,935.94	686,935.94			0.00	



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUATLANCINGO, PUEBLA.



C. Efraim Maldonado Hernández
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.


C. P.C. Y. A. JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELÓPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/15.

OTRATAMIENTOS DE
PÚBLICAS

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION		MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
PERIODO REVISADO		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.	
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA	NUMERO:	
SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION	NUMERO:	

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-32	NOMBRE DE LA OBRA	Pavimento de adocreto en Calle Ramírez, entre calle Pirules y fondo de la misma		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 104.20 m2, excav. 26.04 m3, cimbrado y descimbrado 104.20 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, relleno 5.20 m3, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 651.20 m2,excav. 264.64 m3, acarreo 1er km 344.03 m3, acarreo km subsecuente 2,064.18 m3/km, escarificado 195.36 m3, compactación 195.36 m3, base 169.31 m3, acarreo 1er km 169.31m3, acarreo km subsecuente 18,624.32 m3/km, riego de impregnación 976.8 lt, poreo 651.20m2, piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construccion de dentellon 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 629,791.61	\$ 629,791.61	\$ 207,922.28	\$ 207,922.28

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. oncreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO. piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construccion de dentellon 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2
--

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%		ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
			MESES						
EFICIENCIA =100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC					
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC					
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:									
									
IMPORTE OBSERVADO -									

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.

C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FOKIAMUN-18-32 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Ramirez, entre calle Pirules y fondo de la misma." en la localidad de Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra

C. MARIA GUABALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA. 2018-2021

C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTOR ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCO HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA	NUMERO:
SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION	NUMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-33	NOMBRE DE LA OBRA	Pavimento de adocreto en Calle Solares, entre calle Vicente Suarez y Progreso,		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 180.68 m2, excav. 45.18 m3, cimbrado y descimbrado 180.68 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 31.62 m3 acabado con volteador 903.44 ml, relleno 9.04 m3, sum y aplc. de pintura 472.31 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,468.09 m2,excav. 626.36 m3 acarreo 1er km 814.27 m3, acarreo km subsecuente 4,885.62 m3/km, escarificado 440.43 m3, compactación 440.63 m3, base 381.71 m3, acarreo 1er km 381.71m3, acarreo km subsecuente 41,987.66 m3/km, riego de impregnación 2,202.14 lt, poreo 1,468.09 m2, piso de adocreto 1,468.09 m2, barrido y junteo 1,387.66 m2, construccion de dentellon 15X20cm 536.22 ml, acabado con volteador 536.22ml, corte con cortadora 536.22 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 225.86 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 80 cm 84.50 ml, limpieza general 1,468.09m2				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,374,178.06	\$ 1,374,178.06	\$ 961,924.64	\$ 961,924.64

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. concreto hecho en obra $f_c=150$ kg/cm2 31.62 m3, acabado con volteador 903.44 ml, sum y aplc. de pintura 472.31 m2. PAVIMENTO. piso de adocreto 1,468.09 m2, barrido y junteo 1,387.66 m2, construccion de dentellon 15X20cm 536.22 ml, acabado con volteador 536.22ml, corte con cortadora 536.22 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 225.86 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 84.50 ml, limpieza general 1,468.09m2

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%		ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
MESES									
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC					
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC					
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:									
IMPORTE OBSERVADO									


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C.A. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico

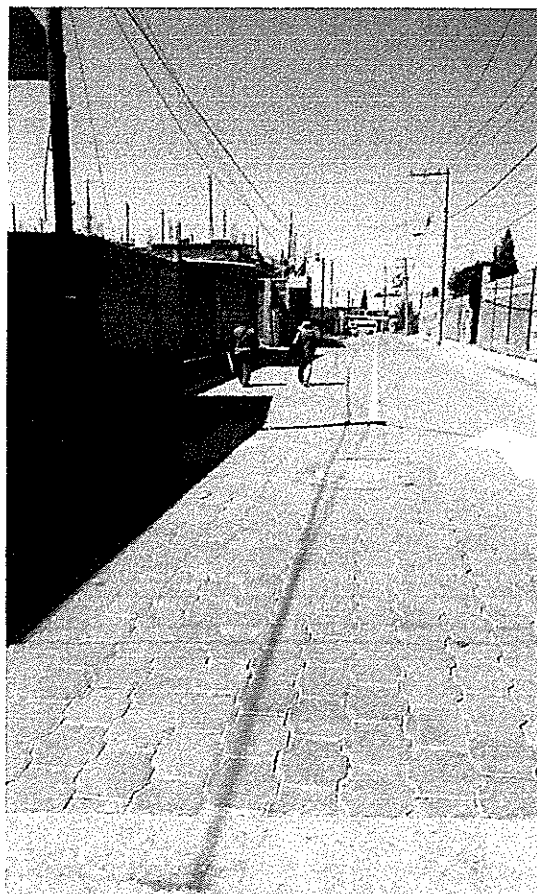



Descripción:


Obra FORTAMUN-18-33 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Solares, entre calle Vicente Suarez y Progreso," en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA


CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
 AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA


AUDITOR DE OBRA.
 ING. FRIKA PEREZ RIVERA

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SAN LORENZO ALMECATLA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-34	NOMBRE DE LA OBRA	Calle Azcatepetzi, entre calle Azcatepetzi y Privada Azcatepetzi, Pavimento de adocreto		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 180.68 m2, excav. 45.18 m3, cimbrado y descimbrado 180.68 m2, concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 31.62 m3, acabado con volteador 903.44 ml, relleno 9.04 m3, sum y aplc. de pintura 472.31 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,468.09 m2,excav. 626.36 m3, acarreo 1er km 814.27 m3, acarreo km subsecuente 4,885.62 m3/km, escarificado 440.43 m3, compactación 440.63 m3, base 381.71 m3, acarreo 1er km 381.71m3, acarreo km subsecuente 41,987.66 m3/km, riego de impregnación 2,202.14 lt, poreo 1,468.09 m2, piso de adocreto 1,468.09 m2, barrido y junteo 1,387.66 m2, construccion de dentellon 15X20cm 536.22 ml, acabado con volteador 536.22ml, corte con cortadora 536.22 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 225.86 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 84.50 ml, limpieza general 1,468.09m2				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 961,175.13	\$ 961,175.13	\$ 961,175.13	\$ 961,175.13

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION.concreto hecho en obra fc=150 kg/cm2 316.7 m3, acabado con volteador 544.0 ml, sum y aplc. de pintura 272 m2. PAVIMENTO. piso de adocreto 901.6 m2, barrido y junteo 937.02 m2, construccion de dentellon 15X20cm 305.32 ml, acabado con volteador305.32 ml, corte con cortadora 305.32 ml, pintura raya continua 136.00 ml, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 22.25 ml, limpieza general 937.02m2

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%		ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)					
MESES								
EFICIENCIA =100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
ACCIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
								
IMPORTE OBSERVADO								

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIA GUADALUPE DANILL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.

C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELÓPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2021

Reporte fotográfico




Descripción:


Obra FORTAMUN-18-34 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Azcatepetzi, entre calle Azcatepetzi y Privada Azcatepetzi," en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.


Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA


C.P.C. Y M.A.J. BRAULIO PÉREZ CULVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA


ING. ERIKA PÉREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
PERIODO REVISADO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.	
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA	NUMERO:
SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION	NUMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SAN LORENZO ALMECATLA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-35	NOMBRE DE LA OBRA	Calle Oriente, entre calle Matamoras y Cuauhtemoc, Pavimento de adocreto		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 169.00 m2, excav. 42.26 m3, cimbrado y descimbrado 33.8.00 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 29.58 m3, acabado con volteador 845.04 ml, relleno 8.46 m3, sum y aplc. de pintura 443.11 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,267.56 m2, demolición 3.38m3, excav. 607.78 m3, muro de piedra braza 42.43m3, acarreo 1er km 794.51m3, acarreo km subsecuente 4,767.06 m3/km, escarificado 380.27 m3, compactación 380.27 m3, base 227.27 m3, acarreo 1er km 329.56m3, acarreo km subsecuente 36,251.93 m3/km, riego de impregnación 1,901.34 lt, poreo 1,267.56m2, piso de adocreto 1,193.38 m2, barrido y junteo 1,193.38 m2, construccion de dentellon 15X20cm 494.52 ml, acabado con volteador 494.52ml, corte con cortadora 494.52 ml, pintura raya continua 211.26 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 36.00 ml, limpieza general 1,267 56 m2 POSTES Reubicación de poste CFF alta tensión 3 pzas, reubicación de poste CFF con transformador 1 pza, reubicacion posta telmex 2.00pzas.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,501,484.16	\$ 1,501,484.16	\$ 594,090.31	\$ 594,090.31

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION.concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 29.58 m3, acabado con volteador 845.04 ml, sum y aplc. de pintura 443.11 m2. PAVIMENTO.muro de piedra braza 42.43m3, piso de adocreto 1,193.38 m2, barrido y junteo 1,193.38 m2, construccion de dentellon 15X20cm 494.52 ml, acabado con volteador 494.52ml, corte con cortadora 494.52 ml, pintura raya continua 211.26 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 36.00 ml, limpieza general 1,267.56 m2. POSTES. Reubicación de poste CFE alta tensión 3 pzas, reubicación de poste CFE con transformador 1 pza, reubicacion poste telmex 2.00pzas.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
MESES								
EFICIENCIA =100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
SERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. YMA I BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCELO HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.




**DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2019. 0004

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico



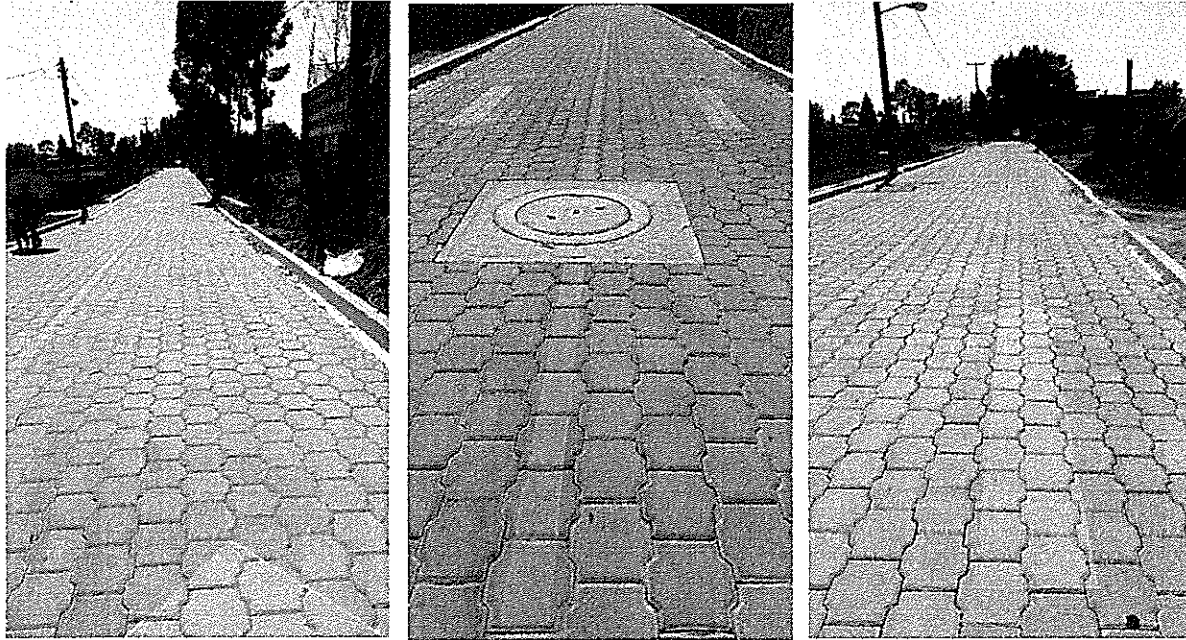


Descripción:

Obra FORTAMUN-18-35 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc," en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra

 PRESIDENCIA MUNICIPAL C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.	 C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS. CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.	 ING. ERIKA PEREZ RIVERA AUDITOR DE OBRA.

SUJETO DE REVISION	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA	NUMERO:
SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION	NUMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SAN LORENZO ALMECATLA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-36	NOMBRE DE LA OBRA	Pavimento de adocreto en Calle Río Balsas, entre calle Díaz Ordaz y Camiño Real		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 161.00 m2, excav. 41.25 m3, cimbrado y descimbrado 24.00 m2, concreto hecho en obra Pc=150 kg/cm2 28.33 m3, acabado con volteador 312.00 ml, relleno 8.26 m3, sum y aplc. de pintura 312 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,159.62 m2, demolición 4.38m3, excav. 583.26 m3, acarreo 1er km 724.36m3, acarreo km subsecuente 4,256.01 m3/km, escarificado 232.65m3, compactación 232.65 m3, base 232.65 m3, acarreo 1er km 315.64m3, acarreo km subsecuente 31,564.36 m3/km, riego de impregnación 1,739.43 lt, poreo 1,159.62 m2, piso de adocreto 965.32.38 m2, barrido y junteo 1,159.62 m2, construccion de dentellon 15X20cm 362.32 ml, acabado con volteador 362.32ml, corte con cortadora 362.32 ml, pintura raya continua 161.00 ml, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 21.00 ml, limpieza general 1,159.62 m2.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,059,531.84	\$ 1,059,531.84	\$ 1,059,531.84	\$ 1,059,531.84

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra $f_c=150$ kg/cm2 28.33 m3, acabado con volteador 312.00 ml, sum y aplc. de pintura 312 m2. PAVIMENTO. Piso de adocreto 965.32.38 m2, barrido y junteo 1,159.62 m2, construccion de dentellon 15X20cm 362.32 ml, acabado con volteador 362.32ml, corte con cortadora 362.32 ml, pintura raya continua 161.00 ml, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 21.00 ml, limpieza general 1,159.62 m2.
--

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
		MESES						
EFICIENCIA =100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



C.P.C. Y M.A.J. BRAULIO PEREZ CUEVAS
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE
2019

Reporte fotográfico

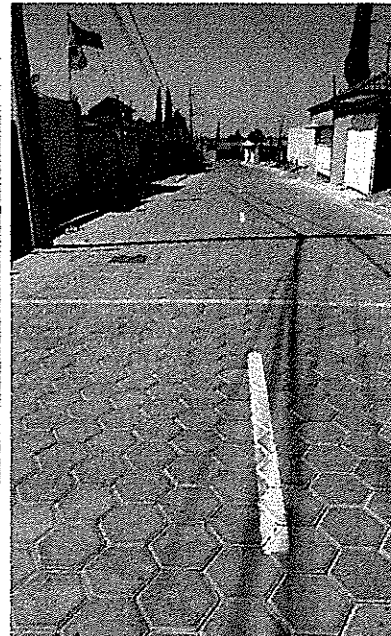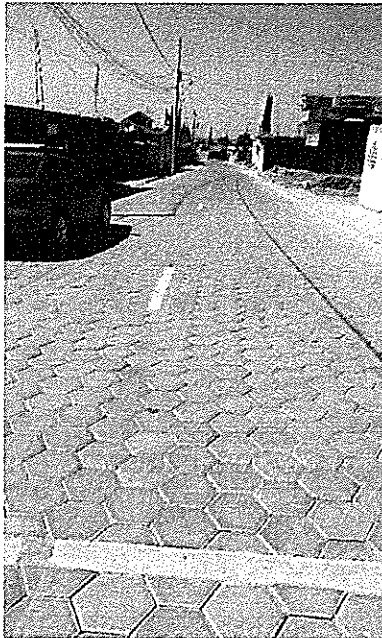



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-36 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Río Balsas, entre calle Díaz Ordaz y Caminio Real" en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.C. Y M.A. Y BRAULIO PÉREZ CUEVAS,
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


ING. ERIKA PÉREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SANTORUM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-37	NOMBRE DE LA OBRA	Calle Aldama, entre calle Allende y Nueva York, Pavimento de adocreto.		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 104.20 m2, excav. 26.04 m3, cimbrado y descimbrado 104.20 m2, concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, relleno 5.20 m3, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 651.20 m2,excav. 264.64 m3, acarreo 1er km 344.03 m3, acarreo km subsecuente 2,064.18 m3/km, escarificado 195.36 m3, compactación 195.36 m3, base 169.31 m3, acarreo 1er km 169.31m3, acarreo km subsecuente 18,624.32 m3/km, riego de impregnación 976.8 lt, poreo 651.20m2, piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construccion de dentellon 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 959,693.06	\$ 959,693.06	\$ 959,693.06	\$ 959,693.06

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, relleno 5.20 m3, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO. Piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construccion de dentellon 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
		MESES						
EFICIENCIA =100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.C. YOLANDA J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUEL MARCO HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2023

Reporte fotográfico

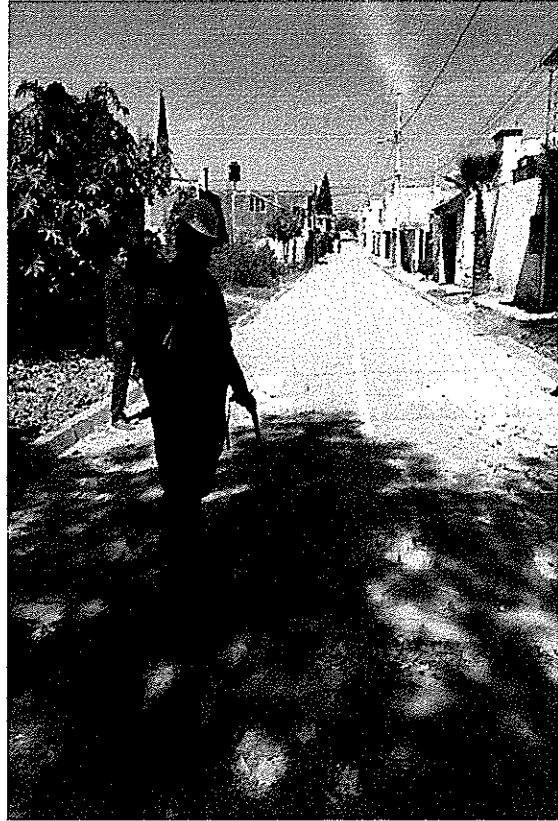



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-37 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Aldama, entre calle Allende y Nueva York" en la localidad de Santorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.C. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SANTORUM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-38	NOMBRE DE LA OBRA	Construcción de Pavimento en concreto de calle Pino Suarez, entre calle Cholula e Independencia		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	Sum y Aplic. Pintura guarnición 355.32 m2, Trazo y Niv. 1,237.98 m2, demolición con máquina 86.65 m3, Excav. 953.24 m3, carga 1,403.85m3 acarreo km subs 15,442.35 m3/km, escarificado 247.60m3, compactación 1,237.98 m2, subrasante 247.60 m3, sub-base 247.60 m3, acarreo 1er km 334.26 m3, acarreo km subsecuente 41,782.50m3/km, base 371.38 m3, Acarreo 1er km 501.36m3, acarreo km subecuenta 62,921.05 m3/km, riego de Impregación 1,856.98 lt, poreo con arena 1,237.98 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 185.71 m3, sum. hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 12,37.98 m2, acabado rastreado aspero 1,237.98 m2, corte 496.60 m, sum y aplic. de junta 496.60m, cimbrado y descimbrado 54.47 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab.,armado col. de acero 148,27kg, pintura de raya continua 177.66 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce15.53 m, limp. general 1,237.98 m2, reparación de tubería 20 descargas, reparacion de toma de agua 20 descargas, Sum y Col. de Boya 98 pzas, Violeta reflejante 158 pzas., sum y col de bote de basura 2 pzas.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 2,083,161.38	\$ 2,083,161.38	\$ 1,458,212.97	\$ 1,458,212.97

RESULTADO DE LA REVISION

Sum y Aplic. Pintura guarnición 355.32 m2, Trazo y Niv. 1,237.98 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 185.71 m3, sum., acabado rastreado aspero 1,237.98 m2, corte 496.60 m, sum y aplic. de junta 496.60m, cimbrado y descimbrado 54.47 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, pintura de raya continua 177.66 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 15.53 m, limp. general 1,237.98 m2, reparación de tubería 20 descargas, reparacion de toma de agua 20 descargas, Sum y Col. de Boya 98 pzas, Violeta reflejante 158 pzas., sum y col de bote de basura 2 pzas.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
MESES								
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
								
IMPORTE OBSERVADO								

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.

Reporte fotográfico

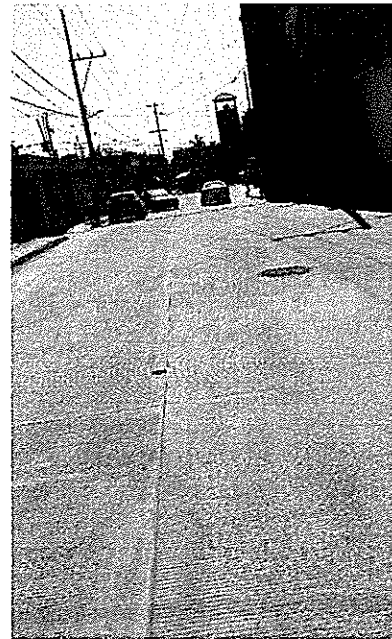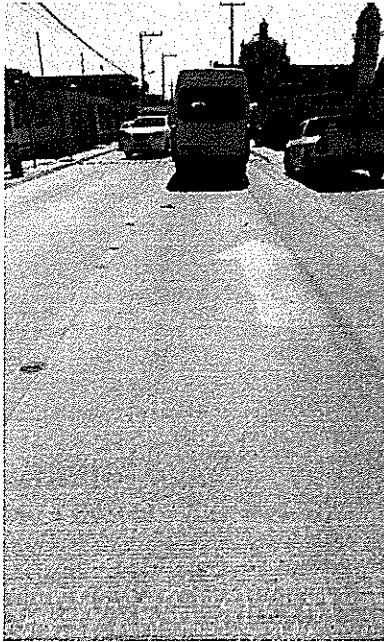

Descripción:

Obra FORTAMUN-18-38 denominada "Construcción de Pavimento en concreto de calle Pino Suarez, entre calle Cholula e Independencia" en la localidad de Santorum, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-39	NOMBRE DE LA OBRA	Calle 2nda Evenecer, entre calle Evenecer y fondo de la misma, Pavimento de adocreto		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 139.86 m2, excav. 34.96 m3, cimbrado y descimbrado 139.86 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 24.48 m3, acabado con volteador 699.28 ml, relleno 7.00m3, sum y apic. de pintura 370.23 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 874.10 m2,excav. 266.36 m3, acarreo 1er km 346.27m3, acarreo km subsecuente 2,077.62m3/km, escarificado 262.23 m3, compactación 262.23 m3, base 227.27 m3, acarreo 1er km 227.27m3, acarreo km subsecuente 24,999.26 m3/km, riego de impregnación 1,311.15 lt, poreo 874.10m2, piso de adocreto 814.15 m2, barrido y junteo 814.15 m2, construccion de dentellon 15X20cm 399.64 ml, acabado con volteador 399.64ml, corte con cortadora 399.64 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 174.82 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 874.10 m2				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	3,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROMISADO
\$ 917,251.10	\$ 917,251.10	\$ 434,409.70	\$ 434,409.70

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION.Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 24.48 m3, acabado con volteador 699.28 ml, sum y apic. de pintura 370.23 m2. PAVIMENTO. Piso de adocreto 814.15 m2, barrido y junteo 814.15 m2, construccion de dentellon 15X20cm 399.64 ml, acabado con volteador 399.64ml, corte con cortadora 399.64 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 174.82 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 874.10 m2

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
		MESES						
EFICIENCIA =100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MANCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE

Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-39 denominada "Pavimento de adocreto Calle 2da Evenecer, entre calle Evenecer y fondo de la misma" en la localidad de Santorum, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.

C.P.C. Y M.C. J. BRAULIO PÉREZ CUEVAS
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PÉREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANSINGO, PUE.,
2019 - 2021

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-41	NOMBRE DE LA OBRA	Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+000 AL 0+120, entre calle Reforma y Pirules		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 109.50 m2, excav. 30.86 m3, cimbrado y descimbrado 219.3 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 19.15 m3, acabado con volteador 219.00 ml, relleno 10.95m3, sum y aplc. de pintura 202.00 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, demolición con máquina 67.2 m3, Excav. 480.00m3, carga 560.00 m3, acarreo km subs 3,180.00 m3/km, escarificado 560.00m3, compactación 960.00 m2, subrasante 240.00 m3, sub base 240.00 m3, acarreo 1er km 240.00 m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, base 240.00 m3, Acarreo 1er km 240.00m3, acarreo km subecuate 24,000.00 m3/km, rieo de impregación 1,440 lt, poreo con arena 960 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 960.00 m2, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplc. de junta 390.00m, cimbrado y descimbrado 25.86 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab.,armado col. de acero 102.36kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 60.00 m2, excav. 12.05 m3, cimbrado y descimbrado 60.00 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 6.00 m3, acabado con volteador 120.00 ml, acabado escobillado fino 60.00m2, lim general 60.00 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE Descargas sanitarias 10 00 pzas, tomas de agua 10 00 pzas				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,617,959.02	\$ 1,617,959.02	\$ 864,792.57	\$ 864,792.57

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 19.15 m3, acabado con volteador 219.00 ml, sum y aplic. de pintura 202.00 m2. PAVIMENTO. concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab. pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 6.00 m3, acabado con volteador 120.00 ml, acabado escobillado fino 60.00m2.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
MESES								
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
EFICIENCIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								




C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico

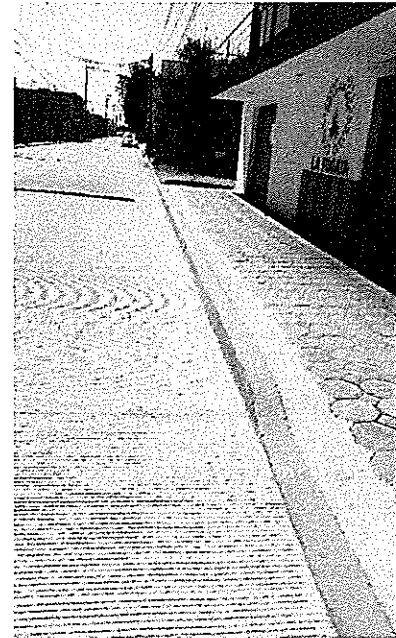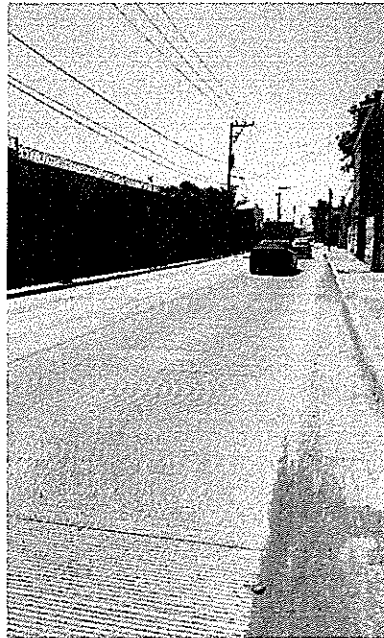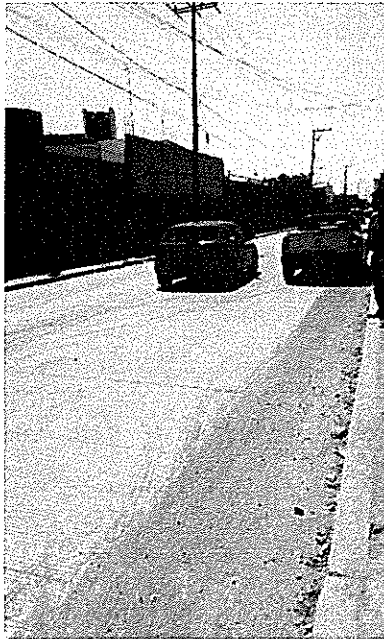

Descripción:

Obra FORTAMUN-18-41 denominada " Construcción de concreto hidráulico Calle Evenecer 0+000 AL 0+120, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones.

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.

C. RAFAEL M. A. T. BRAULIO PEREZ CUEVAS
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCELO HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-42	NOMBRE DE LA OBRA	Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+120 AL 0+240, entre calle Reforma y Pirules,		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 112.35 m2, excav. 31.36 m3, cimbrado y descimbrado 224.70 m2, concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 19.69 m3, acabado con volteador 224.70.00 ml, relleno 11.25m3, sum y aplic. de pintura 224.70 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, demolición con máquina 67.2 m3, Excav. 480.00m3, carga 560.00 m3, acarreo km subs 3,180.00 m3/km, escarificado 560.00m3, compactación 960.00 m2, subrasanta 240.00 m3, sub-base 240.00 m3, acarreo 1er km 240.00 m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, base 240.00 m3, Acarreo 1er km 240.00m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, riego de impregnación 1,440 lt, poreo con arena 960 m2, concreto hecho en obra Fc=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 960.00 m2, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, cimbrado y descimbrado 25.86 m2, sum. hab.,armado col. de acero 102.36kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 70.00 m2, excav. 7.00 m3, cimbrado y descimbrado 70.00 m2, concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 7.00 m3, acabado con volteador 140.00 ml, acabado escobillado fino 70.00m2, lim general 70.00 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, tomas de agua 10.00 pzas				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,584,869.96	\$ 1,584,869.96	\$ 783,389.65	\$ 783,389.65

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra $f_c=150$ kg/cm2 19.69 m3, acabado con volteador 224.70.00 ml, sum y aplic. de pintura 224.70 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, concreto hecho en obra $f_c=250$ kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 144.00 m3, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Concreto hecho en obra $f_c=150$ kg/cm2 7.00 m3, acabado con volteador 140.00 ml, acabado escobillado fino 70.00m2, lim general 70.00 m.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
MESES								
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
CACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
								
IMPORTE OBSERVADO								


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico

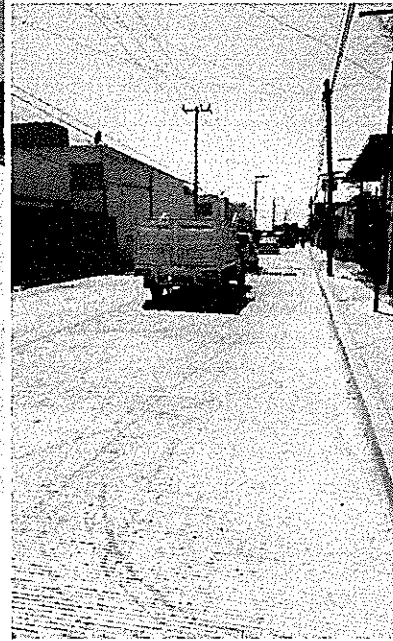

Descripción:

Obra FORTAMUN-18-42 denominada " Construcción de concreto hidráulico Calle Evenecer 0+120 AL 0+240, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra

C. MARIA GUADALUPE DANTEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ING. Y.M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELPODIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-43	NOMBRE DE LA OBRA	Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+240 AL 0+360, entre calle Reforma y Pirules		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 96.00 m2, demolicion 27.00m3, excav. 33.60 m3, cimbrado y descimbrado 192.00 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 16.80 m3, acabado con volteador 480.00 ml, relleno 9.60m3, sum y aplc. de pintura 500.59 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, demolición con máquina 67.20 m3, Excav. 764.28m3, carga 1,080.92 m3, acarreo km subs 8,647.36 m3/km, escarificado 192.00m3, compactación 960.00 m2, subrasante 249.60 m3, sub-base 249.60 m3, acarreo 1er km 249.60 m3, acarreo km subsecuente 24,960.00 m3/km, base 249.60 m3, Acarreo 1er km 249.60 m3, acarreo km subsecuente 24,960.00 m3/km, riego de Impregación 1,440 lt, pozo con arena 960 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tna 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6.6 en pisos 960.00 m2, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 352.00 m, sum y aplc. de junta 352.00m, cimbrado y descimbrado 22.80 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab., armado col. de acero 103.01kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 91.57 m2, excav. 18.31 m3, cimbrado y descimbrado 91.57 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 91.57 m3, acabado con volteador 91.57 ml, acabado escobillado fino 91.57m2, lim general 91.57 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, tomas de agua 10.00 pzas.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,506,241.40	\$ 1,506,241.40	\$ 712,690.03	\$ 712,690.03

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 16.80 m3, acabado con volteador 480.00 ml, sum y aplc. de pintura 500.59 m2. PAVIMENTO. Concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tna 3/4" en cimentación 144.00 m3, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 352.00 m, sum y aplc. de junta 352.00m, cimbrado y descimbrado 22.80 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab., armado col. de acero 103.01kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 91.57 m3, acabado con volteador 91.57 ml, acabado escobillado fino 91.57m2, lim general 91.57 m2.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FÍSICO: 100%	ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)						
		MESES						
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC				
ACCIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA



C.D. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE
2019 2019

Reporte fotográfico

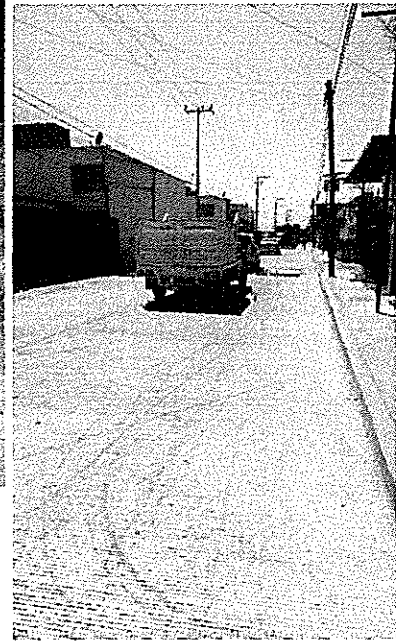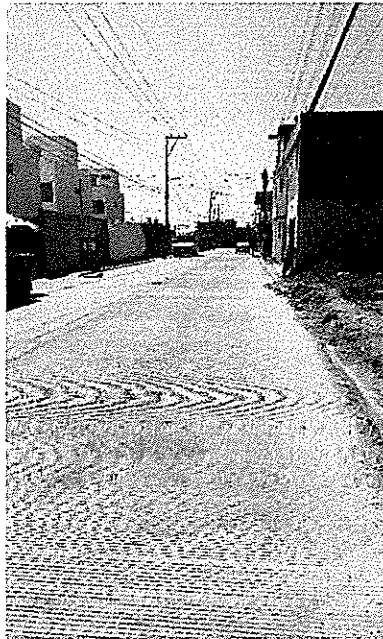



Descripción:


Obra FORTAMUN-18-43 denominada "Construcción de concreto hidráulico Calle Evenecer 0+240 AL 0+360, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCO HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS


ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.

2019 - 2020

REPORT DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION
	NUMERO:
	NUMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	CUAUTLANCINGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NUMERO DE OBRA	FORTA-18-44	NOMBRE DE LA OBRA	Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+360 al 0+499.4, entre calle Reforma y Pirules,		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	GUARNICION.Trazo y Niv. 111.15 m2, demolicion 31.36m3, excav. 39.02 m3, cimbrado y descimbrado 111.15 m2, concreto hecho en obra f'c=15 kg/cm2 19.52 m3, acabado con volteador 557.52 ml, relleno 11.16 m3, sum y aplic. de pintura 578.11 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 1115.04 m2, demolición con máquina 78.05 m3, Excav. 948.75m3, carga 1,335.10 m3, acarreo km subs 10,380.80 m3/km, escarificado 223.01 m3, compactación 1,115.04 m2, subrasante 223.01 m3, sub-base 223.01 m3, acarreo 1er km 223.01 m3, acarreo km subsecuente 10,680.80 m3/km, base 249.60 m3, Acarreo 1er km 249.60 m3, acarreo km subsecuente 24,960.98 m3/km, riego de impregnación 1,6/2.56 lt, poreo con arena 1,115.04 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 167.26 m3, sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 1,115.04 m2, acabado rastreado aspero 1,115.04 m2, corte 411.38m, sum y aplic. de junta 411.38m, cimbrado y descimbrado 26.91 m2, reniv de caja de valvulas de agua 3.00pzas, incremento, reniv de pozo de visita 3.00 pzas, sum y col de brocal con tapa 3.00pzas, sum. hab.,armado col. de acero 118.31 kg, pintura de raya continua 139.38 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 9.60 m, limp. general 1,115.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 58.97 m2, excav. 5.97 m3, cimbrado y descimbrado 58.57 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm 5.97 m3, acabado con volteador 117.94ml, acabado escobillado fino 58.57m2, lim general 58.57 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, reparaciones toma de agua 10.00 pzas, tomas de agua 4.00 pzas.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,983,503.18	\$ 1,983,503.18	\$ 717,829.69	\$ 717,829.69

RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 19.52 m3, acabado con volteador 557.52 ml, sum y aplc. de pintura 578.11 m2. PAVIMENTO. Concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 167.26 m3, sum., acabado rastreado aspero 1,115.04 m2, corte 411.38m, sum y aplc. de junta 411.38m, cimbrado y descimbrado 26.91 m2, reniv de caja de valvulas de agua 3.00pzas, incremento, reniv de pozo de visita 3.00 pzas, sum y col de brocal con tapa 3.00pzas, sum. hab., armado col. de acero 118.31 kg, pintura de raya continua 139.38 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 9.60 m, limp. general 1,115.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 58.97 m2, excav. 5.97 m3, cimbrado y descimbrado 58.57 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm 5.97 m3, acabado con volteador 117.94ml, acabado escobillado fino 58.57m2, lim general 58.57 m2.

FECHA DE VISITA: 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)					
		MESES					
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC			
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC			
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:							
IMPORTE OBSERVADO							

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.S. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

COORDINACIÓN
EN OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.

Reporte fotográfico

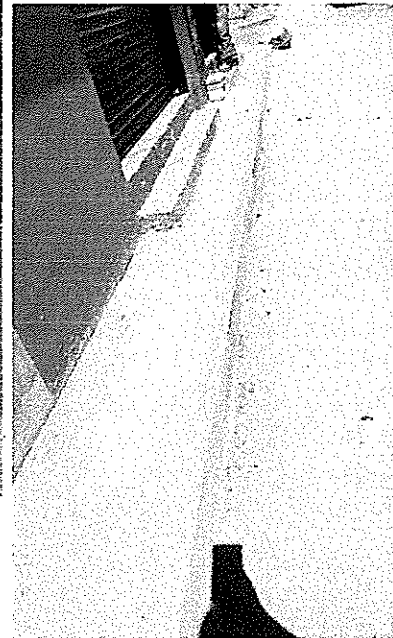



Descripción:


Obra FORTAMUN-18-44 denominada " Construcción de concreto hidráulico Calle Evenecer 0+360 AL 0+499.4, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCO HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA


ING. FRIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.


DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
PERIODO REVISADO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.	
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA	NUMERO:
SUBPROGRAMA	PAVIMENTACION	NUMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SAN LORENZO ALMECATLA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISM 2018
NUMERO DE OBRA	FISM-18-08	NOMBRE DE LA OBRA	Drenaje Sanitario Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	Lim. Trazo 178.0m, excav. 81.2m3, excav. 54.3m3, acarreo 73.2 m3, acarreo km subsecuente 864.30 m3/km, plantilla apisonada 15.3 m3, sum e instal tubo sanitario 178.00 m, relleno en zanjas 42.31 m3, acarreo 1er km 42.8 m3, acarreo subsecuente 428.80 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 400.00m2, excav. 200.32 m3, excav. roca 89.28 m3, acarreo 1er km 124.36 m3, acarreo km subsecuente 1423.45 m3/km, plantilla apisonada 40.00m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N 12 6" diam 400.00m, sum e instal TEE 10"x6" 60 pzas, relleno 180.82 m3, acarreo 1er km 318.67m3, acarreo km subsecuente 3,1503.66 m3/km, pozo de visita 5.00 pzas.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 630,692.68	\$ 630,692.68	\$ 181,210.71	\$ 181,210.71

RESULTADO DE LA REVISION

Lim. Trazo 178.0m, sum e instal tubo sanitario 178.00 m, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 400.00m, sum e instal TEE 10"x6" 60 pzas, relleno 180.82 m3, pozo de visita 5.00 pzas.
--

FECHA DE VISITA 20/03/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)					
		MESES					
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	NOV	DIC			
EFICACIA = 100.00%		REAL	NOV	DIC			
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:							
IMPORTE OBSERVADO							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A S P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2021

Reporte fotográfico



Descripción:


Obra FISM-18-08 denominada "Drenaje Sanitario Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc" en la localidad de san Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.C. Y.M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA NUMERO:
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION NUMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SAN LORENZO ALMECATLA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISM 2019
NUMERO DE OBRA	FISM-19-03	NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE		

DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS

DRENAJE SANITARIO. Trazo y corte 1,556.06m, demolición a mano 54.46 m3, excav. 1,468.77 m3, acarreo 70.80 m3, acarreo km subsecuente 354.00 m3/km, plantilla apisonada 141.60 m3, sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, relleno en zanjas 1,380.07 m3, acarreo 1er km 115.31 m3, acarreo subsecuente 576.57 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 450m2, excav. 450.00 m3, excav. Plantilla apisonada 45.0 m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 600.00m, sum e instal de codo pvc 45° 100 pzas, relleno de zanjas 439.80 m3, acarreo 1er km 13.26 m3, acarreo km subsecuente 668.46 m3/km, registro albañal 40x60x50 cm 100pzas, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de brocal y tapa 10 pzas.

NUMERO DE BENEFICIARIOS 30,000 HABITANTES

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,409,713.48	\$ 1,409,713.48	\$ 1,409,713.48	\$ 1,409,713.48

RESULTADO DE LA REVISION

DRENAJE SANITARIO. sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, Descargas Sanitarias sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 600.00m, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de brocal y tapa 10 pzas.

FECHA DE VISITA: 08/07/2019	AVANCE FÍSICO: 100%	ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (%)						
		MESES						
Eficiencia = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	MAY	JUN				
Eficacia = 100.00%		REAL	MAY	JUN				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								



C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico

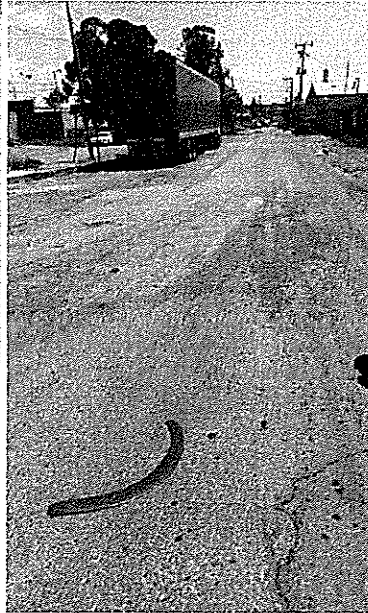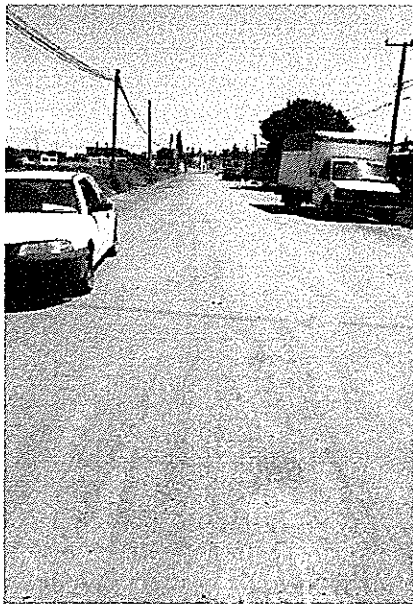


Descripción:


Obra FISM 19-03 denominada "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE" en la localidad de san Lorenzo Almecatia, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.


C.P.C. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANSINGO, PUEBLA.


ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

SUJETO DE REVISION MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA **NUMERO:**
SUBPROGRAMA PAVIMENTACION **NUMERO:**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	CUAUTLANCINGO	LOCALIDAD	SAN LORENZO ALMECATLA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISM 2019
NUMERO DE OBRA	FISM-19-03	NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	DRENAJE SANITARIO. Trazo y corte 1,556.06m, demolición a mano 54.46 m3, excav.1,468.77 m3, acarreo 70.80 m3, acarreo km subsecuente 354.00 m3/km, plantilla apisonada 141.60 m3, sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, relleno en zanjas 1,380.07 m3, acarreo 1er km 115.31 m3, acarreo subsecuente 576.57 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 450m2, excav. 450.00 m3, excav. Plantilla apisonada 45.0 m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N 12 6" diam 600.00m, sum e instal de codo pvc 45° 100 pzas, relleno de zanjas 439.80 m3, acarreo 1er km 13.26 m3, acarreo km subsecuente 668.46 m3/km, registro albañal 40x60x50 cm 100pzas, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de brocal y Lapa 10 pzas.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

RECURSOS

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 1,409,713.48	\$ 1,409,713.48	\$ 1,409,713.48	\$ 1,409,713.48

RESULTADO DE LA REVISION

DRENAJE SANITARIO. sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, Descargas Sanitarias sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 600.00m, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de brocal y tapa 10 pzas.

FECHA DE VISITA	AVANCE FISICO	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (1)						
08/07/2019	100%							
		MESES						
EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	MAY	JUN				
Eficacia = 100.00%		REAL	MAY	JUN				
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:								
IMPORTE OBSERVADO								



C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. P. Y M. A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico

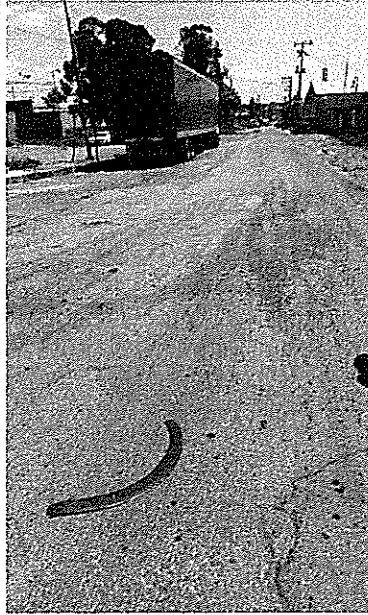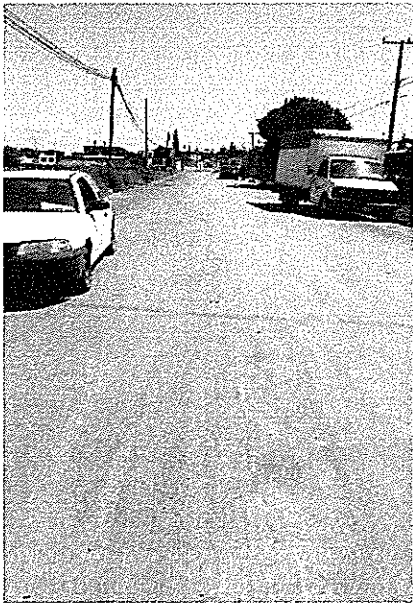


Descripción:


Obra FISM-19-03 denominada "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE" en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C.P.C. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.


C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS


ING. ERIKA PEREZ RIVERA
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2020

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUATILANCIENGO, PUEBLA.		PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.		CLAVE ASF: 08/04.				
PROGRAMA:								
SUBPROGRAMA:								
NUMERO DEL PROGRAMA:								
NUMERO DEL SUBPROGRAMA:								
LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTEATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Art. 44	El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: I. Difundir la invitación en Compañías y en la página de Internet de la dependencia o entidades;	FISM-19-03 / DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	FISM	SAN LORENZO ALMECATLA / DRENAJE SANITARIO. Trazo y corte 1,556.65m; demolición a mano 54.46 m3, excav.1,468.77 m3, acarreo 70.80 m3, acarreo km subsecuente 354.00 m3/km, plantilla apisonada 141.50 m3, sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, relleno de zanjas 1,380.07 m3, acarreo 1er km 115.31 m3, acarreo subsecuente 536.57 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 450m2, excav. 450.00 m3, excav. Plantilla apisonada 45.0 m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo 4-12 6" diam 600.00m, sum e instal de todo PVC 450.00 m3, relleno de zanjas 439.80 m3, acarreo 1er km 13.26 m3, acarreo km subsecuente 668.46 m3/km, registro albañal 40x60x50 cm .00pzas, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de broca y tapa 30 pzas.	\$ 1,409,713.48	\$1,409,713.48	No se difundió la invitación a Compañías.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Art. 46	En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica. (Bitácora Electrónica).	FISM-19-03 / DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	FISM	SAN LORENZO ALMECATLA / DRENAJE SANITARIO. Trazo y corte 1,556.65m; demolición a mano 54.46 m3, excav.1,468.77 m3, acarreo 70.80 m3, acarreo km subsecuente 354.00 m3/km, plantilla apisonada 141.50 m3, sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, relleno de zanjas 1,380.07 m3, acarreo 1er km 115.31 m3, acarreo subsecuente 536.57 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 450m2, excav. 450.00 m3, excav. Plantilla apisonada 45.0 m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo 4-12 6" diam 600.00m, sum e instal de todo PVC 450.00 m3, relleno de zanjas 439.80 m3, acarreo 1er km 13.26 m3, acarreo km subsecuente 668.46 m3/km, registro albañal 40x60x50 cm .00pzas, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de broca y tapa 30 pzas.	\$ 1,409,713.48	\$1,409,713.48	No cuenta con Bitácora Electrónica.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Art. 64	El contratista comunicará a la dependencia la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. A finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contratada con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento de acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.	FISM-19-03 / DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	FISM	SAN LORENZO ALMECATLA / DRENAJE SANITARIO. Trazo y corte 1,556.65m; demolición a mano 54.46 m3, excav.1,468.77 m3, acarreo 70.80 m3, acarreo km subsecuente 354.00 m3/km, plantilla apisonada 141.50 m3, sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, relleno de zanjas 1,380.07 m3, acarreo 1er km 115.31 m3, acarreo subsecuente 536.57 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 450m2, excav. 450.00 m3, excav. Plantilla apisonada 45.0 m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo 4-12 6" diam 600.00m, sum e instal de todo PVC 450.00 m3, relleno de zanjas 439.80 m3, acarreo 1er km 13.26 m3, acarreo km subsecuente 668.46 m3/km, registro albañal 40x60x50 cm .00pzas, pozo de visita 10.00 pzas., sum y col de broca y tapa 30 pzas.	\$ 1,409,713.48	\$1,409,713.48	No cuenta con acta de Entrega por la Contratista al H. Ayuntamiento de Cuatilan, Puebla.

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUATLANHUEH, PUEBLA.	
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.	CLAVE ASP: 08/04.
PROGRAMA:	
SUBPROGRAMA:	
NUMERO DEL PROGRAMA:	
NUMERO DEL SUBPROGRAMA:	

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
Ley de Coordinación Hacienda del Estado de Puebla y sus Municipios	Art. 134	Para efectos de artículo anterior, los Municipios promoverán la participación social, mediante la integración de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal o cualquier otra instancia de naturaleza similar, con el objeto de que se acuerden y propongan las obras y acciones a realizar para atender las demandas de su población, las cuales deberán guardar congruencia con los ejes directrices contenidos en: los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo.	FISM-19-03 / PERIABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	FISM	SAN LORENZO ALMECATLA / DRENAJE SANITARIO. Trazo y corte 1,556.46m: acropólido a maso 54.46 m3 excav.1,468.77 m3, acarreo 70.80 m3, zancho km subsecuente 354.00 m2/km, plantilla apisonada 141.60 m3, sum e instal tubo sanitario PAD 15CM 778.03 m, relleno zanjas 1,380.07 m3, acarreo 1er km 115.31 m3, acarreo subsecuente 534.37 m3/km, Descargas Sanitarias Jm y trazo 450m2, excav. 455.30 m3, excav. Plantilla apisonada 45.0 m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo 4-12 6" diam 600.00m, sum e instal de todo pvc 45" 133 pzas, relleno de zanjas 439.00 m3, acarreo 1er km 13.26 m3, acarreo km subsecuente 668.46 m3/km, registro albañal 40x60x50 cm 100pzas, pozo de visita 10.00 pzas, sum y col de brocal y tapa 100 pzas.	\$ 1,409,713.48	\$1,409,713.48	La obra no se encuentra Priorizada por COPLADEMUN
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Art. 44	El procedimiento de invitación a cuantos menos tres personas se sujetará a lo siguiente: I. Difundir la invitación en Compañías y en la página de Internet de la dependencia o entidad;	FISM-19-04 / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AV. DE LAS PALOMAS.	FISM	LA TRINIDAD SANCTORUM / DRENAJE SANITARIO, Descargas Sanitarias, pozo de visita	695,537.68	\$895,537.68	No se difundió la invitación a Compañías.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Art. 46	En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica. (Bitácora Electrónica).	FISM-19-04 / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AV. DE LAS PALOMAS.	FISM	LA TRINIDAD SANCTORUM / DRENAJE SANITARIO, Descargas Sanitarias, pozo de visita	695,537.68	\$895,537.68	No cuenta con Bitácora Electrónica.

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CLAVE ASP: 08/04.

PROGRAMA:

NÚMERO DEL PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA:

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
Ley de Coordinación Hacienda del Estado de Puebla y sus Municipios	Art. 134	Para efectos del artículo anterior, los Municipios promoverán la participación social, mediante la integración de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal o cualquier otra instancia de naturaleza similar, con el objeto de que se acuerden y promuevan las obras y acciones a realizar para atender las demandas de su población. Los cuales deberán guardar congruencia con los ejes y directrices contempladas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo.	FISM-49-04 / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y AV. DE LAS PALOMAS.	FISM	LA TERCERA SANCTORUM / DRENAJE SANITARIO, Desagües Sanitarios, por la vía de visita	895,537.68	\$895,537.68	La obra no se encuentra priorizada por COPLACERUN.
TOTAL							\$2,305,251.16	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. EZEQUIEL MARCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. EZEQUIEL M.A.J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

CUAUTLANCINGO, PUE.

CUAUTLANCINGO, PUE.

6. EVIDENCIAS

**MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL
2019**

**PRIMER INFORME PARCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DE 2019.**



ANEXO

6

Fecha: 31 DE JULIO DE 2019.

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL DESPACHO CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.

Dr. Alberto Segovia Blumenkron.
Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado.
Presente.

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hacemos constar que pusimos a disposición del Despacho Consultores Asociados Angelópolis S.A. De C.V., la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público de los meses de Enero a Junio, dicha revisión la realizó en las Oficinas del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

C. GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



**DEPENDENCIA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
31-07-2019

C.P.C. M.A. JOSE DRAULIO PEREZ CUEVAS
CONSULTORES ASOCIADOS
ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.



Solo Cargo

Nº Sol 487 Nº Póliza 41 Beneficiario MARCELINO MINERO LOPEZ Cuenta SCOTIABANK 03604281810

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - SCOTIABANK 03604281810	\$0.00	\$71,119.60	20-mar.-2019
2112124	- CUENTAS BANCARIAS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARCELINO MINERO LOPEZ - PROVEEDORES	\$71,119.60	\$0.00	

Importe

\$ 71,119.60

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA: 19/03/2019

MONTO A PAGAR: \$ 71,119.60

PARTICIPACIONES

☐

RECURSOS FISCALES

☒

FACTURA(S):

FACTURA	MONTO
221	\$ 71,119.60
TOTAL	71,119.60

FACTURA	MONTO
SUBTOTAL	-

CONCEPTO:

HERRERÍA, HOJALATERÍA Y PINTURA

PROVEEDOR.

MARCELINO MINERO LOPEZ

CUENTA BANCARIA:

CLABE INTERBNCARIA:

002650005300465400

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

AUTORIZA

MARÍA GUADALUPE DANIEL
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



APLICA
TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

20 MAR 2019
PAGADO

20/3/2019

Scotiabank

03

2019/03/20

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

15:45:20

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTE

Nombre

Cuenta de Cargo

Importe

I.V.A.

Moneda

Tipo de envío

Fecha de Aplicación

Fecha de Operación

Instrucción de Pago

R.F.C.

Concepto

Referencia (Numérica)

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

CHQ-MXN-PUEBLA, PU-03604281810-MUNICIPIO

71,119.60

0.00

MXN - PESO MEXICANO

1-MISMO DÍA (SPEI)

2019/03/20

2019/03/20

1-SPEI

MCP850101944

HERRERIA, HOJALATERIA Y PINTURA

200319

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono

Banco

Tipo de Persona

R.F.C.

Nombre Beneficiario/Razón Social

Comisión

I.V.A. Comisión

Costo de Transmisión

Estado de Operación

Folio

Clave de Rastreo

Mensaje

002650005300465400

BANAMEX

1. PERSONA FÍSICA

MILM580602-AR7

MARCELINO MINERO LOPEZ

7.00

1.12

0.00

APLICADO

24080593702

2019032040044B36K0000005006981

SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

[001] MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ

 Scotiabank

SIN-941202-514

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



MARCELLINO MINERO LOPEZ

MIL M580602AR/

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CHECOSLOVAQUIA, 6, VILLA OLIMPICA, 72724, CUAUTLANCINGO, Puebla, México
Tel. (222) 2 85 44 81

CLIENTE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
MCP850101944

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Palacio Municipal Sn Cuautlancingo, 72700 Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, México

CIATAS ASOCIADOS
CIATAS ANGELOPOLIS

REVISADO

Factura 221

FOLIO FISCAL (UUID)

FEBC17D4-A397-4BA8-A5E0-2B16920A7F21

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306972120

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-09T23:58:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-09T23:52:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72724

CONCEPTOS					Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción				
1.00	E48	Destruir y enderezar compuerta de empuje de compactador 03			\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 4,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 688.00				
1.00	E48	Reparación de tramo de corredera de caja de compactador 03			\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 240.00				
2.00	F48	Fabricación de soportes de placa de 3/8 de corredera de caja de compactador 03			\$ 700.00	\$ 1,400.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 224.00				
2.00	E48	Fabricación de pernos de 2" x 45 cm de cuna de compactador 09 y soldar pieza			\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 3,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 608.00				
1.00	E48	Soldar y enderezar placa de base de pernos de cuna de lado derecho compactador 09			\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 3,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 480.00				
2.00	F48	Enderezar bases de guías de pernos de 2" compactador 09			\$ 600.00	\$ 1,200.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 192.00				
2.00	E48	Fabricación de placas de 3/16 para bases de guías			\$ 450.00	\$ 900.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.00				
2.00	E48	Vaciado de tornillos 1" de base de guías de compactador 09			\$ 400.00	\$ 800.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 128.00				
2.00	E48	Extraer pernos rotos de cuna de 2" compactador 09			\$ 800.00	\$ 1,600.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 256.00				
1.00	E48	Soldar costado de caja parte superior de corredera de compactador 09			\$ 600.00	\$ 600.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00				
2.00	E48	Fabricación de bases de guías de correderas en placa y solera de laminil compactador 03			\$ 3,900.00	\$ 7,800.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 7,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,248.00				
2.00	E48	Fabricación de pernos de 2" x 11" para guía de pala compactador 03			\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 3,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 512.00				

1.00	E48	Extraer perno de cucharón de compactador 03	\$ 750.00	\$ 750.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.00		
1.00	E48	Fabricación de perno de 2 1/4 por 6" y soldar placa para perno de cortina compactador 03	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 224.00		
2.00	E48	Enderezar placas de tapa de caja de compactador 03	\$ 400.00	\$ 800.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 128.00		
1.00	E48	Fabricación de tapa de placa de 3/16 de costado de caja de compactador 03	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 208.00		
2.00	E48	Soldar placas de media por 5 " x 5" de caja de correderas de compactador 03	\$ 750.00	\$ 1,500.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 240.00		
2.00	E48	Cortar pernos de gato hidráulico de cuna compactador 10	\$ 500.00	\$ 1,000.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 160.00		
2.00	E48	Fabricación de buges de bástago de gato hidráulico de 1/2 x 1 1/4 de compactador 10	\$ 350.00	\$ 700.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 112.00		
2.00	E48	Fabricación de pernos en acero de 1 1/4 por 30 cm para gatos hidráulicos compactador 10	\$ 980.00	\$ 1,960.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,960.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 313.60		
1.00	E48	Soldar costado de caja de lado derecho de compactador 10	\$ 700.00	\$ 700.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 112.00		
1.00	E48	Soldar cucharón de lado derecho de compactador 10	\$ 400.00	\$ 400.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 64.00		
1.00	E48	Soldar ostribo de lado derecho compactador 10	\$ 400.00	\$ 400.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 64.00		
2.00	E48	Enderezar costados de caja y soldar de compactador 06	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 4,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 672.00		
2.00	E48	Soldar refuerzos de costado de caja en placa de 3/16 x 60 cm	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 2,800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 448.00		
1.00	E48	Soldar piso de caja de compactador 06	\$ 600.00	\$ 600.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00		
1.00	E48	Enderezar y soldar refuerzo de base de caja de pala compactador 08	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 256.00		
1.00	E48	Desmontar tubo y soldar hidráulico compactador 03	\$ 550.00	\$ 550.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 550.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 88.00		

1.00	E48	Fabricación de perno de 2" x 40 cm de guala de corredera lado derecho compactador 04	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 304.00		
1.00	E48	Fabricación de base de guala de placa y solera de lainamil lado derecho	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 3,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 624.00		
2.00	E48	Enderezado de bases de lapas de correderas de compactador 04	\$ 450.00	\$ 900.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.00		
2.00	E48	Soldar costados de caja de compactador 04	\$ 450.00	\$ 900.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.00		
1.00	E48	Soldar fugas de aceite de gato hidráulico lado derecho de compactador 04	\$ 750.00	\$ 750.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.00		
1.00	E48	Rellenar cople y torrear de cardán de camión volteo kodlak	\$ 600.00	\$ 600.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00		
1.00	E48	Fabricación de casquillo para unir cardán de camión volteo kodlak	\$ 500.00	\$ 500.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.00		
1.00	E48	Soldar cardán y balancear en torno camión de volteo kodlak	\$ 750.00	\$ 750.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 750.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.00		
1.00	E48	Soldar tubo con autógena de agua de camión de compactador 03	\$ 450.00	\$ 450.00
		Clave Prod. Serv. - 73181001 Servicios de tornería		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 72.00		


IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS, 60/100 MXN


TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 61,310.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 9,809.60
TOTAL \$ 71,119.60



SELLO DIGITAL DEL CFDI
HQADA7h1b8/mS9UbiKB5IV6hL1Y3wGOFOKsWlkvA2dEV2PO4GnKV4Rd3qBnLN845j/XwAKTipGO04KJrohqlR47xijJ7/LdFN7ix0Ufnyb
IHfw9h5ja0io96a11wa1BPEKvCy+Dfn8jKRPBI=
SELLO DIGITAL DEL SAT
cy91GSW2U0TmlTmr8jadsYyJWfvaenAeCnzN1PyQ3XUIBkeRSaN341jbYp/njsCJ93IMX4L162062GIZ/6W591dntc1bJFwWxXZMDCMCBIP0PY6dQ2jkcZG+VSKl2cl
wovJmC19F4xbShUzVXkMxkwmZKPB85E1Yfr+thKVSU0JP+5UwAAxiRzDha8W24PvGCUG6Ad4Hapzlc/8JwA3zLvxoqlV41jUzqZ85JmCldwaa5DL1Vr1Sy6h7X
oobVYwKAQweoaWVul10mlel1/93ibQIYw0i1PnNLVqPFQIBt8AGIB/3QIV8qB8AnwaHR8VOL5jJHvFpFell1sXA=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]FEBC17D4-A397-48A8-A5C0-2D16820A7F21j2019-03-
09T23:58:29[SVT110323827]HQADA7h1b8/mS9UbiKB5IV6hL1Y3wGOFOKsWlkvA2dEV2PO4GnKV4Rd3qBnLN845j/XwAKTipGO04KJrohqlR47xijJ7/LdFN7ix0Ufnyb
omopv1qoOyXnL4hUSxEEPYIHfw9h5ja0io96a11wa1BPEKvCy+Dfn8jKRPBI=[00001000000413073350]



CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 2102

F. EMISION 20-mar.-2019

F. AFECTACION 20-mar.-2019

No.Póliza: 191

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 487 Justificación: 523

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8273551	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -	71,119.60	
8263551	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -		71,119.60
Sumas Iguales:		\$71,119.60	\$71,119.60

CASA CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 2101

F. EMISION 20-mar.-2019

F. AFECTACION 20-mar.-2019

No.Poliza: 190

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SOLICITUD NUMERO 487 Justificación: 523

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8263551	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -	71,119.60	
8253551	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -		71,119.60
Sumas Iguales:		\$71,119.60	\$71,119.60

CASA CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 2100

F. EMISION 20-mar.-2019

F. AFECTACION 20-mar.-2019

No.Poliza: 189

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 487 Justificación: 523

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8253551	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -	71,119.60	
8243551	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE -		71,119.60
Sumas Iguales:		\$71,119.60	\$71,119.60

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

MILM580602AR7	MARCELINO MINERO LOPEZ	MCP850101944	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
---------------	------------------------	--------------	-----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

FEBC17D4-A397-48A8-A5E0-2B16920A7F21	2019-03-09T23:52:59	2019-03-09T23:58:29	SVT110323827
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$71,119.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
-------------	---------	---------	---------------------------

CMA CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

Imprimir

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1270	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS TESORERÍA	523	20/03/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0507 MARCELINO MINERO LOPEZ
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta CLABE)
MILM580602AR	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	01-abril-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NO.	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	1180000205111343551	7F21	3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,146.00	
1	1210000305111343551	7F21	3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,973.60	
51353551	POLIZA CONTABLE No. 167			71,119.60	0.00
2112124 PRO0507	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	71,119.60
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARCELINO MINERO LOPEZ				
	Sumas Iguales:			\$71,119.60	\$71,119.60

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

MONTO NETO A PAGAR:

\$71,119.60




Cantidad con letra : Setenta y un mil ciento diecinueve pesos 60/100 M. N.





CONCEPTO :

SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO




ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MANUEL PEREZ	

CUAUTLANCINGO, PUE.
2019, 03/21


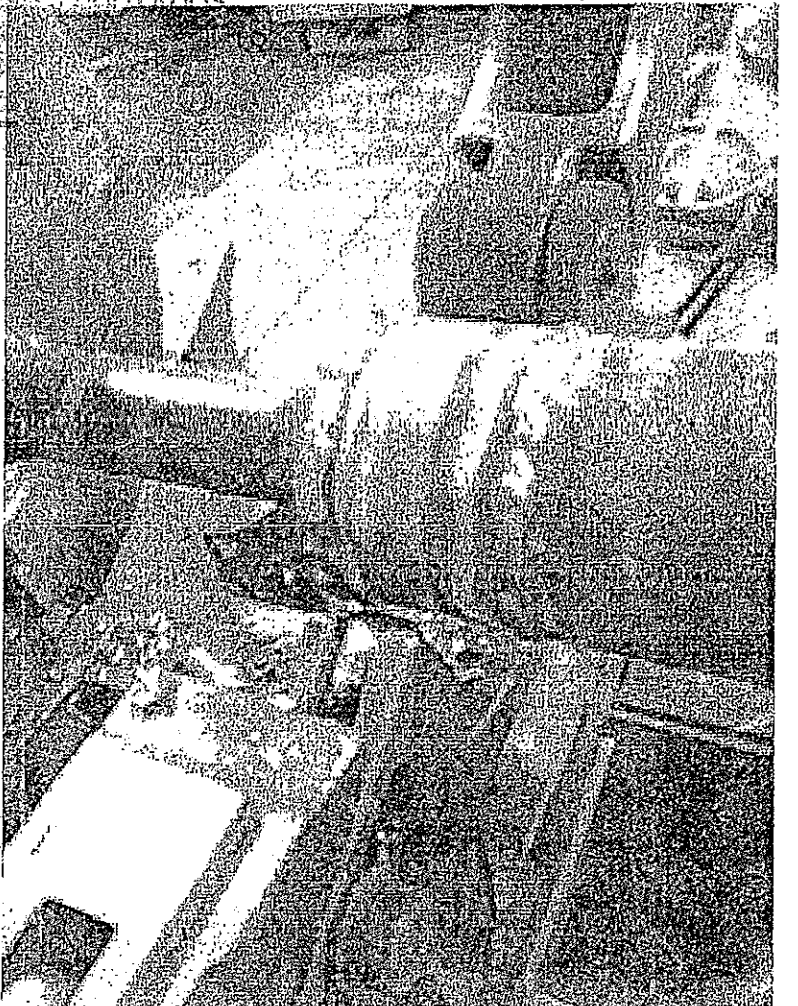
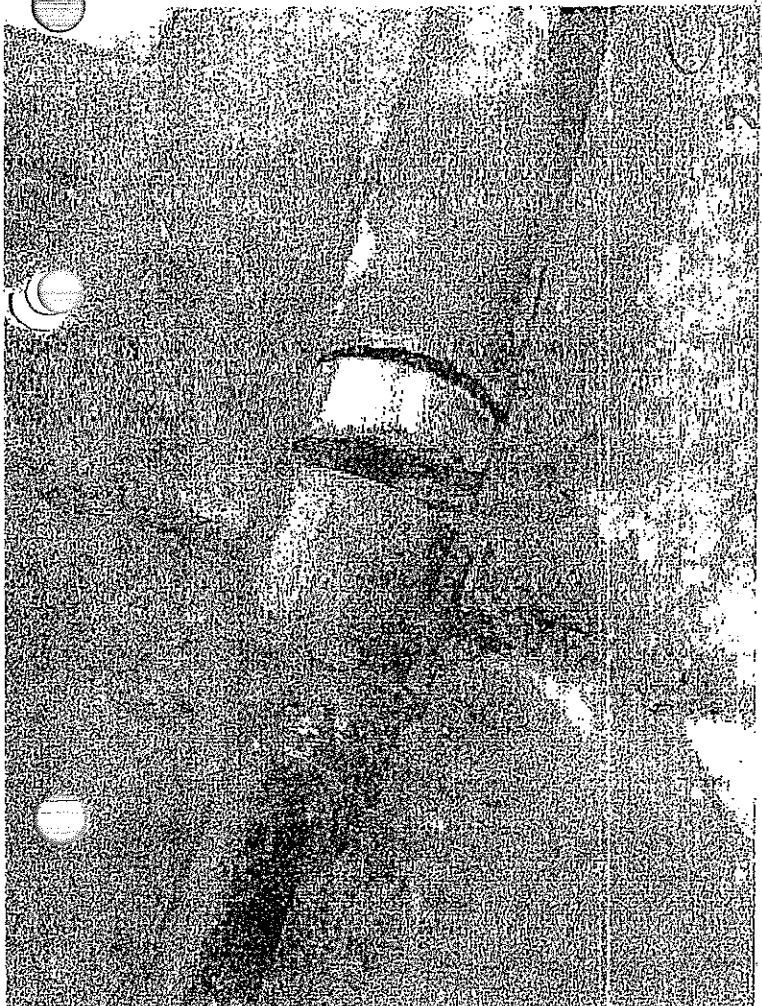
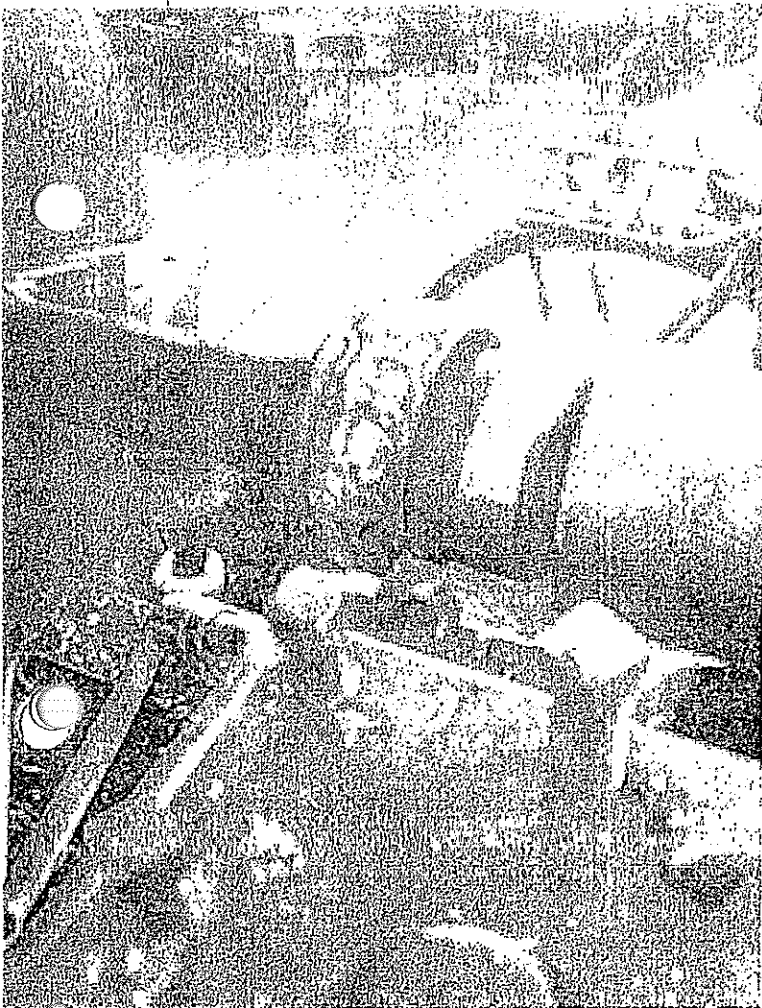


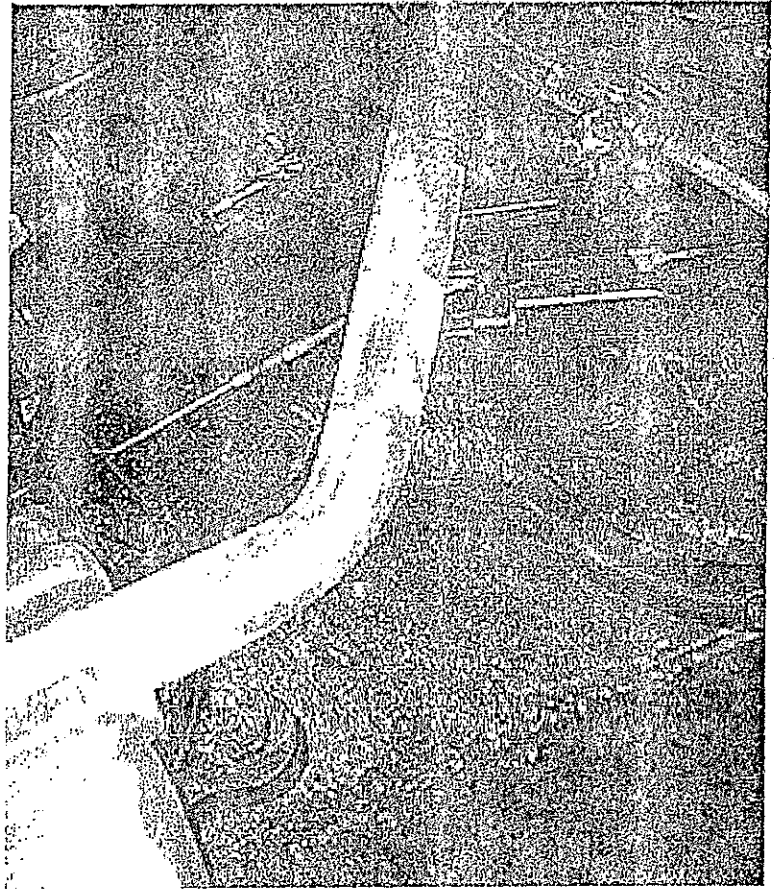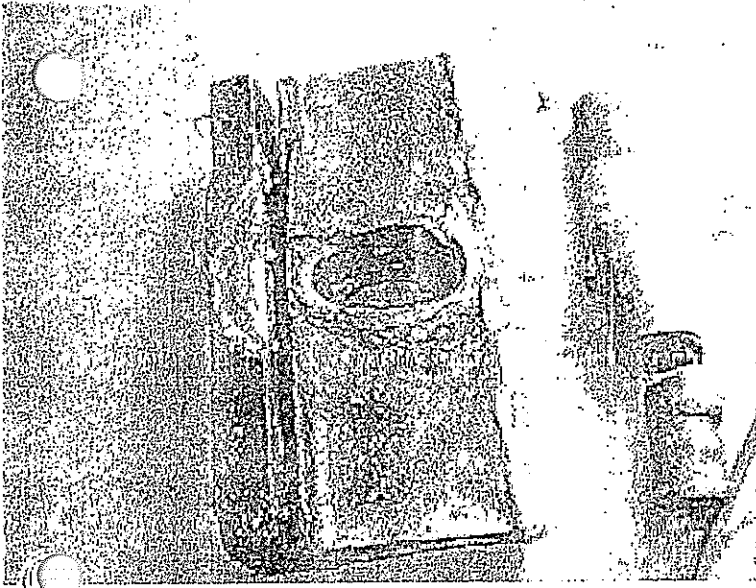

ESTUDES
OCYADOS
CIVILIANCIOTOLIS
REVISADO

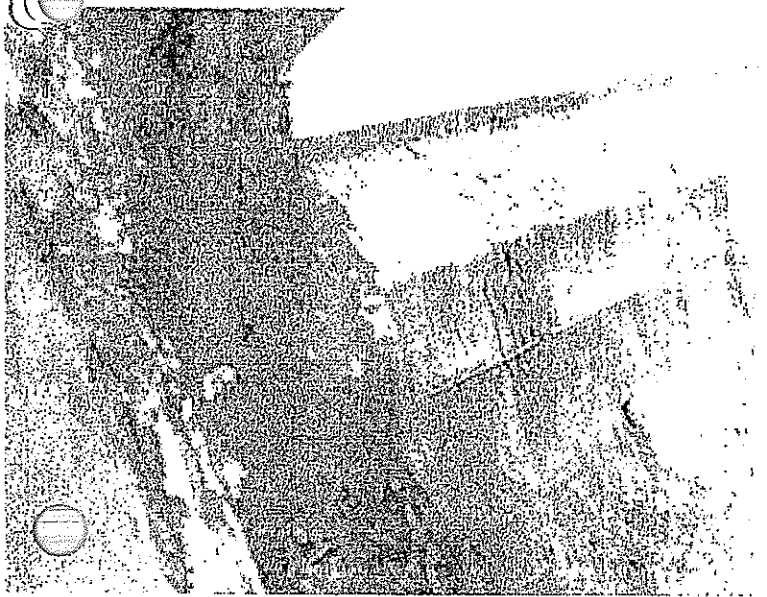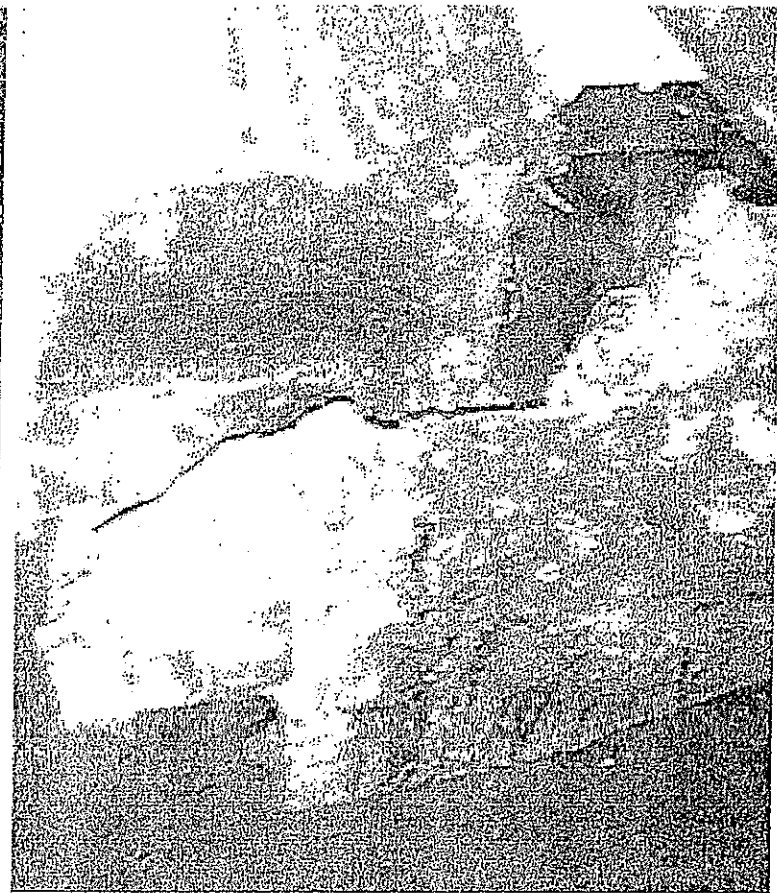






COMPANHIA GOMES DE SOUZA
ASSOCIADOS
ANGELÓPOLIS
REVISADO

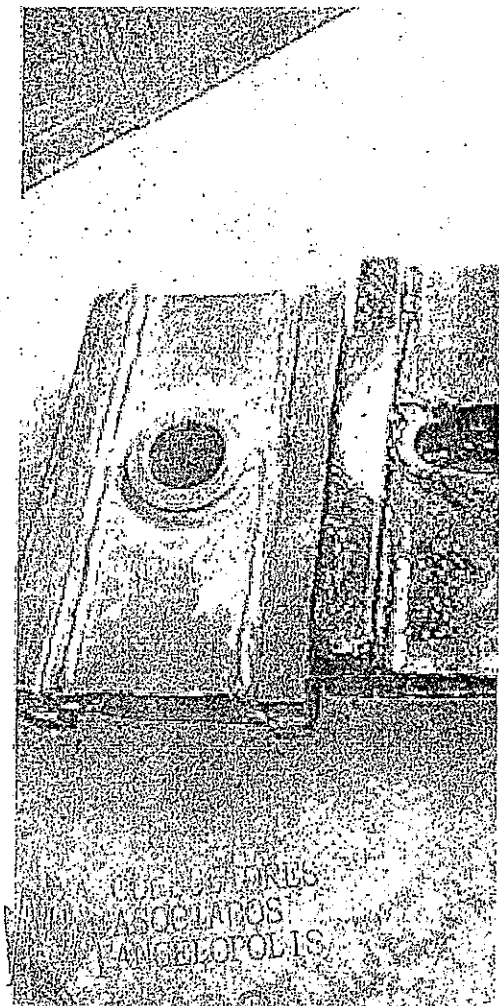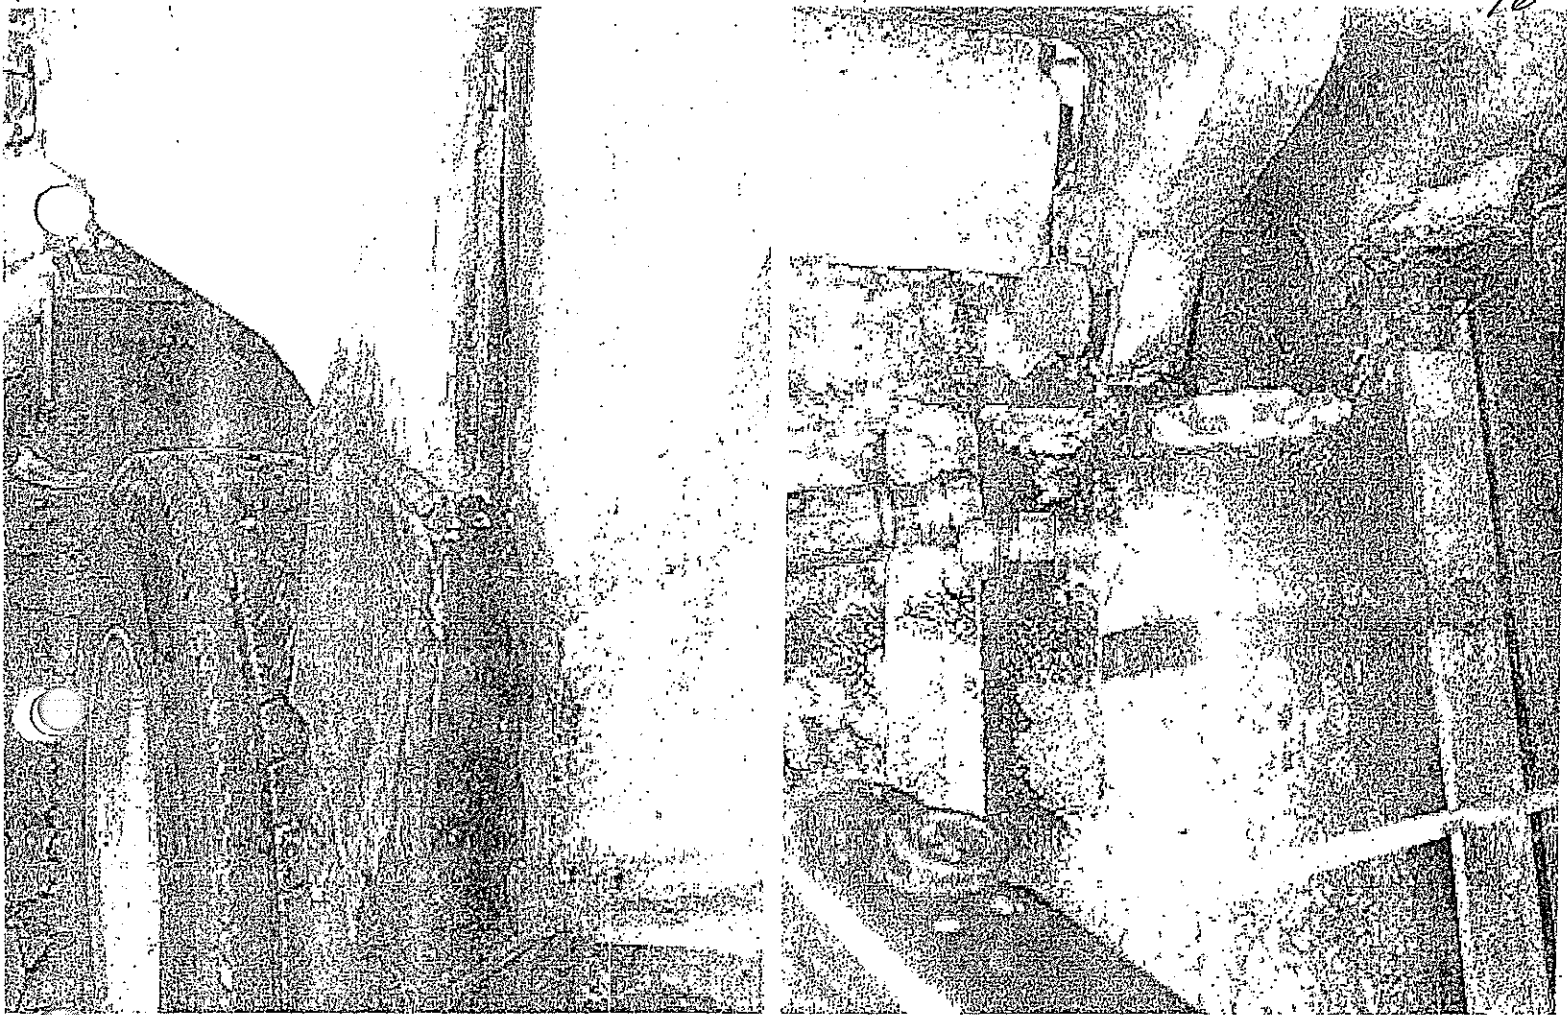




CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS



REVISADO

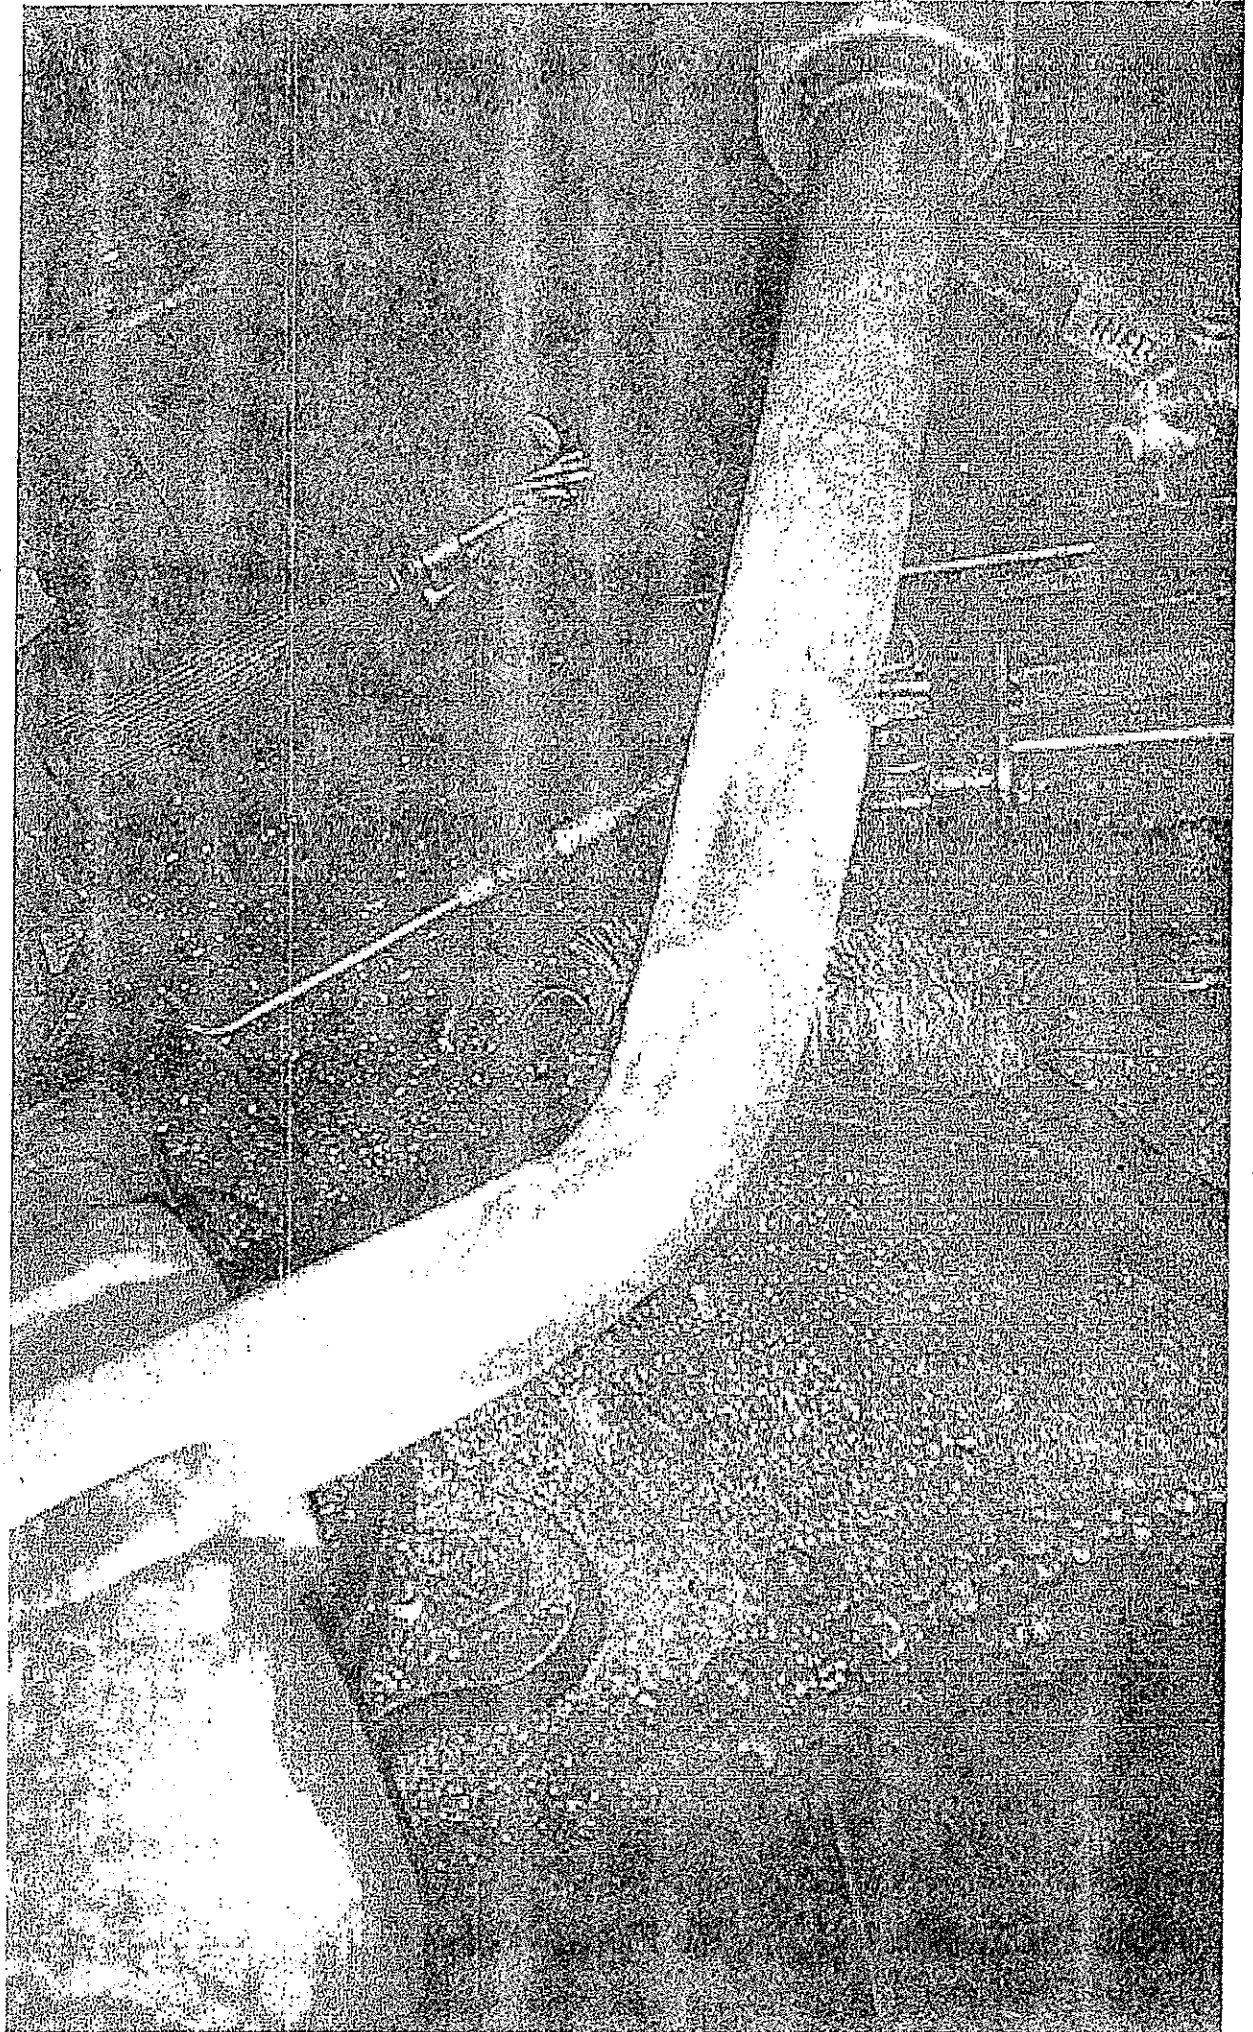

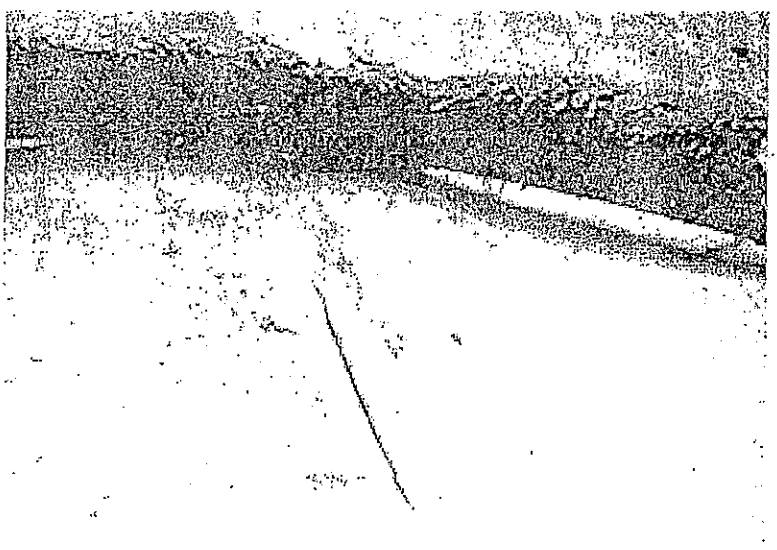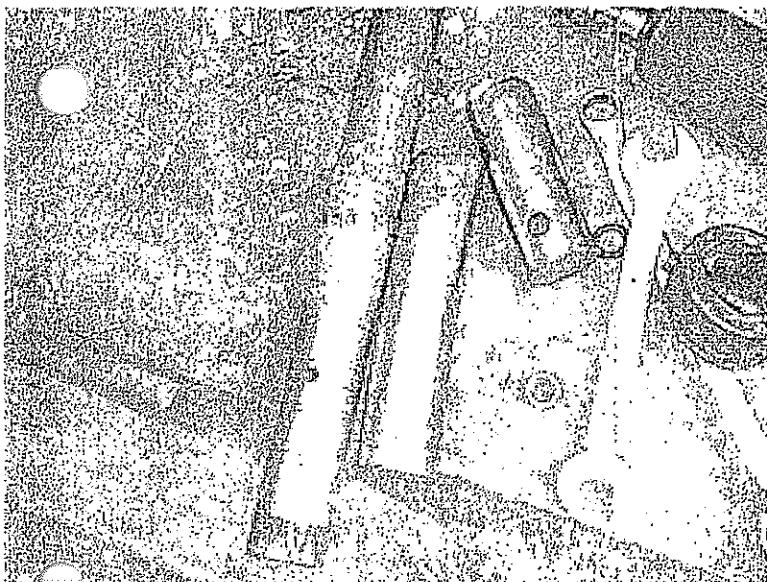


REVISADO


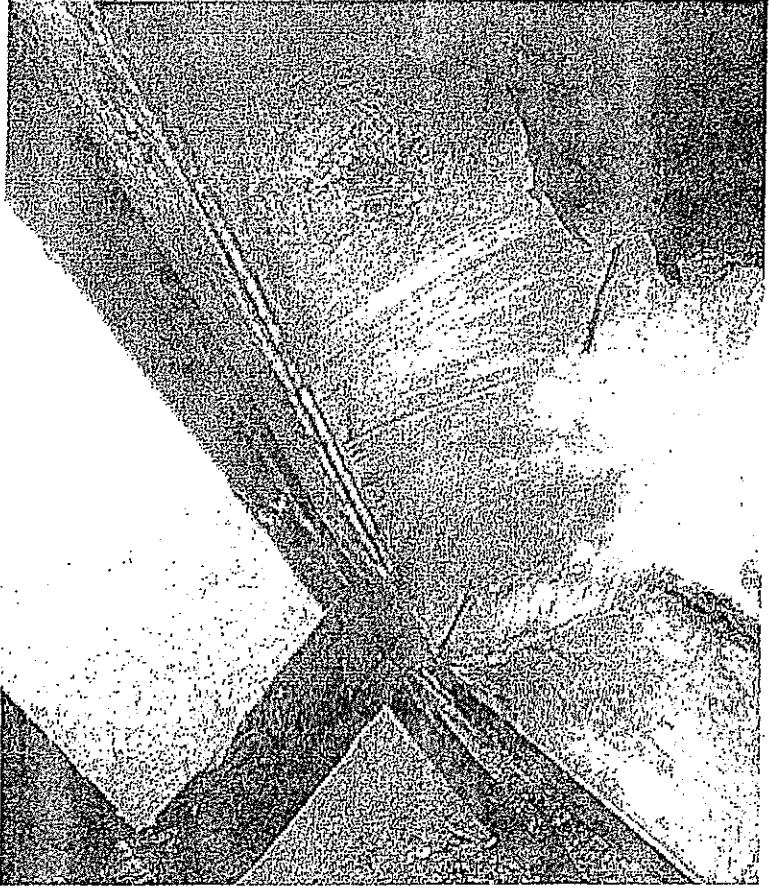



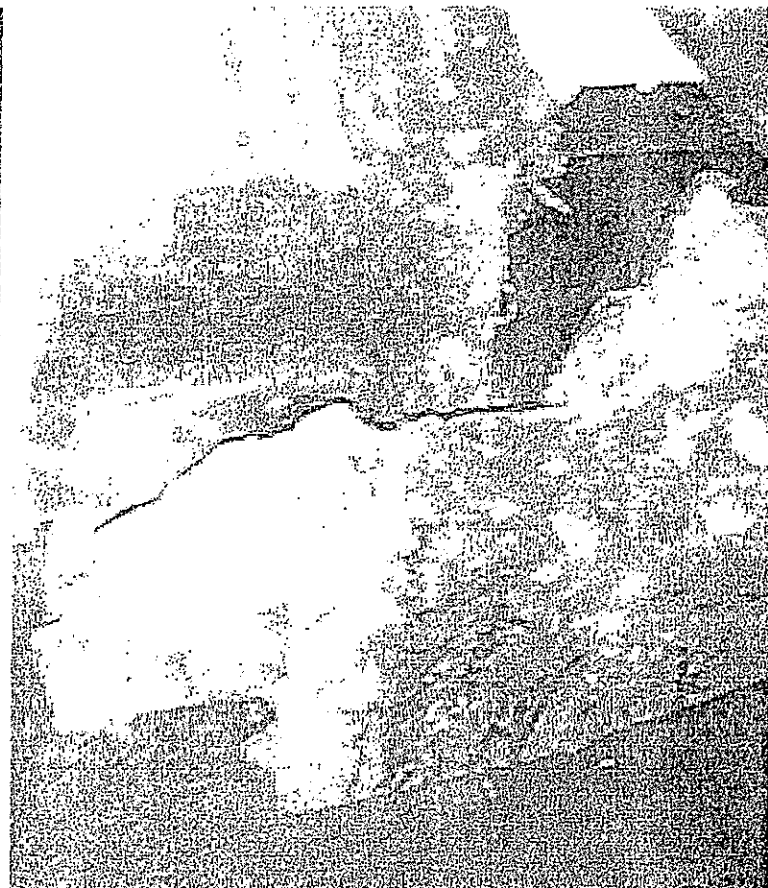




ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVICADO







CHINA CONSULTING
ASSOCIATES
LOS ANGELES
FACILITY

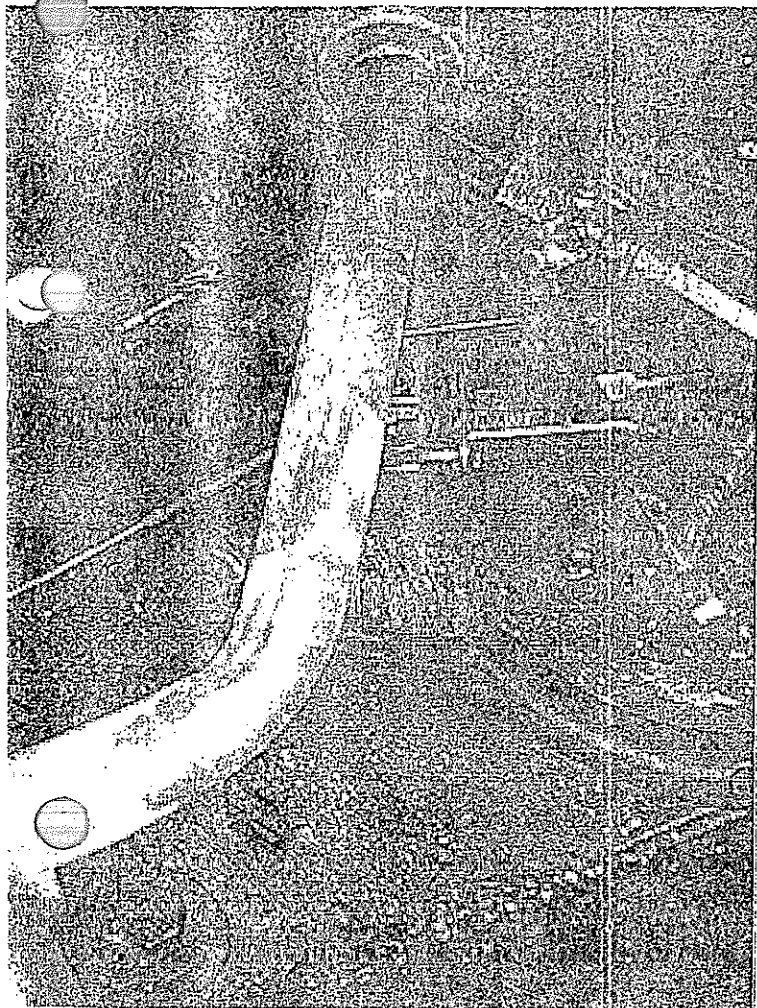
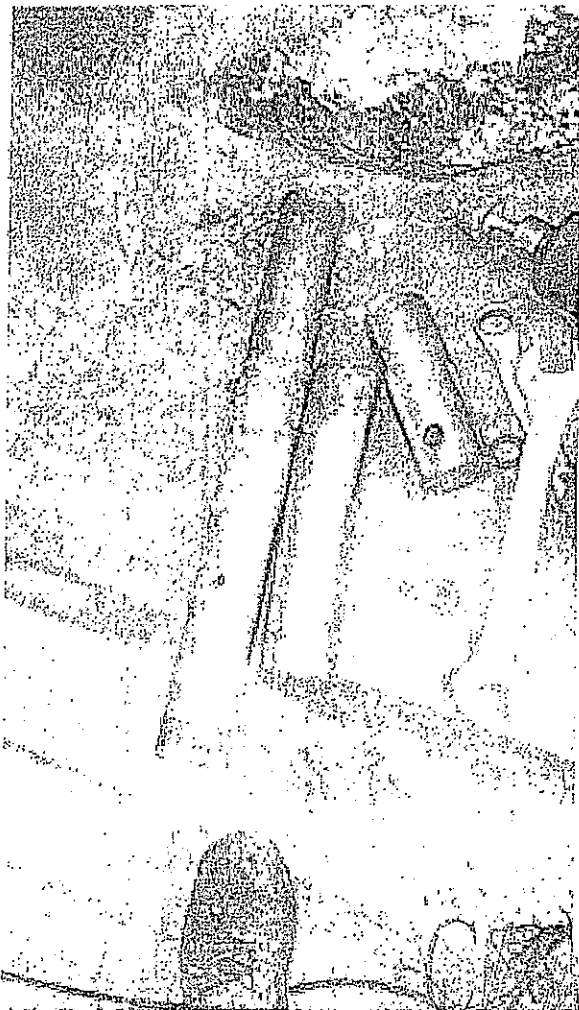
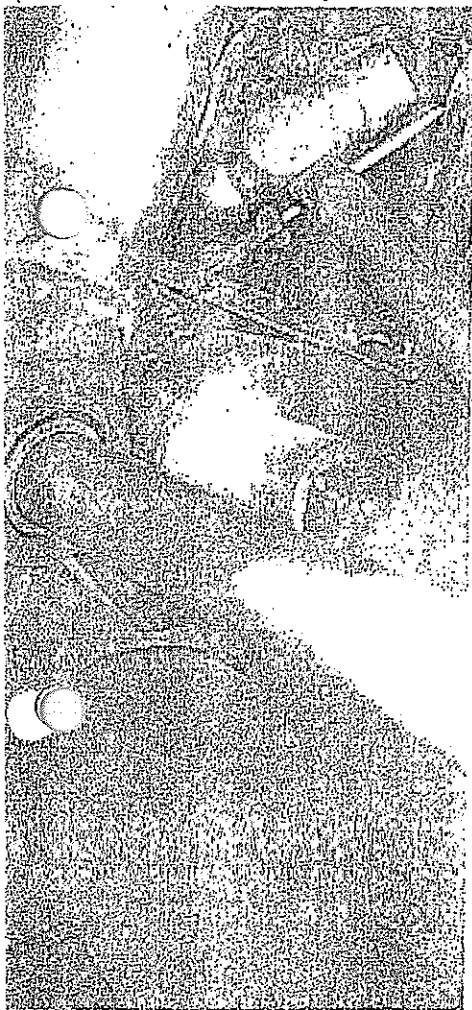









CHANGING
REVISI

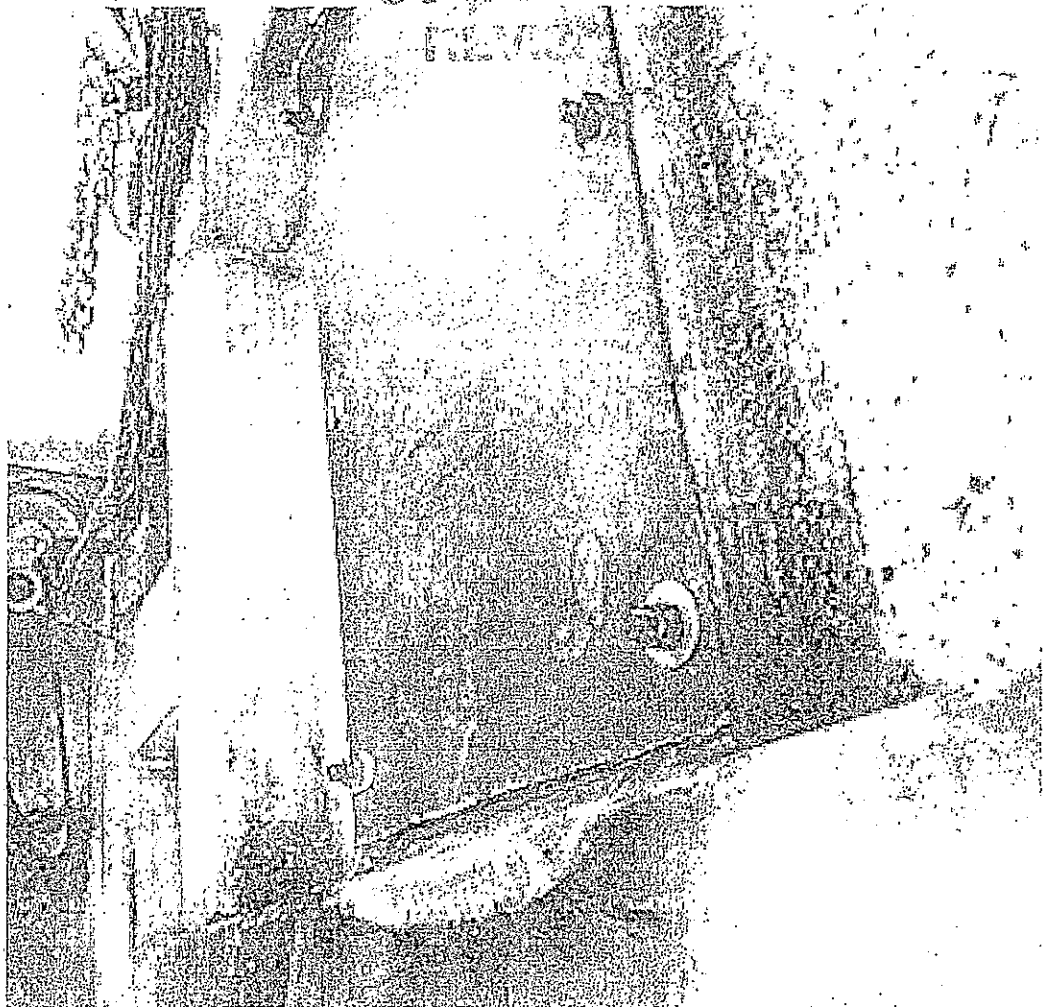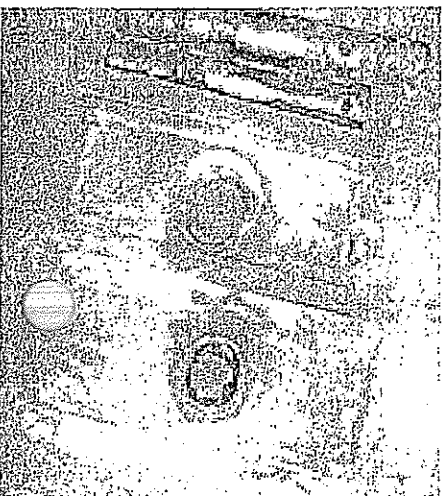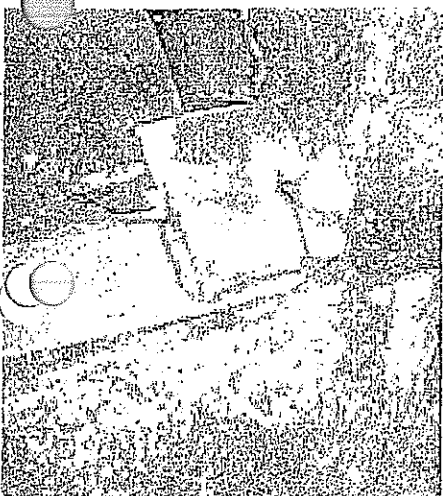








OF LANGHOLIS
REVISADO

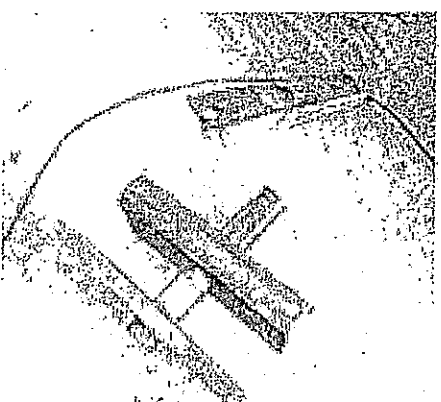




CONSULORRE
ASOCIALES
ANGELOPOLIS

REVISTA

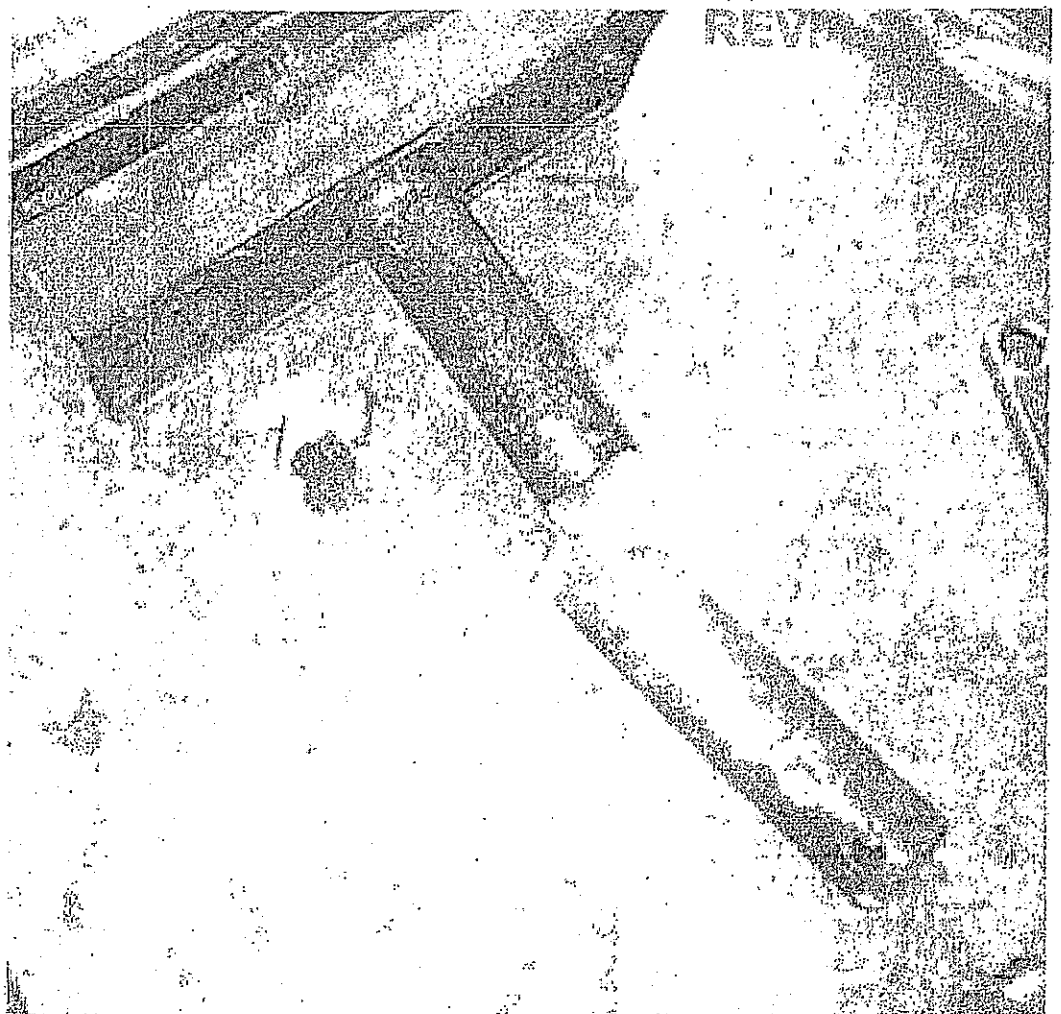

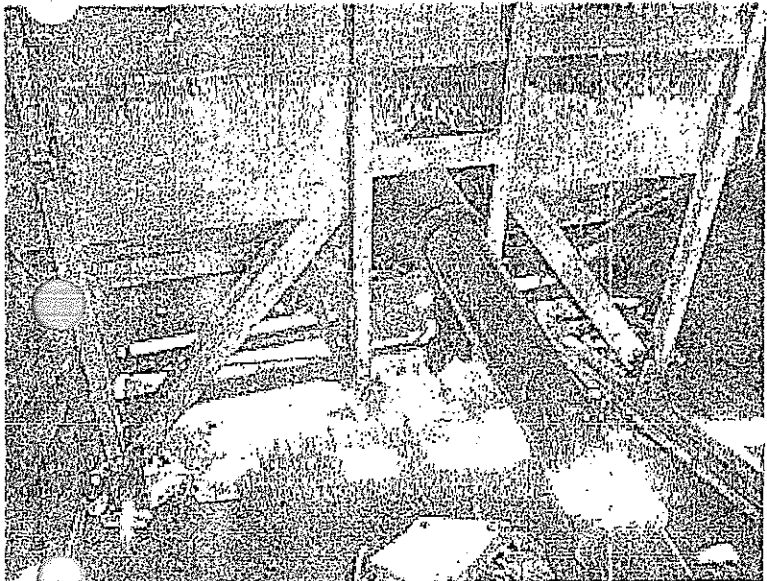

CONSEJEROS
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
DENVER



REVISADO

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



Solo Cargo

Nº Sol 432

Nº Póliza 94

Beneficiario VITAL-LED ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.

Cuenta SCOTIABANK 03604281810

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - SCOTIABANK 03604281810	\$0.00	\$625,942.87	13-mar.-2019
2112124	- CUENTAS BANCARIAS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - VITAL-LED ILUMINACIÓN S.A. DE C.V. - PROVEEDORES	\$625,942.87	\$0.00	

Importe

\$ 625,942.87

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELÓPOLIS
REVISADO



PÓLIZA DIRECTA

tipo Póliza: ORDEN No.Sol: 2361 F. EMISION 13-mar.-2019 F. AFECTACION 13-mar.-2019
No.Poliza: 450 Cheque
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 432 Justificación: 473

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8272461	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -	590,140.63	
8272471	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -	32,043.84	
8272421	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -	3,758.40	
8262471	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -		32,043.84
8262421	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -		3,758.40
8272461	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -		590,140.63
Sumas Iguales:		\$625,942.87	\$625,942.87

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

2019/03/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:18:20

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre****Cuenta de Cargo****Importe****I.V.A.****Moneda****Tipo de envío****Fecha de Aplicación****Fecha de Operación****Instrucción de Pago****R.F.C.****Concepto****Referencia (Numérica)**

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
CHQ-MXN-PURRI A, PU 03604281810 MUNICIPIO
625,942.87
0.00
MXN - PESO MEXICANO
1-MISMO DÍA (SPEI)
2019/03/13
2019/03/13
1-SPEI
MCP850101944
ALUMBRADO
130319

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono****Banco****Tipo de Persona****R.F.C.****Nombre Beneficiario/Razón Social****Comisión****I.V.A. Comisión****Costo de Transmisión****Estado de Operación****Folio****Clave de Rastreo****Mensaje**

012690001121418769
BBVA BANCOMER
2. PERSONA MORAL
VIL180529-GK8
VITALED ILUMINACION SA DE CV
7.00
1.12
0.00
APLICADO
26073405979
2019031340044B36K0000004789217
SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ ÉXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

[001] MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ



SIN-941202-514

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



PÓLIZA DIRECTA

Póliza: ORDEN No.Sol: 2360 F. EMISION 13-mar.-2019 F. AFECTACION 13-mar.-2019
No.Poliza: 449 Cheque
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SOLICITUD NUMERO 432 Justificación: 473

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8262461	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -	590,140.63	
8262471	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -	32,043.84	
8262421	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -	3,758.40	
8252471	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -		32,043.84
8252421	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -		3,758.40
8252461	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -		590,140.63
Sumas Iguales:		\$625,942.87	\$625,942.87

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA: 11/03/2019

MONTO A PAGAR: \$ 625,942.87

PARTICIPACIONES

RECURSOS FISCALES

CONSULTORIA
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

FACTURA (S):

FACTURA	MONTO
16	\$ 625,942.87
TOTAL	625,942.87

FACTURA	MONTO
SUBTOTAL	

CONCEPTO:

ALUMBRADO

PROVEEDOR:

VITALED ILUMINACIÓN, SA DE CV

CUENTA BANCARIA:

CLABE INTERBANCARIA:

012650001121418769

AUTORIZA

MARÍA GUADALUPE DANIEL
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
APLICA

11 MAR 2019

PAGADO

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

13 MAR 2019

PAGADO



PÓLIZA DIRECTA

No Poliza: ORDEN No.Sol: 2359 F. EMISION 13-mar.-2019 F. AFECTACION 13-mar.-2019
No Poliza: 448 Cheque
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 432 Justificación:
473

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8252461	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -	590,140.63	
8252471	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -	32,043.84	
8252421	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -	3,758.40	
8242421	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -		3,758.40
8242471	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -		32,043.84
8252461	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -		590,140.63
Sumas Iguales:		\$625,942.87	\$625,942.87

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 16

Fecha: 05/Mar/2019 15:10:49

Lugar de expedición (C.P.): 72150

Emisor:

VITAL-LED ILUMINACION S.A. DE C.V.

RFC: VIL180529GK8

Tel:

Calle: ZAVALA

No. Ext. 703

No. Int.

O.C.: VL0008

Colonia: Campestre el Paraíso

Ciudad: Puebla

Municipio: Puebla

Estado: Puebla

País: México

C.P.: 72150

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

No. Cuenta:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

RFC: MCP850101944

Tel: 2 85 1162

Calle: Población Municipal

No. Ext. S/N

No. Int.

Colonia: Centro

Ciudad: Cuautlancingo

Municipio: Cuautlancingo

Estado: Puebla

País: México

C.P.: 72700

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
100.00	H87 - Pieza	12111603 - Diodos emisores de luz (led)	LED L100W Luz Blanca (5500°K) AC 80/260V II*66 Fecha: Pedimento: 2461	\$4,785.74	\$0.00	\$479,574.00
42.00	H87 - Pieza	39111813 - Brazos de lámparas	Brazo Curvo 1.50M CED.30 1 1/2" PPM Color Gris Plata Fecha: Pedimento:	\$266.00	\$0.00	\$11,172.00
4.00	H87 - Pieza	30102903 - Postes de metal	Poste Conico Circular 9M para doble percha Color Gris Plara Fecha: Pedimento:	\$4,113.00	\$0.00	\$16,452.00
4.00	H87 - Pieza	30103619 - Elemento de concreto prefabricado	Base de Concreto 60X60X70X45X45 CM C/ANCLA de 3/4 Fecha: Pedimento:	\$810.00	\$0.00	\$3,240.00
4.00	H87 - Pieza	30111800 - Accesorios de iluminación	Caja de Cable THW 80 CAL. 12 Negro Indiana (100mts) Fecha: Pedimento: 2461	\$830.73	\$0.00	\$3,322.92
1500.00	H87 - Pieza	26121600 - Cables eléctricos y accesorios	Cable Neutracon Tipo PSD AAC AL 600V 2+1 CAL. 6 Aereo Viakon Fecha: Pedimento: 2461	\$17.23	\$0.00	\$25,845.00

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO
N. Recta.

Sello digital del CFDI

LH4wYAj7Wq5s7YInnw17Xm124TmY0xq3leCF+MhUoleJQ2U9HzWu2h2aze1hVay837q713Kfcq4+H8dwWlJKCN87118C6YnML3/a80/BHYPY7116z8O7CQebN0yImkySYzdljWYqZTolUxS0oHmzFMq3C9JPC
mmImuYc27aHdqPmJm14C8e2u+H8eXm3M27heVn5YxXFM4Z59ak2PngWbglY2XwXsdKq09FpohS5cZCn23T3HwRux8W4F512M2mpFq1P9hVibg7auScnE8g1CmIQVLFV13Hd75c5EbaU8r0pFmUx5c

**CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS**



PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 2358

F. EMISION 13-mar.-2019

F. AFECTACION 13-mar.-2019

No.Póliza: 447

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA JUSTIFICACIÓN 473

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8242461	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	590,140.63	
8242471	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -	32,043.84	
8242421	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -	3,758.40	
8222461	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO -		590,140.63
8222421	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO -		3,758.40
8222471	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN -		32,043.84

Sumas Iguales:

\$625,942.87

\$625,942.87

CONSULTOR
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1010	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS PRESIDENCIA	473	13/03/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0569
Beneficiario Cheque:

VITAL-LED ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta CLABE)
VIL180529GK8	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40201	COMPRAS DIRECTAS	27-marzo-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NO.	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	1180000205111342421	3F60	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,758.40	
1	1180000205111342471	3F60	2471 - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$32,043.84	
1	1190000305112242461	3F60	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$590,140.63	
51242461			POLIZA CONTABLE No. 103		
51242471			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	590,140.63	0.00
51242421			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,043.84	0.00
2112124 PRO0569			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,758.40	0.00
			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - VITAL-LED ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	625,942.87
			Sumas Iguales:	\$625,942.87	\$625,942.87

MONTO NETO A PAGAR:

\$625,942.87

Cantidad con letra : Seiscientos veinticinco mil novecientos cuarenta y dos pesos 87/100 M. N.
CONCEPTO

COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA RECTA CHOLULA.

ELABORÓ:

CONTADOR GENERAL

JAVIER ORTEGA TORRES

AUTORIZADO POR:

TESORERO MUNICIPAL

JOSE MARIA REYES VARELA

PAGUESE

TESORERÍA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.

2018 - 2021



San Juan Cuautlancingo, Puebla. A 28 de Febrero de 2019.

FOLIO:031

Recibimos del C VITAL LED ILUMINACION S.A. DE C.V. CON RFC: VIL180529GK8 la cantidad de \$2500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de inscripción al padrón de constructores para obra pública que se llevara a cabo en el Municipio de Cuautlancingo Puebla.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE INGRESOS
CUAUTLANCINGO, PUE.

28 FEB 2019
Sello y firma de la tesorería
PAGADO
TESORERÍA MUNICIPAL

CONSULTORES
ASOCIADOS
ANGELOPOLIS
REVISADO
