

Fecha:

No.

Apertura de Bitácora

Siendo las 9.00 hrs del día 26 de Octubre de 2019, reunidos en el lugar que ocupa la Calle Santa Rosa, de la localidad San Juan Cuautlancingo del Municipio de Cuautlancingo, Puebla los Representantes de la Contratante y la Contratista con el fin de Realizar la Apertura de la presente "Bitácora de Obra" de conformidad con el Artículo 63 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma Para el Estado de Puebla.

Nombre de la Obra: Construcción de Pavimento con Concreto H. Oravillo de la Avenida Santa Rosa Entre calle Tlaxcala y Calle San Joaquín de la localidad de San Juan Cuautlancingo Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Localidad: San Juan Cuautlancingo.

No Contrato: Forta - 19 - 20

Importe de Contrato: \$ 3,948,965.10 (Tres Millones Novecientos Cuarenta y ocho mil Novecientos Sesenta y cinco pesos 10/100 M.P.)

Fondo: Promo 33 Fondo Fortamen 2019.

Fecha de Inicio: 26 de Octubre de 2019

Fecha de Terminación: 24 de Diciembre de 2019

Contratista: Constructora Herguin, S.A.P.T. De C.V.

Representante legal: C. José Raúl García Flores

Contratante: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.

Tomando en cuenta la presente bitácora es el instrumento técnico de Control de los Trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el Contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberán registrarse los asuntos importantes que presenten durante la ejecución de la obra.

El Contrato sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

El plazo mínimo para las firmas de los notas de Bitácora será mayor a 3 días hábiles apartir de la fecha en que se asigne la nota y acordando ambos partes que se dan por aceptados los términos de plazo antes señalados.

Por el Contratista

Por la Contratante

Suplente de Obra

Ing. Hector Regilio Hernandez Gonzalez

Residente de Obra


A. G. Castro, Esmeralda Contreras


Fecha:

No.

28 de octubre de 2019
Nota #02


Se informa que se inician con los trabajos de cajeo en el trazo utilizando una retroexcavadora, una motoniveladora y camiones para retirar el material de corte, siguiendo los niveles de corte marcados en proyecto, se inicia el cajeo desde el cadenamiento 0+000 con una excavación aproximada de 80 centímetros y un ancho marcado en proyecto.



Ing. Hector Regino Hernández González
Superintendente de obra.


Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

30 de octubre de 2019
Nota #03

Se informa que se continúa con el cajeo del cadenamiento 0+000 al 0+120 retirando el material con camion de volteo al tipo asignado, la motoniveladora comienza a dar nivel de piso para desplazar granición del cadenamiento 0+000 al 0+060.



Ing. Hector Regino Hernández González
Superintendente de obra.



Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

04 de noviembre de 2019

Nota #04

Se notifica que se continúa con el cajeo de la calle del cadenamiento 0+120 al 0+180 retirando el material producto de excavación con camiones tipo volteo. La motoniveladora continúa con el afino de la sección para el desplante de granición.


Ing. Hector Regino Hernández González
Superintendente de obra.


Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

Fecha:

No. 002

No.

12 de noviembre de 2019

Nota #05

Se informa que la excavación para cajero continúa se comienza a retirar la garnición existente a partir del cadenamiento 0+180 en ambos lados del arroyo retirando la misma y el producto de excavación de cajero por medio de camiones tipo volteo. A partir del cadenamiento 0+195 se encuentran capas de valvulas de agua potable por lo que se procede a su demolición y cubiertas para el paso de la maquinaria se notifica al sistema operador de agua potable.


Ing. Hector Regino Hernández González
Superintendente de obra

Arg. Gustavo Escalante Caselle
Residente de obra.

22 de noviembre de 2019

Nota #06

Se notifica que se comienza con la construcción de garniciones en el cadenamiento 0+000 en la esquina de dicho cadenamiento se cobra en banquetes para dar forma circular a la esquina. Se comienza con la elaboración de concreto hecho en obra con una dosificación de 6.5 botes de arena, 5.5 botes de grava y 2.5 botes de agua para cada bulto de cemento para obtener una resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$. Se coloca el escarpio de la garnición hacia el arroyo y con las medidas como se muestra en la siguiente figura:



Ing. Hector Regino Hernández González
Superintendente de obra.

Arg. Gustavo Escalante Caselle
Residente de obra.

Fecha:


No. 003


No.

14 de noviembre de 2019

Nota # 07

Se informa que se continúa con el cajeo del cadenero 0+240 al 0+340 con el respectivo retiro de garnición existente. Se continúa con la construcción de garnición del cadenero 0+080 al 0+170 en ambos lados del arroyo.



Ing. Hector Regio Hernandez Gonzalez
Superintendente de obra.



Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

15 de noviembre de 2019

Nota # 08

Se notifica que se continúa con el cajeo, retiro de garnición existente y construcción de garnición en el tramo, se cuenta con presencia del laboratorio para tomar muestras del concreto en garnición. Se tomaron 4 muestras de cilindro.


Ing. Hector Regio Hernandez Gonzalez
Superintendente de obra.


Arg. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra.

Fecha:

No.

16 de noviembre de 2019

Nota # 09

Se informa que se comenzó a surtir base hidráulica con material que cumple con las normas vigentes compactado a su 95% P.V.S.M. Se le incorpora agua a la base para obtener su porcentaje de humedad óptimo con p.p.a y nivelando el material con la motorizadora del camión al 0+180.


Ing. Harold Rojas Hernández González
Superintendente de obra



Arq. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra

18 de noviembre de 2019

Nota # 10

Se notifica que se continúa con el suministro de base hidráulica y su hidratación con p.p.a de agua, se concluye el capso y entre de garantía en el tramo, la motorizadora continúa dando nivel de piso y extendiendo la base hidráulica. Se continúa con con la construcción de garantía.


Ing. Harold Rojas Hernández González
Superintendente de obra


Arq. Gustavo Escalante Cuatle
Residente de obra

0005

Fecha:

No.

19 de noviembre de 2019

Nota # 11

Se notifica que el suministro de base hidráulica continúa en el tamo y la construcción de garrafin se colocan niveles en la base para afinar a cada 20 metros se coloca un nivel en cada estación y en nivel al centro marcando el bombeo en la calle de 2". La sección de la calle queda como en la siguiente figura.



~~Ing. Hector Regino Hernández González~~
Superintendente de obra.

~~Arg. Gustavo [Nombre] [Apellido]~~
Residente de obra.

20 de noviembre de 2019

Nota # 12

Se informa que se comienza con el riego de impregnación con petrolizada y emulsión asfáltica tipo ECI-60 se procede posteriormente a posear el riego de impregnación con arena distribuida manualmente a riego sobre la emulsión.

~~Ing. Hector Regino Hernández González~~
Superintendente de obra.

~~Arg. Gustavo [Nombre] [Apellido]~~
Residente de obra.

Fecha:

No.

02 de diciembre de 2019

Nota # 13

Se notifica que se termina de artar base hidráulica en el tramo se realiza riego de impregnación del asfalto 0+200 al 0+400 con emulsión asfáltica tipo EC1-60 y se posterior parea con arena distribuida de forma manual. La motoniveladora continúa preparando la base con el respectivo riego de agua para cumplir con su porcentaje de humedad óptimo del asfalto 0+400 al 0+552.23. Se comienza a surtir concreto premolado con una resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ con un recubrimiento 10 cms ($\pm 2.5 \text{ cms}$) según norma y siendo verificado por laboratorio realizando la prueba de resquebrajamiento y muestreo de cilindros de concreto. Se realiza el colado dividido el arroyo en dos con cimbra metálica y colocando varillas para juntas de $3/8"$ de 90 cm al centro del arroyo y se coloca malla electrosoldada 6-6 10/10 con un recubrimiento de 8 cms y un espesor de 15 cms (traslape) una vez fraguado el concreto se cubre la mitad restante.

Ing. Hector
Supervisor de obraRegino Hernandez Gonzalez
de obraIng. Gustavo
Residente de obraEscalante Cuatle
de obra

... 0007

Fecha:

No.

12 de diciembre de 2019

Nota # 14

Se informa que se termina de preparar el último tramo de bache y se procede a colocar emulsió asfáltica tipo EC-60 y posteriormente se pinta con arena del camión 0+400 al 0+552. Se continúa con el colado de la calle con concreto premixado. Se coloca un acabado de rayado antideslizante y se colocan topes de concreto cada 150 m dejando en los topes 3 espasos de 50 cm en las orillas y al centro para dejar el paso libre al agua.



Ing. Hector Regiro Hernández González
Superintendente de obra

Arg. Gustavo Escobar de Cuatrecasas
Residente de obra.

08 de enero de 2020

Nota # 15

Se continúa con el colado de la calle se procede a levantar los pozos de visita y cajas de agua colocando bridas y tapas de concreto y tapas marco y confinamiento de tuberías respectivamente. y se coloca el concreto después de las tapas y bridas para un colado monolítico.



Ing. Hector Regiro Hernández González
Superintendente de obra

Arg. Gustavo Escobar de Cuatrecasas
Residente de obra.

... 0008


Fecha:

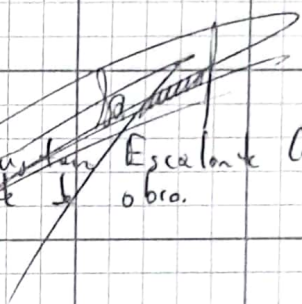
No.

22 de enero de 2020.

Nota #16

Se notifica que se comienza a pintar guarniciones con pintura amarilla tráfico, se pinta raya central de 6 cm al centro del arroyo, pasos peatonales y flechas, las flechas van en color blanco. Se procede a calafatear con junta expansiva en las juntas del concreto hechos a cada 3 m y en pozos de visita así como en cajas de valvulas.


Ing. Hector Regio Hernández González
Superintendente de obra


Arg. Gustavo Escalante Cuatrecasas
Residente de obra.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

000446

Acta de Fallo
FORTA-19-20

0309

Acta de fallo del procedimiento del concurso por Licitación Pública No. **FORTA-19-20**, relativo a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SANTA ROSA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SAN JOAQUÍN."** Ubicada en el Municipio de Cuautlancingo; puebla.

Siendo las 08:00 horas del día 24 de Octubre de 2019, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública para el municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle Carmen numero 10 Colonia Estrellas del Mar, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente acta y dar a conocer el resultado referente al concurso de obra pública N°. **FORTA-19-20**. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla.

La convocante una vez efectuada la evaluación de las proposiciones, hace mención de las razones por la cual su propuesta fue aceptada o desechada, en base al dictamen de fallo presidido por la convocante.

PLEWAN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON, S.A. DE C.V.

Su propuesta es descalificada conforme a lo siguiente:

una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, se descalifica porque resulta ser económicamente menos conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

Una vez hecho el análisis a la propuesta presentada por la empresa, se verifica que cumplió con lo solicitado en las bases para este concurso, por lo que se determina la solvencia legal, técnica y económica, además de ser la propuesta que resulta económicamente más conveniente para el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo; Puebla

Finalmente, con fundamento en el dictamen de fallo, el comité municipal de obra pública del municipio de Cuautlancingo emitió el fallo a favor de: **CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V** Por un monto de **\$3,404,280.26** (Tres millones Cuatrocientos cuatro Mil Doscientos Ochenta Pesos 26/100 M.N.) sin I.V.A. porque resulta solvente ya que reúne los criterios de adjudicación establecidos en las bases correspondientes, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

000447
0340

Acta de Fallo
FORTA-19-20

respectivas, además de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Se notifica a la Persona adjudicada; **CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.** que la firma de contrato se realizara el día 25 de Octubre del presente a las 12:00 horas. En las oficinas del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para el municipio de Cuautlancingo, ubicadas en calle Carmen numero 10 Col. Estrellas del Mar, Cuautlancingo; puebla.

El plazo de ejecución será del día 26 de Octubre de 2019 al 24 de Diciembre de 2019 (60 días naturales) de conformidad con lo estipulado en la cláusula III y XV (fechas estimadas de inicio y terminación) de las bases, así como en la cláusula III y anexo PT 8(plazo de la ejecución) del modelo de contrato.

El comité municipal de obra pública y servicios relacionados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 fracción III segundo párrafo, de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, procederá a dar por escrito a los licitantes restantes las razones por las cuales su proposición no fue ganadora.

Se cierra la presente acta siendo las 08:51 horas del mismo día de su inicio, reunidos en las oficinas del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para el Municipio de Cuautlancingo; Puebla.

Presidenta del comité municipal de obra publica

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez

Secretario Ejecutivo

C. José María Meza Pérez



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

000448

0341

Acta de Fallo
FORTA-19-20

Contralor municipal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

Vocal 1



C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

Vocal 2



C. Edgar Gamboa Cuazitl

Vocal 3



C. Patricia Mendieta Ramos

Empresas participantes

N.º	EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.	C. José Raúl García Flores	
2	PLEWAN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C. María Emilia León Morales	
3	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON, S.A. DE C.V.	C. Juan Miguel Pacheco López	
