

El día de hoy 23 de noviembre del 2021 siendo las 12:00 pm damos apertura a la presente bitácora con la siguiente información.

Control de obra pública W. FISM - 21-09
partido presupuestal FISM 2021

Contrato 04000 Construcciones S.A de C.V.

C. Francisco Pérez Zapata, administrada única

RFC. COW150119TID6


Nombre de la obra: "Construcción de Puentes en adyacencia a la calle Libertad en la localidad de San Jerónimo, municipio de Coahuilango, Pue."

Localidad: San Jerónimo

Nombre de obra FISM-21-09

Monto: \$ 2,151,641.18

También cabe mencionar el nombre del supervisor
Ing. Diego Antonio Sarmiento




Administrador Único

000005

Nota No 1

El día de hoy Martes 23 de noviembre del 2021
 iniciamos en los trabajos de obra y nuclear
 de la calle libertad. en ello efectuamos
 que topografía y col para ello utilizamos
 trazando en algunas de varias partes.
 para tener un lindero derecho sin afectar a los
 habitantes de ese lugar, por lo tanto ya
 delimitado como uno de los linderos de terreno
 mas a los trabajos de excavación para
 delimitar el nivel de este cuadrado para
 ello usaremos retroexcavadora y el camion

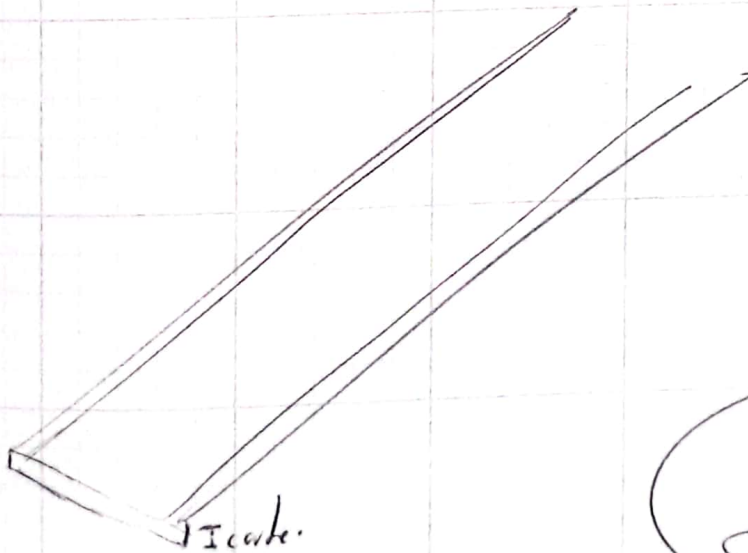

Tercer.

Diego Samuende Morales
 Supervisor



Chimano Poma ranch
 administrador
 Residencia

-000066

Nota N° 2

El día de hoy 26 de noviembre del 2021 con fines con los trabajos de acarreos en las obras de alcantarillado los días anteriores a este rol de trabajo, para el lote de maderamiento 0+150 cuando en este predio de .53 aproximadamente, para el lote maderamen del maderamen de 0+000 al 0+100 de on los lodos se va haciendo la colocación de cheros maderamen para los garraones y posteriormente se cubren con concreto premezclado y al mismo tiempo con ladrillos por sobre el cur de maderamen.



Diego Sánchez Mora
Supervisor



Chacoma Poma
Resoluto

000067

Nota No 3

30 4 12 3

9

El día de hoy 30 de noviembre del 2021
hice el repaso de las tareas a cargo
de hoy, para ello cabe mencionar las tareas
realizadas el día de hoy, ya se acabó de recabar
la información de 01000 a 01364, se pasó todo el
material sobrante y después se pasó la meta mensual
para en mejor manera para ello tener la ayuda
del supervisor por parte del asentamiento y hoy
vamos a empezar con las tareas de colocación de
la subbase como lo recomendamos al laboratorio
vamos a empezar a toda del cadenero inicial a /
hoy, para ello cabe mencionar que las ganancias
ya están cubiertas solo hay hacer el desembolso
del mismo


Diego Sumarli Merales
Gerente

Chirico Pina Zapata
Revisor

• 000063

Nota No 4

El día de hoy viernes 3 de diciembre estamos
 en los trabajos o reates, cabe mencionar los trabajos
 realizados anteriormente que por tardanza del mismo
 se empezó con la compactación con maquinaria para
 ello se va haciendo por zonas para tener un
 buen resultado para ello hoy terminamos la
 parte del separador del asentamiento de cubrimiento
 dos en horas a este note de bitaca terminamos
 en momentos de en vez de pero al final terminamos
 un buen resultado y cubrimiento en los trabajos
 por lo que hoy terminamos la parte del bacheo
 la cual va a comenzar la compactación
 y tiene un excelente resultado de 96.



Diego Sarmiento Meléndez
 Supervisor



Checco Pineda Zapata
 Director

0000069

Nota N°5

El día de hoy 6 de diciembre del 2011
empezamos con los trabajos realizados con
menciona los trabajos de los días anteriores.
para ello el día de hoy llegó el material
(base) para que oportunamente empezemos
a hacer el revestimiento para el final
finco en buen resultado por otro lado
se a hacer un espesa de 20 cm con
finco la parte del superior, por parte del
agua corriente

Arq. Diego D. Sarmiento
Supervisor

C. Roman Perez
Academista

000070

Nota N°6

El día de hoy 10 de diciembre del 2021
 seguimos con los trabajos de derribo de los ⁰⁰⁰⁰⁹¹
 lo que fueron los días (6, 7, 8, 9, 10) para
 de hoy acabamos lo que fue todo lo consiguiente
 para de nuevo la visita del laboratorio y
 del supervisor para verificar el nivel de consumo
 de la misma la cual nos dio un resultado de
 45% de consumo para el entonces vamos a
 comenzar los trabajos de colocación de aduanas
 entre otros trabajos a realizar pendientes

Arq. Diego Sarmiento Morales
 Supervisor

C. Francisco Ruiz Tapia
 Presidente

..000071

Nota No 7

El día de hoy 14 de diciembre del 2021
realizamos con los trabajos correspondientes
entre ellos uno de empezar con la colocación
de adobe para de suaves la vista del
laboratorio correspondiente para sacar los muros
de resistencia del mismo, por otro punto
empezamos con la remodelación de pisos de azulejo
para que se los coloque igual y faga el
revestido del mismo por el punto interior, cabe
también mencionar que en día anterior empezamos
con el corte de dos arboles que afectaban los
trabajos de la obra.

000495


Ing. Diego A. Samiñata Morales
Supervisor

Amos Pérez Zapata
Rendier


000072

Nota N° 8

El día de hoy 18 de diciembre del 2021 según
 a los hechos correspondientes los cuales la realidad ⁰⁰⁰⁰⁹⁶
 de para que el día de hoy concluimos por otro
 lado que se acaba de hacer el adeno para
 este estero con el dentista linschotenol y hacer así
 que este finis el día de hoy la cuenta del
 expenses y del laboratorio para sacar muestra del
 dentellon una vez sacado la muestra restar
 continuara con la antes mencionada y en el
 poro de la calle, todos los trabajos se van
 haciendo de la mejor manera con la herramienta correspondiente
 y el personal adecuado para hacer una correcta ejecución



Arq. Diego Sarmiento Morales
 Supervisor




Obinaso Peter Zapi
 Presidente

• 000073

Nota N° 9

El día de hoy 21 de diciembre del 2021 según 437
con los trabajos correspondientes para este trabajo la
visita del supervisor para hacer un recorrido por la
obra (adecuamiento de la calle Libertad) para
conocer los trabajos realizados, una vez haciendo
la supervisión continuamos con nuestros trabajos de
limpieza general y lo que es la colocación de pintura
en guarniciones y flechas como lo marca en el expediente
que nos dio el ayuntamiento de coahuila.



Eng. Diego Sami Ortiz Meralos
Supervisor



C. Franco Perez Zapich
Presidente

Nota N° 9

El día de hoy 22 de diciembre del 2021 siendo las 12:00 Pm cada uno con los trabajos correspondientes de la obra denominada (Abastecimiento de la calle Urbana) para este fin se reunió la junta de algunas autoridades del ayuntamiento de Cuautlan para dar un recuento de la obra para analizar los trabajos realizados una vez verificados y dando un cierre es decir damos por terminados los trabajos y damos cierre a la presente bitácora.

Arq. Diego S. Sarmiento Morales
Supervisor

C. Francisco Ruiz Zambrano
Residente

000075

Dirección de Obras Públicas

000361

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. FISM-21-09
Municipio: Cuaulancingo, Puebla.
Comunidad: Sanctorum
Obra: "Construcción de Pavimento con Adoquín en calle Libertad, en la Localidad de Sanctorum, Municipio de Cuaulancingo, Pue."
No. Obra: FISM-21-09

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-21-09, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuaulancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de Pavimento con Adoquín en calle Libertad, en la Localidad de Sanctorum, Municipio de Cuaulancingo, Pue.", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuaulancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuaulancingo, Puebla, siendo las 16:30 horas, del día 19 de Noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-21-09, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de Pavimento con Adoquín en calle Libertad, en la Localidad de Sanctorum, Municipio de Cuaulancingo, Pue.", ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuaulancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000267

Dirección de Obras Públicas

000362

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **0+000 Construcciones S.A de C.V. Representante Legal C. Francisco Pérez Zapata** quien presentó una propuesta \$ 2,151,661.18 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 18/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar la C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 16:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000268



000363

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.

C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024

Mtra. Sandra María Tlague Gómez.

C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2

C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

000269






Dirección de Obras Públicas

000364

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal o Apoderado	
2	Mantra Corporativos y Proyectos S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal o Apoderado	
3	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
4	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
5	Héctor Alejandro Iglesias Persona Física con Actividad Empresarial.	

000270



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-21-09

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUE."

OBRA No: FISM-21-09

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA: 16:30 HRS

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Creciente Construcciones S.A de C.V.	Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
Mantra Corporativos y Proyectos S.A. de C.V.	C. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
C. Verónica Pérez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial.	
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	C. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
C. Héctor Alejandro Iglesias	Persona Física con Actividad Empresarial.	

000365

000271
