

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 20 / OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°

EN LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNEN EN EL LUGAR DE LA OBRA "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO ZAHUAPAN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE GUERRERO, Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y CALLE RIO ZAHUAPAN" EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUATZANCO, PUEBLA CON EL MOTIVO DE REALIZAR LA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, POR EL CONTRATISTA "CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. DANIEL IVAN LORES GAZCA. Y POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CUATZANCO EL C. ARG. HILARIO SANCHEZ MEDRANO, TODO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63 PARRAFO SEGUNDO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ARTICULO FRACCION I 22 FRACCION V, 84, 85, 86 Y 87 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, ASI COMO DE LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS TIEMPO DETERMINADO, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO ZAHUAPAN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE GUERRERO, Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y CALLE RIO ZAHUAPAN"

DE CONTRATO: FISM-22-08

MONTE DEL CONTRATO: 365,488.57 (TRESCIENTOS SESENTA CINCO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.). CON IVA

RECURSOS: FISM 2022

PERIODO DE EJECUCION: 20 DE OCTUBRE DE 2022 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

NUMERO DE OBRA: FISM-22-08

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CRECIENTE CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

Elaborado por:

Recibido por:

000084

Fecha 20 / OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL IVÁN FLORES GAZCA


A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA PRESENTE BITÁCORA.

SANDRA MARIA TRIQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.

ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO.
SUPERVISOR DE OBRA.

DANIEL IVÁN FLORES GAZCA.
REPRESENTANTE LEGAL
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ARQ. MARCELO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
QUAUTLANCINGO.
PUE. C.P. 72700

000085

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 20 / OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA NO 1

FISM - 22-08

CON FECHA MARCADA CON EL DIA 20 DE OCTUBRE Y CON FORME A LOS ACUERDOS REALIZADOS EN LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE ALCANTARILLA SANITARIO EN CALLE RIO ZAHUAPAN, ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE GUERRERO, Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y CALLE RIO ZAHUAPAN" SE DA A APERTURA DE NOTAS DE ESTA BITACORA.

ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE LA OBRA

ARQ. MARCIANO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

20 / OCT / 2022

NOTA 2

FISM - 22-08

SE INICIAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TRAZO SOBRE LA CALLE RIO BALSAS PARA POSTERIOR- MENTE CONTINUAR CON LA EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO MECANICO, TAMBIEN SE MARCA EL AREA DE CORTE EN CONCRETO.

ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. MARCIANO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

ANNNNE


Fecha 21 / OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°

- NOTA N° 3

FISM - 22-08

EN ESTA FECHA SE SIGUE CON EL TRAZO Y NIVELACION PARA LA EXCAVACION DE ZAJAS POR MEDIOS MECANICOS, SE COMIENZA CON EL CORTE Y TRAZO EN CONCRETO, SE COMIENZAN TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.90 METROS.

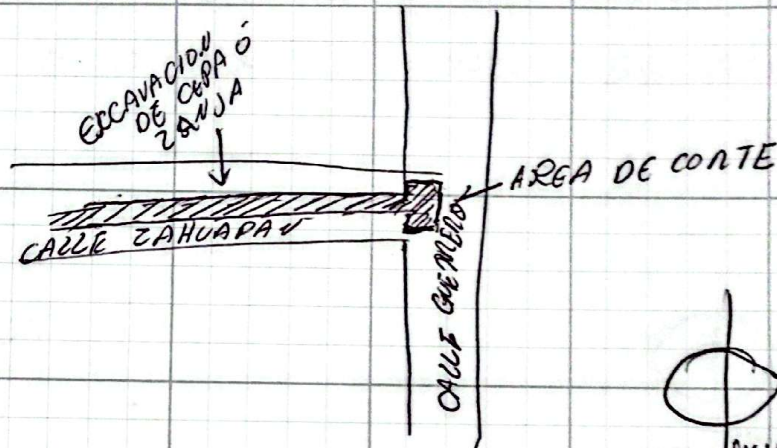

ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE LA OBRA.

ARQ. NARCISO PEREZ
CASTILLO

Elaborado por:

Recibido por:

nnnnn

Fecha 22 / OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°


NOTA NO 4

FISM - 22 - OB

EN ESTE DIA SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE ZANJAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ZAHUAPAN Y SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PLANTILLA ORIZONADA AL 85% PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE TOMA MUESTRA DE LA MISMA POR EL LABORATORIO, PARA POSTERIORMENTE COMENZAR CON EL TENDIDO DE TUBO, ASI MISMO SE EXCAVA EL AREA DONDE SERAN COLOCADO LOS POZOS DE VISITA.



ARQ. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE LA OBRA



ARQ. MARCIANO PÉREZ
CASTILLO

Elaborado por:

Recibido por:

nnnn88

Fecha 24/OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA NO 5


FISM - 22-08

SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PLANTILLA
NIVELACION Y COMPACTACION AL 85% CON PRODUC-

TO DE LA EXCAVACION, SE COMIENZA CON EL
TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD TIPO N-12, CON INTERIOR LISO, DE 12"
DE DIAMETRO C, CAMPANA 8 EMPAQUES.,

SE COMIENZA CON EL ACOSTILLAMIENTO DEL TUBO CON
MATERIAZ PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90% DE
COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR

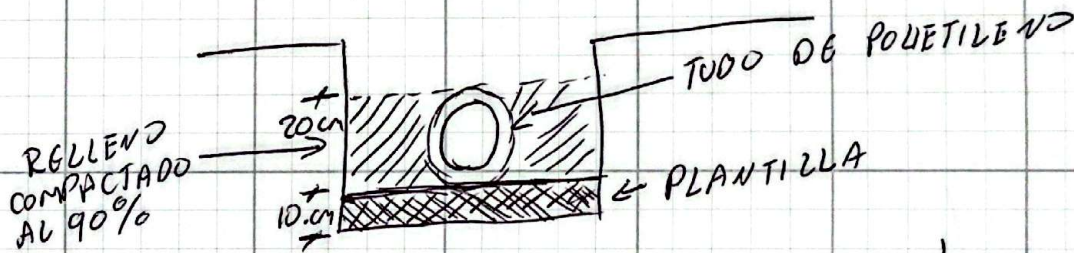

ARQ. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE LA OBRA

ARQ. MARCELO PÉREZ
CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000009


Fecha 26 / OCT / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 6

FISM - 22-08

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE ZANJAS Y DE POZOS DE VISITA CON UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA ENTRE LOS 1.70 m. A LOS 1.90 m. TAMBIEN SE COMIENZAN LOS POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MORTERO HECHO EN OBRA, CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C 210 kg/cm² CON UNA BASE APROXIMADA DE 2.10 m DE ANCHO EN LA BASE Y 1.00 m EN LA CORONA.



R. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE LA OBRA



ARQ. MARCIANO PEREZ
CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

Año 2022

Fecha 28/OCT/2022

Folio N° /Anexo N°


NOTA NO 7

FISM-22-08

SE COMIENZAN TRABAJOS DE CARGA Y
ACARREOS DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
SE CONTINUA CON EL ARMADO DE POZOS DE
VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO PEGADO
CON MONTERO HECHO EN OBRA, TAMBIEN SE
COMIENZA CON EL AFINADO INTERIOR DEL
POZO, Y SE TOMA MUESTRA DE PLANTILLAS Y
RELLENO DE ZANJAS POR EL LABORATORIO,
SE CONTINUA CON EL RELLENO COMPACTADO
AL 90% PRODUCTO DE LA EXCAVACION.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANDO PEREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000091

Fecha 30 / OCT / 2022

FISM-27-08

NOTA NO 8

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON EL PRIMER TRAMO DEL DRENAJE UBICADO SOBRE LA CALLE BALSAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ZAHUAPAN Y SE COMIENZA CON EL TRAMO UBICADO SOBRE LA CALLE ZAHUAPAN, SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TRAZO SOBRE LA CALLE ZAHUAPAN, Y SE COLOCAN LOS BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA SOBRE LOS POZOS DE VISITA UBICADOS SOBRE LA CALLE RIO BALSAS.



R. HIRARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PEREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000002

Fecha 03/NOV. / 2022

Folio N° / Anexo N°


NOTA N° 9

FISM-22-08

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJAS EN LA CALLE ZAHUAPAN A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.70 M. DE ALTURA, SE COMIENZA EL TRAZO DE LAS (~~FOMAS~~) DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE LA CALLE RIO BALSAS, PARA LA EXCAVACION SE UTILIZA MAQUINARIA Y SE EXCAVAN CEPAS DE PROXIMADAMENTE 300M DE LONGITUD Y SE DETALLAN A MANO POR LA MANIOBRABILIDAD, SE COLOCA PLANTILLA PARA LA COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE "6 PARA LAS DESCARGAS, SE COMIENZA CON EL ACOSTILLAMIENTO DE LOS TUBOS DE DESCARGA Y SE COMPACTAN AL 90% CON UN ESPESOR DE 20 CM POR CAPA.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PÉREZ
CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000093


Fecha 05 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°


NOTA NO 10

FISM-22-08

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.70 M DE ALTURA Y SE CONTINUAN LOS TRABAJO DE COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO LA EXCAVACION PARA LOS POZOS DE VISITA SOBRE LA CALLE ZAHUAPAN, SE REPELLAN LOS POZOS DEL TRAMO ENTRE CALLE RIO GRISALBA Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN, SE COLOCA PLANTILLA COMPACTADA AL 85% CON UN ESPESOR DE 10 CM, Y SE COLOCA TUBO SANITARIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIAMETRO, SE COMIENZA CON EL ACOSTILLAMIENTO DEL TUBO Y SE COMPACTA EN CAPAS DE 20 CM AL 90% CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.



ING. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PEREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000094

Fecha 09 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 11

FISM-72-08

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE ARMADO DE
POZOS DE VISITA EN EL TRAMO DE LA CALLE
RIO ZAHUAPAN, SE CONTINUA CON LA INSTALACION
DE DESCARGAS SANITARIAS, Y SE RETIRAN CON
LA MAQUINARIA EL DESPERDICIO PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, SE REALIZAN PRUEBAS DE LABORATORIO
PARA PLANTILLA Y RELLENO, SE REALIZAN TRABAJOS
DE RELLENO COMPACTADO AL 90% PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.



DR. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. ARMANDO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:


Recibido por:

000095


Fecha 13 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 12
SE COMIENZA CON EL TRAZO EN PRIVADA RIO
CAHUAPAN PARA LA EXCAVACION E INSTALACION DE
TUBO SANITARIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE INTERIOR LISO DE 8" DE DIAMETRO, SE CONTINUA
CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE COLOCAN
BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA
RESISTENCIA.



DR. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000296

Fecha 15 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°


COTA NO 13

FISM-22-08

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON INTERIOR 2150, SE COMIENZA EL ACOSTILLAMIENTO DEL TUBO EN CAPAS NO MAYORES A 20 cm, COMPACTADOS AL 90% EN PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y SE COMIENZA CON LA INSTALACION DE POZO DE VISITA EN PRIVADA EN ZAHUAPAN.



R. HILARIO SÁNCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

000297

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 16 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA NO 14

FISM-22-08

CON ESTA FECHA SE ELABORAN LOS ULTIMOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y SE TERMINAN DE COLOCAR LAS ULTIMAS DESCARGAS SANITARIAS, SE COLOCA BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA EN PRIVADA RIO ZAHUAPAN, SE DETALLAN LOS BROCALES INSTALADOS, Y SE REPARA Y SE CUELA CONCRETO F'C 250 KG/CM², EN TOTAL SE INSTALAN 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS.



DR. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQ. MARCIANO PÉREZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

000098


Fecha 17 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°


OTA NO 15

FISM-22-08

SE COMIENZA CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA
Y ACARREOS PARA LA ENTREGA DE OBRA CONCLUYENDO
CON LOS TRABAJOS DE OBRA.



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PEREZ CASTILLO


17 / NOV / 2022

FISM-22-08

EN ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS Y
SE CIERRAN LAS NOTAS Y BITÁCORA DE OBRA
FIRMANDO Y ACEPTANDO LA ENTREGA DE LA MISMA
POR EL SUPERVISOR DE OBRA HILARIO SANCHEZ MEDRANO
POR EL RESIDENTE DE OBRA ARQ. MARCIANO PÉREZ
CASTILLO



ARQ. HILARIO SANCHEZ MEDRANO
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. MARCIANO PÉREZ
CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

Recibido por:

nnnnag

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A DIRECTA

Licitación No.

FISM-22-08

Municipio:

Cuatlancingo, Puebla.

Comunidad:

Sanctorum

Obra:

"Ampliación de alcantarillado sanitario en calle Rio Zahuapan entre calle Rio Balsas y calle Guerrero; y privada rio Zahuapan entre casa y calle Rio Zahuapan".

No. Obra:

FISM-22-08

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-08, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de alcantarillado sanitario en calle Rio Zahuapan entre calle Rio Balsas y calle Guerrero; y privada rio Zahuapan entre casa y calle Rio Zahuapan", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuatlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 18 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-08, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de alcantarillado sanitario en calle Rio Zahuapan entre calle Rio Balsas y calle Guerrero; y privada rio Zahuapan entre casa y calle Rio Zahuapan", ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuatlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso.

000191

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Representante Legal Daniel Iván Flores Garza, quien presentó una propuesta \$365,488.57 (Trescientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochoenta y Ocho Pesos 57/100) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar, dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta. _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

000192

Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.



C. Filomeno Samiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

000193

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	

000194



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-22-08


OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO ZAHUAPAN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE GUERRERO, Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y CALLE RIO ZAHUAPAN. DE CUAUTLANCINGO"

OBRA N°: FISM-22-08
HORA: 09:00 HRS

FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2022

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Garza	

000195
