

Fecha 20/10 /2022

Folio N° /Anexo N°

Dependencia: Dirección de Obras Públicas del
H. Ayuntamiento de Cuautlaningo, Pue.

Nombre de la empresa: VS Proyectos y Construcciones

Representante legal: Arq. Jorge Villa Santiago


Obra: Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en privada sin nombre, entre calle el Carmen y fondo de privada, en la localidad de Sanctorum del municipio de San Juan Cuautlaningo en el estado de Puebla.


Inicio de obra: 20 Octubre del 2022


Fin de obra: 18 Noviembre 2022.

Monto contratado de la obra: \$267,892.23 (Doscientos sesenta y siete mil, ochocientos noventa y dos pesos con veintitres centavos M.N.)




Por el municipio
Hilario Sanchez
edrano
Supervisor de obra


Por el municipio
Lic. Sandra Maria
Tlague Gomez
Div. de Obras publicas


Por el contratista
Arq. Jorge
Villa Santiago

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 20/10/2022

OBRA DE OBRA

000075

Folio N° /Anexo N°

Nota 1

FIMS-22-14

Con fecha marcada con el día 20 de Octubre del año 2022 se apertura esta bitacora de obra.

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

Arq. Jorge Villa Santiago

Nota 2

20/10/2022

FISM-22-14

Con esta fecha damos inicio a los trabajos de la obra denominada "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en privada sin nombre, entre calle el Carmen y fondo de privada, en la localidad de Sanctorum del municipio de San Juan Cautlancingo en el estado de Pue." Se inicia con revisión de trazo y nivelación de bancos de nivel.

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

Arq. Jorge Villa Santiago

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 21 / 10 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota 3

FISM-22-14

Con esta fecha se comienzan los trabajos de limpieza y trazo del área de trabajo, así como con la ruptura y demolición de adoquero y posteriormente iniciar los trabajos de excavación.



Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

@villarod_arquitectos

 Arq. Jorge Villa Santiago R.C. VISJ-811222-151


Arq. Jorge Villa Santiago

Nota 4

FISM-22-14

22/10/2022

Se inician los trabajos de excavación en zanjas para introducción de tubo de drenaje sanitario, siguiendo el trazo y la nivelación correspondiente al tramo la privada Sin Nombre, con pendiente a la red ubicada en la calle Urangu.



Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

@villarod_arquitectos

 Arq. Jorge Villa Santiago R.C. VISJ-811222-151

Arq. Jorge Villa Santiago

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 24 / 10 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota 5

FISM-22-14

Con esta fecha se continuan los trabajos de excavación para recibir tubo sanitario, se comienzan las excavaciones de pozos de visita, y se realiza la colocación de plantilla apisonada al 85% con material de banco

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

Arq. Jorge Villa Santiago

25/10/2022

Nota 6

FISM-22-14

Con esta fecha se continuan los trabajos para el tendido de tubo sanitario corrugado de polietileno de alta densidad, se acostilla el tubo en capas de 20 cm apisonado compactado al 90% con material de banco, se realizan trabajos de relleno en capas no mayores a 20 cm compactado al 90% producto de la excavación

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

Arq. Jorge Villa Santiago

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 26 / 10 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota 7

FISM-22-14

En esta fecha la supervisión revisa avances de la obra, se continua con el repellado interior de los pozos de visita, se comienza con el trazo y la excavación de las descargas domiciliarias, se terminan algunos detalles pendientes.

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas.

Arq. Jorge Villa Santiago

29/10/2022

Nota 8

FISM-22-14

En esta fecha ya se han concluido la construcción de los pozos de visita, asimismo ya se colocó ambos brocales, y se realizan trabajos de construcción de adobe en color natural.

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor de Obras Públicas

Arq. Jorge Villa Santiago

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 03/11/2022

Folio N° / Anexo N°


Nota 9
Con esta fecha se suministran la valvula de compresión, así mismo los tornillos con cabeza, y se comienzan con los preparativos para la instalación del marco con tapa de fierro fundido.



Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Publicas


Arq. Jorge Villa Santiago

Fecha 10/11/2022 Nota 10 FISM-22-14

Con esta fecha se realizan los trabajos de relleno en zanjas, asimismo se continuan los trabajos de la construcción de adocreto en los tramos estantes.


Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Publicas


Arq. Jorge Villa Santiago

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 17 / 11 / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota II

Con esta fecha se realizan los trabajos de limpieza de obra, así mismo se revisan los componentes y se da por terminada la obra.

Acordados los conceptos y ejecutados en su totalidad se concluyen las notas de esta bitacora de obra y se da cierre de la misma, con fecha de 17/11/202.

Arq. Hilario Sanchez Medrano
Supervisor Obras Públicas

Arq. Jorge Villa Santiago

Elaborado por:

Recibido por:

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A DIRECTA

Licitación No. FISM-22-14
Municipio: Cauatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cauatlancingo
Obra: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en privada sin nombre, entre calle el Carmen y fondo de privada, en la localidad de sanctorum del municipio de San Juan Cauatlancingo en el estado de Puebla".
No. Obra: FISM-22-14

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FISM-22-14, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cauatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en privada sin nombre, entre calle el Carmen y fondo de privada, en la localidad de sanctorum del municipio de San Juan Cauatlancingo en el estado de Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cauatlancingo, del municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cauatlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 17 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FISM-22-14, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de drenaje sanitario y red de agua potable en privada sin nombre, entre calle el Carmen y fondo de privada, en la localidad de sanctorum del municipio de San Juan Cauatlancingo en el estado de Puebla". ubicada en la localidad de San Juan Cauatlancingo, municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas


concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: JORGE VILLA SANTIAGO Representante Legal Jorge Villa Santiago, quien presentó una propuesta \$ de \$ 267,892.23 (Doscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 23/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Filomeno Sarmiento Torres
Regidor de Obras.

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cautlancingo, Puebla 2021 - 2024


Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

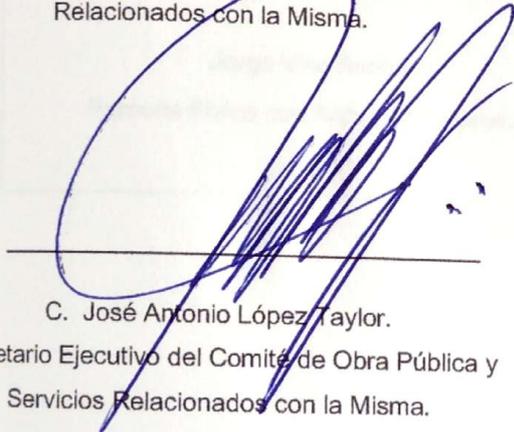

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.




Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Jorge Villa Santiago Persona Física con Actividad Empresarial	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICTACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FSM-22-14
OBRA: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE EL CARMEN Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA".
OBRA No: FSM-22-14
FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2022
HORA: 13:00 HRS
LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
JORGE VILLA SANTIAGO	Jorge Villa Santiago	
