

Dirección de Obras Públicas

000145

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS

Número de Licitación: FORTA-22-23
Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la calle vecinal entre calle calvario a puente vehicular en la localidad de Sanctorum"
Municipio: Cuautilancingo, Puebla.
Localidad: Sanctorum
No. De Obra: FORTA-22-23

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-23, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautilancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la calle vecinal entre calle calvario a puente vehicular en la localidad de Sanctorum" ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuautilancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautilancingo, Puebla, siendo las 09:00 horas, del día 16 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-23, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la calle vecinal entre calle calvario a puente vehicular en la localidad de Sanctorum" ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautilancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000145

Dirección de Obras Públicas

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V. Representante Legal Gustavo Carrillo Chávez quien presentó una propuesta \$1,579,860.55 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 55/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----


Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 09:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Dirección de Obras Públicas

000147

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.




C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.




Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.




C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I




C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.






C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas

000149

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V. Gustavo Carrillo Chávez Representante Legal	
2	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial	
3	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
4	0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
5	NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V. Ana Angie Rufrancos Moreira Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO
2021 - 2024



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-23



OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL ENTRE CALLE CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM"

LOCALIDAD: SANCTORUM

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA N°: FORTA-22-23
HORA: 09:00 HRS

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V.	Gustavo Carrillo Chávez	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
0+000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Francisco Pérez Zapata	
NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.	Ana Angie Rufrancos Moreira	

000149

Fecha 18 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PUE.

OBRA: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL ENTRE
CALLE CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN LA
LOCALIDAD DE SANCTO, ZUM

VALOR CONTRATADO DE LA OBRA: 1,579,860.55 (UN
MIL CINIENTOS SETENTA Y NOVE MIL OCHOCIENTOS
CINENTA PESOS 55/100 M.N.)

CURSO: FORTA 2022

NUMERO DE CONTRATO: FORTA-22-23

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE OBRA: 18 DE NOVIEMBRE 2022
17 DE DICIEMBRE 2022


CONTRATISTA: INGENIERIA ESPECIALIZADA CARCHAS SA DE
CV.

REPRESENTANTE LEGAL: C. GUSTAVO CARRILLO CHÁVEZ.




EL MUNICIPIO

C. OSCAR QUECHOLAC
SASTRE
SUPERVISOR DE OBRA



POR EL MUNICIPIO
LIC. SANDRA MARIA
TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE
OBRAS PUBLICAS



POR EL CONTRATISTA

C. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 18 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°

OTA 1
 EN FECHA MARCADA CON EL DIA 18 DE NOVIEMBRE
 DEL AÑO 2022 SE DA APERTURA A LA PRESENTE
 BITÁCORA DE OBRA EN CONFORMIDAD DE LOS
 CUERDOS ESTIPULADOS EN EN CONTRATO PARA
 REALIZACION DE ESTA OBRA.

OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRIZO
 CHAVEZ

18 DE NOV. DE 2022
 FORTA-22-23

OTA 2
 EN ESTA FECHA DAMOS INICIO A LOS TRABAJOS DE LA
 OBRA DENOMINADA "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VECINAL
 ENTRE CALLE CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN
 LA LOCALIDAD DE SANCTORUM,"
 INICIAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRE-
 TO EN GUARNICIONES.

OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRIZO
 CHAVEZ.

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 19 / NOV / 2022

Folio N° / Anexo N°


NOTA N° 3

FORTA - 22 - 23

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS
DEZIMINARES QUE CONSTA DE LA DEMOLICION DE
PARNICIONES DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES
Y COMO EL RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE.



OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ

21 / NOV / 2022


NOTA N° 4

FORTA - 22 - 23

EN ESTA FECHA SE COMIENZA CON LA DEMOLICION
DE ASFALTO POR MEDIOS MECANICOS CON UN
MANEG DE 113 DE TRAMO.



EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ.


Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 23/ NOV / 2023

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 5
CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE CONTINUA
CON LOS TRABAJOS DE REMOLICION DE
CONCRETO ASFALTICO Y SE REALIZAN
TRABAJOS DE CARGA Y ACARreo DE MATERIAL
SOBRANTE DE LA OBRA.



EC. OSCAR QUECHOZAC SASTRE.




ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ.

24/ NOV / 2023

FOLTA - 22 - 23

NOTA N° 6
EN ESTA FECHA SE COMIENZA CON EL TRABAJO DE
A PARTIDA 1 CONSISTENTE EN EL TRAZO Y
VIGELACION DE PAVIMENTOS DE LOS PRIMEROS
10 000 M2.



EC. OSCAR QUECHOZAC SASTRE



ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 25 / NOV / 2022



Folio N° / Anexo N°

25 / NOV / 2022

NOTA N° 7

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA SE COMIENZAN TRABAJOS
DE EXCAVACION EN CASA POR MEDIOS MECANICOS
EN TERRENO TIPO II. EN EL PRIMER
TRAMO DE LA CALLE CALVARIO.




EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE
ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ.

28 / NOV / 2022

NOTA N° 8

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE
CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CASO
EN LA CALLE CAMINO VECINAL Y SE
HACEN TRABAJOS DE NIVELACION EN LA
MISMA.


EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE
ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 30 / NOV / 2022


Folio N° / Anexo N°

NOTA


N° 9

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE
TERMINA EL ULTIMO TRAMO DE
CAJEO EN LA CALLE CAMINO VECINAL
Y SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL.



EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE


ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ.


01 / DIC / 2022

NOTA


N° 10

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
POR MEDIOS MECANICOS Y SE REALIZAN
TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL SOBRAANTE.



EC. OSCAR QUECHOLAC SASTRE


ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ.

Elaborado por:

Recibido por:


ha 03/ DIC / 2022


Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 11

PORTA-22-23

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE LIBERA
 POR EL LABORATORIO LA CALLE CAMINO
 UECINAL Y SE REALIZAN LOS TRABAJOS PARA
 LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE PAULO
 EN CAPAS NO MAYORES A 20CM Y COMPAC-
 TADO AL 90% PROCTOR. Y SE COMIENZA LA
 CONSTRUCCION DE REGILLA LONGITUDINAL DE 2.00x0.60x1.


 OSCAR QUECHOLAC SASTRE



 ARQ. GUSTAVO CARRILLO
 CHAVEZ


04/ DIC / 2022

NOTA N° 12

PORTA-22-23

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA
 QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COMPAC-
 TACION Y TENDIDO DE LA SUBRASANTE CON
 LA HUMEDAD REQUERIDA Y COMPACTADO AL
 90% PROCTOR., SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION
 DE LA REGILLA LONGITUDINAL.


 OSCAR QUECHOLAC SASTRE


 ARQ. GUSTAVO CARRILLO
 CHAVEZ

Laborado por:

Recibido por:

05 / DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA

N° 13

FORTA - 22-23

CON ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON LA HUMEDAD REQUERIDA Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS. Y SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE CIMBRA PARA GUARNICIONES

ING. OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ.

07 / DIC / 2022

NOTA

N° 13

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA Y COLOCACION DE CIMBRA PARA GUARNICIONES ASI COMO LA COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE PARA GUARNICIONES CON RESISTENCIA NOMINAL $f'c: 150 \text{ kg/cm}^2$. Y SE CONCLUYE LAS REGILLAS LONGITUDINALES

ING. OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

Elaborado por:

Revisado por:


09 / DIC / 2022

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 14

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON LA COLOCACION DE BASE HIDRAULICA Y SE APLICA LA IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA Y POSTERIORMENTE SE APLICA EL PORCO CON ARENA PARA PROTECCION DE LA EMULSION.

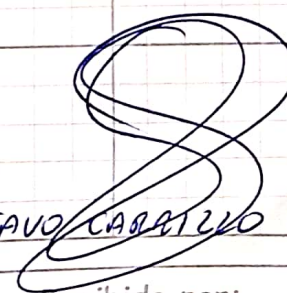

EG. OSCAR QUECHOLAC SASTIZ
ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ.

09 / DIC / 2022

NOTA N° 15

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA ES LIBERADA LA CALLE DON EL LABORATORIO CUMPLENDO CON LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACION., SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE ADCRETOTO EN LOS PRIMEROS TRAMOS COMENZANDO POR LA CALLE CALVARIO, ASI COMO CON LA RENIVELACION DE POZOS DE VISITA.


EG. OSCAR QUECHOLAC SASTIZ
ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ.

Elaborado por:

Recibido por:



Fecha 10 / DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 16

FOLTA-22-23

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE CONTINUA
CON LA COLOCACION DE ADCRETO ASENTADO
SOBRE CAMA DE ARENA, SE CONTINUA CON
LA RENUELAACION DE POZOS DE VISITA,
Y SE CIMBRA EL ULTIMO TRAMO PARA LA
COLOCACION DE CONCRETO PARA GUARNICION Y
DENTELLONES DE CONFINAMIENTO


O. OSCAR QUECHOLAC SASTRE
ARQ. GUSTAVO CARRILLO
CHAVEZ.

2 / DIC / 2022

NOTA N° 17

FOLTA-22-23

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE CONTINUA
CON LA COLOCACION DE ADCRETO ASENTADO
SOBRE CAMA DE ARENA, SE CONCLUYEN LOS
TRABAJS DE RENUELAACION DE POZOS DE VISITA,
Y SE COLOCA CONCRETO PARA LAS GUARNICIONES
CONCLUYENDO ASI EL ULTIMO TRAMO DE
GUARNICION.


O. OSCAR QUECHOLAC SASTRE
ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

Elaborado por:

Recibido por:

14 / DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°

NOTA

N° 18

FORTA-22-23

CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE ADOPRETO TIPO I CON RESISTENCIA NOMINAL $P'C = 300 \text{ kg/cm}^2$ SOBRE CAMA DE ARENA, SE COLOCAN DENTELLONES DE CONCRETO $F'C = 200 \text{ kg/cm}^2$ PARA EL CONFINAMIENTO DEL ADOPRETO EN 15×20 PARA LA SECCION TRANSVERSAL Y 15×40 , PARA LA SECCION LONGITUDINAL, SOLO SERA 15×20 .

OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

5 / DIC / 2022

NOTA

N° 19

FORTA-22-23

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LA COLOCACION DE ADOPRETO SOBRE CAMA DE ARENA Y SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE BROCALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LAVADEROS PARA EL DESAGUE DE LA VIALIDAD, SE COMIENZA EL BARRIDO Y JUNTEO CON ARENA PARA EL ADOPRETO

OSCAR QUECHOLAC SASTRE

ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

Elaborado por:

Revisado por:


16 / DIC / 2022

Folio N° / Anexo N°

OTA N° 20

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ADOPRETO ASENTADO EN CAMA DE ARENA EN EL ULTIMO TRAMO, SE REALIZAN LOS ULTIMOS TRAMOS DE DENTELLONES DE CONFINAMIENTO, ASI COMO EL BARRIDO DE ARENA PARA EL JUNTEO DEL ADOPRETO, SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCION DE LAVADEROS PARA EL DESAGUE DE LA VIALIDAD.



OSCAR QUECHOLZAC SASTIZ
ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

7 / DIC / 2022

OTA N° 21

FORTA - 22-23

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL ULTIMO TRAMO DE BARRIDO Y JUNTEO DE ARENA PARA EL ADOPRETO, SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y SE CONCLUYE CON LA PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALÉTICA DE LA MISMA, CON ESTO SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN CONTRATO.


OSCAR QUECHOLZAC SASTRE
ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

Elaborado por:

Recibido por:

17 / DIC / 2022


Folio N° / Anexo N°


OTA N° 22

FORTA-22-23

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADA
LA OBRA DENOMINADA "ADOQUINAMIENTO DE 2A
CALLE VECINAL ENTRE CALLE CALVARIO A PUENTE
VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM Y

CONFORME A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS Y EN
CONFORMIDAD DE LAS PARTES SE CIERRA ESTA
BITÁCORA DE OBRA.


OSCAR QUECHOLAC SASTRE


ARQ. GUSTAVO CARRILLO CHAVEZ

Elaborado por:

Recibido por:
