

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANTO MENOS TRES
PERSONAS

Licitación No. FORTA-22-25
Municipio: Cuatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla
Obra: "Construcción De Muro De Contención Del Bachillerato 5 De mayo"
No. Obra: FORTA-22-25

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-25, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de muro de contención del Bachillerato 5 de mayo" ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuatlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 12 de Octubre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-25, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de muro de contención del Bachillerato 5 de mayo" ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuatlancingo, Puebla.

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso.

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

000358

Dirección de Obras Públicas

para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Representante Legal Juan Carlos Flores Cruz, quien presentó una propuesta \$1,320,737.15 (Un Millón Trescientos Veinte Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 15/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:57 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

000358


Dirección de Obras Públicas

Presidente,


Directora de Obras,



C. Filomeno Barmiento Torres
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma



Mtra. Sandra María Tlaque Sánchez.

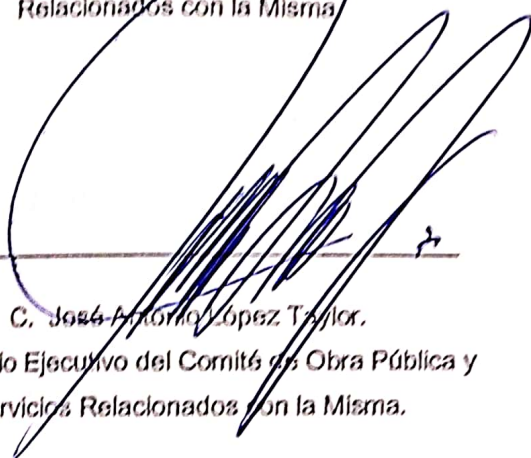


C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.




C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

000360

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
2	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN S.A. de C.V. Juan Carlos Narváez Hughes Representante Legal	
3	IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V. Jazmín Vázquez Vázquez Representante Legal	

000361

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-25

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO"
OBRA N°: FORTA-22-25

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2022

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. de C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN S.A. de C.V.	Juan Carlos Narváez Hughes	
IYCSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	Jazmín Vázquez Vázquez	

000862

No Contrato Forta 22-25

El Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, Puebla
Dirección de obras Públicas

Contratista: Corporativo y proyectos MAUTRA S.A. de C.V.

Representante legal: Juan Carlos Flores Cruz.

Supervisión: Dirección de Obras Públicas

Nombre de la obra "Construcción de Muro de contención del Bachillerato del Mayo"

Localidad: San Lorenzo Almecatla, Cuatlancingo, Puebla.

Alcance de los trabajos: Muro de contención de concreto armado y malla ciclónica.

Periodo de ejecución: 17 de octubre de 2022 a
30 de noviembre de 2022

Abriendo la presente bitácora autorizan las partes
contratantes y contratador las siguientes firmas para
hacer constar las notas siguientes.



Ter. Oscar Decholas Sastre
Supervisor de obra



Aia. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra.

000057

Con la presente nota se dan por comenzados los trabajos de demolición desmantelando la malla ciclónica y retirando los postes donde se sujetaba dicha malla.




Tec. Oscar Quechola Sastre
Supervisor de obra




Ara. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

20 / oct / 2022 Nota No 3

Continúan los trabajos de demolición del muro afectado, ya se ha concluido la demolición del tabique, dejando solo restante la demolición de 1 cimiento de piedra, se han comenzado los viajes para depositar el material resultante de la demolición de los elementos del muro al banco de tiro autorizado.




Tec. Oscar Quechola Sastre
Supervisor de obra




Ara. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

000053

Con esta fecha se hace constar que se llevo a cabo el trabajo de limpieza y trazo y se estan concluyendo los trabajos de excavación se ha comenzado en el armado de la bodega y con la base para habilitar acero.


Ing. Oscar Quechola Sastre
Supervisor de obra


Ara. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

28/ Oct/ 2023

Nota No 5


En la visita se observa ya la plantilla de concreto se ha comenzado a ejecutar el armado de la plantilla y el muro de retención siguiendo las especificaciones de los planos estructurales la supervisión tiene constancia que se han respetado los calibres calculados


Ing. Oscar Quechola Sastre
Supervisor de obra



Ara. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

000059

Se observa un avance del 30% en el habilitación del acero y ha comenzado a llegar el triplay de pino de 16 mm para comenzar con el armado de las tarimas que servirán para el encofrado del muro, también se han colocado los tubos de PVC dentro del armado existente que servirán como dren.



Fer. Oscar Quechola Sastre
Supervisor de obra



Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

05/Nov. /2023 No. 7

A la fecha se continúa con el tendido y armado del acero en la zapata y el tacón anti voladuras así como se comienza con el encofrado de una primera sección del muro para colar.




Fer. Oscar Quechola Sastre
Supervisor de obra




Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra.

000000

En esta fecha se observa un avance en el armado y habilitado de acero en el muro del 70% y se esta descombrando el primer tramo colado del muro se hace constar que comienza a llegar el material que se empleara para el dren y el relleno del muro de contención.



Tec. Oscar Ochoa Sastré
Supervisor de obra




Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

15 / Nov / 2023

Nota N. 9

En esta nota se termina el armado y habilitado de acero del muro de contención, se chequean los calibres y las distancias entre elementos, se enajuna tambien el segundo tramo del muro a colar dejando las preparaciones del tubo dren y el poliestireno entre secciones.



Tec. Oscar Ochoa Sastré
Supervisor de Obra




Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra.

000001

Se comienza con el entofrado del ultimo tramo a colar del muro de contención y se comienza con la colocación de la geomalla y el tubo dren situado detrás del muro de contención.



Tec. Oscar Ordoñez Sastré
Supervisor de obra




Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

26 / Nov. / 2023 Hsta 11.11

Se ha colado en su totalidad el muro de contención así mismo se ha descimbrado, el tubo dren y el relleno se están terminando




Tec. Oscar Ordoñez Sastré
Supervisor de obra



Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

OSCAR

Con esta fecha se cierra la presente bitacora de obra haciendo Supervisión integral de las metas contratadas y las ejecutadas el murede contención se observa terminado al 100% los rellenos se encuentran terminados y compactados según los conceptos contratados, la malla reténica también se encuentra colocada a la distancia y altura según el proyecto y la obra se encuentra en proceso de finalización con la limpieza integral del área intervenida y el área perimetral para entregar la obra a entera satisfacción del municipio



Tec. Oscar Decholas Sastré
Supervisor de obra



Arq. Oscar Dominguez Castillo
Residente de obra

DDDEG 3

1
