

Dirección de Obras Públicas

000251

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Licitación No. FAISMUN-23-05
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla.
Obra: "Ampliación de línea de alcantarillado sanitario de la privada B Emiliano Zapata entre calle Emiliano Zapata y camino Real, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Pue."
No. Obra: FAISMUN-23-05

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-05, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Ampliación de línea de alcantarillado sanitario de la privada B Emiliano Zapata entre calle Emiliano Zapata y camino Real, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Pue." ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 19 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-05, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Ampliación de línea de alcantarillado sanitario de la privada B Emiliano Zapata entre calle Emiliano Zapata y camino Real, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Pue." ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

000252

concurantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.** Representante Legal, Silvia Arroyo Bass, quien presentó una propuesta \$ 326,930.56 (Trescientos Veintiséis Mil Novecientos Treinta Pesos 56/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000253

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

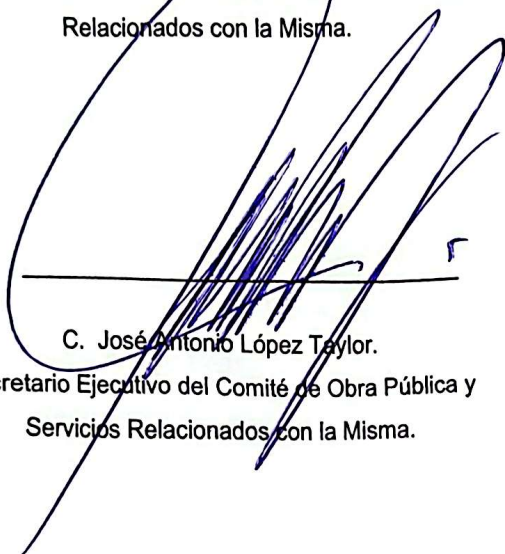

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.




C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

000254

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal	
2	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A. DE C.V. Silvia Arroyo Bass Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FAISMUN-23-05

OBRA: "AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PRIVADA B EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO REAL,

OBRA N°: FAISMUN-23-05

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.	Karla Calderón Pérez	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A. DE C.V	Silvia Arroyo Bass	

000255

Fecha 21 / Abril / 2023

Folio N° 00 / Anexo N° 395

Nombre de la obra: Ampliación de línea de alcantarillado
Sanitario de la privada B Emiliano
Zapata entre calle Emiliano Zapata
y Camino Real, En San Lorenzo Almecatty,
Cuautlancingo, Pue.

Fecha de inicio y termino de obra: 21 de Abril de 2023
al 10 de Mayo de 2023

Numero de contrato: FAISMUN-29-OS

Monto: 326,930.56 (Trescientos Veintiseis mil novecientos
treinta pesos 56/100 M.N.)

Recurso: FAISMUN 2023

Contrata: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla

Contratista: Grupo Constructor Seydo S.A de C.V.

Representante legal: C. Carla Calderon Perez

FIRMAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLEVAR
EL CONTROL DE ESTA BITÁCORA.

Por el H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo Puebla.

Por la empresa: Grupo construc-
tor SEYDO SA de CV.

Ing. Sandra Maria Plaque Gomez
Directora de Obras Publicas

C. Carla Calderon Perez
Representante legal

Ing. Hilario Sánchez Medrano
Supervisor de Obra

Arq. Joaquín Rosano Razo
Presidente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 21 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 01

FAISMUN - 20 - 05

Con esta nota y esta fecha se
abre la presente bitácora de
obra para realizar todas las observaciones
y avances de obra y se comienzan los
trabajos de limpia y trazo en la
Privada D. Emiliano Zapata, se comienza
la excavación en zanjas con equipo mecánico.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Arq. Joaquín Rosano Razo

22 / Abril / 2023

Nota N° 02

FAISMUN - 23 - 05

con esta nota y esta fecha se le informa
a la supervisión que se realiza la excavación
de ceras para red de drenaje sanitario.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Arq. Joaquín Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 24 / Abril / 2023

Folio N° 1 Anexo 197

Nota N° 03

FAISMUN - 23 - 05

Con esta fecha se le informa a la Supervisión que se continua con la excavación de cepas para la colocación de plantilla para colocar tubo de polietileno de alta densidad de 10", se coloca plantilla con material de banco (tepalcates) compactado al 85% proctor.



Arq. Hilario Sanchez Medrano

25 / Abril / 2023



Arq. Joaquin Rosano Razo

Nota N° 04

FAISMUN - 23 - 05

con esta nota y esta fecha se va colocando plantilla con material de banco (tepalcates) compactado al 85%, acude el laboratorio a realizar pruebas de plantilla, se libera y se comienza con la colocación de tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 10" con interior liso.



Arq. Hilario Sanchez Medrano



Arq. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 27 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 05

FALSMUN-23-05

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervicion que se realizan los trabajos de excavacion de cepas y se continua con la colocacion de tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 10" para linea principal de atarjeas, se realizan trabajos de acostillamiento de tubo sanitario en capas no mayores a 20cm compactado al 90% Proctor.



Arg. Hilario Sanchez Medrano

28 / Abril / 2023

Nota N° 06

FALSMUN-23-05

Con esta nota se informa a la supervicion que se realizaran la construccion de Pozo de visita con una profundidad de 1.26 m, así como el relleno de cepas con material producto de la excavacion compactado al 90% Proctor.



Arg. Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 29 Abril 17023

Folio N°

00 397

Anexo N°

Nota N° 07

FAISMUN - 23-05

con esta fecha se informa ala Supervicion que se realizan trabajos de relleno en zanjas con material producto de la excavacion compactado al 90% proctor. Se realiza la construccion del 2° pozo de visita con una altura de 1.7m. con tabique rojo secocido acentada con mortero cemento arena 1:3 repellido con cemento acabado Pulido.

Arq. Hilario Sánchez Medrano

Arq. Joaquin Rosano Razo

01/Mayo/2023

Nota N° 08

FAISMUN - 23-05

con esta nota y esta fecha se realizan los trabajos de construccion de pozos de visita N° 3 y 4 con una altura de 2.25 el N° 3 y una renovacion del pozo N° 4, Se realizan trabajos de excavacion para descargas domiciliarias con tubo de polietileno de alta densidad con un diametro de 6" con interior liso.

Arq. Hilario Sánchez Medrano

Arq. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 03/Mayo/2025

Folio N° 100 de 400

Nota N° 09

FAISMUN-23-05

Con esta nota y esta fecha se informa a la Supervision que se realizan trabajos de excavacion e instalacion de descargas sanitarias domiciliarias con tubo de polietileno de alta densidad de 6" asentado sobre Plantilla de material de banco (terpetate) compactado al 85% Proctor, en conjunto se realiza la instalacion de tomas domiciliarias de agua potable con manguera de polietileno de alta densidad de 1 1/2" con abrazadera de PVC 2 x 1 1/2 y tubo de insercion de bronce.



Arq. Hilario Sanchez Medrano



Arq. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 05/mayo/2023

Folio N° 401
Anexo N°

Nota N° 10

FAISMUN - 27-05

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se realizan trabajos de instalación de descargas domiciliarias con tubo de polietileno de alta densidad de 6", se realizan trabajos para la instalación de tomas domiciliarias.



Arg. Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

08/mayo/2023

Nota N° 11

FAISMUN - 23-05

Con esta nota se le informa que se continua con la instalación de tomas domiciliarias con tubo de polietileno de 1/2" con abrazadora de PVC de 2" a 1/2", tambien se continua con la colocación de descargas sanitarias con tubo corrugado de polietileno de alta densidad con campana de 6", se colocan brocales de polietileno de alta resistencia.



Arg. Hilario Sanchez Medrano



Arg. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 09 / Mayo / 2023

Folio N° 00 402 / Anexo N°

Nota N° 12 FAISMUN-23-05
Con esta nota y esta fecha se informa a la supervicion que se continua con la colocacion de tubo sanitario de 6" para descargas domiciliarias e instalacion de tomas domiciliarias con tubo de 1/2 de polietileno de alta densidad, se realizan rellenos en zanjas con material producto de la excavacion compactado al 90% proctor.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
10 / Mayo / 2023


Arq. Joaquin Rosano Razo.

Nota N° 13 FAISMUN-23-05
Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervicion que se concluyen los trabajos de la obra denominada "Ampliacion de linea de alcantarillado sanitario de la Privada B Emiliano Zapata entre calle Emiliano Zapata y Camino Real, en San Lorenzo Alacatlan, Ocuatlancingo, Puc." con lo que se cierran las notas y esta bitacora de obra.


Arq. Hilario Sánchez Medrano


Arq. Joaquin Rosano Razo

Elaborado por:

Recibido por:
