



Dirección de Obras Públicas

000265

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Licitación No. FAISMUN-23-08
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla.
Obra: "Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle 16 de septiembre y Guadalupe Victoria en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla".
No. Obra: FAISMUN-23-08

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FAISMUN-23-08, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle 16 de septiembre y Guadalupe Victoria en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 04 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FAISMUN-23-08, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle 16 de septiembre y Guadalupe Victoria en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



000266

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.** Representante Legal, Marcos Varela Izquierdo, quien presentó una propuesta \$ 511,437.36 (Quinientos Once Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos 36/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 12:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000267

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Samiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

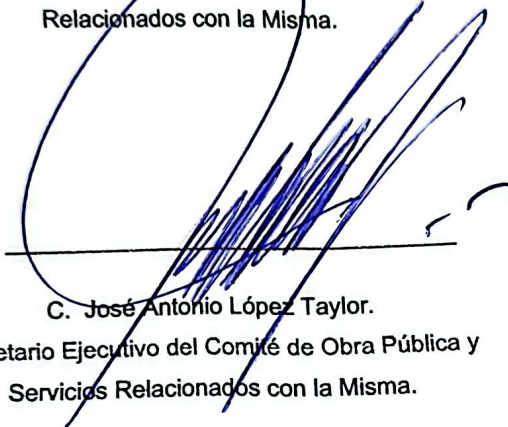

C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.


Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.




Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

000268

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA S.A. DE C.V. Eduardo Rodríguez Soriano Representante Legal	
2	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	



000457

Nombre de la obra: "Rehabilitación de drenaje Sanitario de la Calle Norelos entre calle 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria en San Lorenzo Alacatlán, Cuautlancingo, Puebla."

Numero de Contrato: FAISMUN - 23-08

Fecha de inicio: 08 de mayo de 2023

Fecha de termino: 27 de mayo de 2023

Recurso: FAISMUN 2023

Monto de la obra: \$S11,437.36 (Quinientos once mil Cuatrocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N)

Contratista: Proyectos y edificaciones MYL S.A DE C.U.

Representante Legal: C. Marcos Varela Izquierdo

Contratante: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla.

A continuación se realizan las firmas de las personas autorizadas para intervenir en esta Bitacora de obra.

Por el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla.

Por el contratista Proyectos y edificaciones MYL S.A DE C.U.

LC Sandra Maria Tlague Gomez
Directora de Obras publicas de
Cuautlancingo, Puebla.

Ing. Marcos Varela Izquierdo
Super Intendente.

Ing. Hilario Sánchez Medrano
Supervisor de obra

Nota No 01

FAISMUN - 23-08

401.461

Con esta Nota y esta fecha se apertura esta bitacora de obra, todos los acuerdos realizados y/o cualquier cambio efectuado en la obra sera acentado sobre la presente asi como los trabajos realizados conforme a el contrato estipulado con el Numero FAISMUN - 23-08. Firmando a continuacion los responsables de supervisar el cumplimiento de todos los acuerdos.



Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

08/mayo/2023

Nota No 02

FAISMUN - 23-08

Con esta fecha y esta nota se informa al supervisor que se comienzan los trabajos de limpia y trazo perteneciente a la partida de red de aturques, posteriormente se comienza con el corte con disco en pavimento de concreto de 15cm de espesor, y tambien se realizan trabajos de demolicion de pavimento.


Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

Nota

No 03

PAISMUN-23-08009461

con esta nota se le informa al supervisor que se continua con el corte y demolicion de concreto hidraulico con un espesor de 15 cm de espesor, tambien se continua con la excavacion de cepas para el tendido de tubo sanitario de polietileno de alta densidad corrugado de interior liso con diametro de 12" C/campana y empaque.


Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

10 / Mayo / 2023

Nota No 04

PAISMUN-23-08

con esta nota y esta fecha se informa sobre los trabajos realizados actualmente donde se continua con la demolicion y la excavacion de cepas para colocar el tubo sanitario de 12" de diametro, se realizan trabajos de afine y nivelacion para colocar plantilla de tepeta te.


Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

Nota No 05

FAISMUN-23-0800462


con esta nota se informa al supervisor que se realizan trabajos de colocación de plantilla para recibir tubo de polietileno de alta densidad de 12", la cual es de material de banco (tepalcates) compactado al 85% Proctor, se le informa al laboratorio el cual libera y autoriza el tendido del tubo cumpliendo con la compactación de la plantilla, se coloca el primer tramo de tubo de Polietileno de alta densidad de 12" para la red de atarjeas, posteriormente se procede con el acostillamiento del tubo.



Arq. Hilario Sánchez Medrano



Ing. Marcos Varela Izquierdo

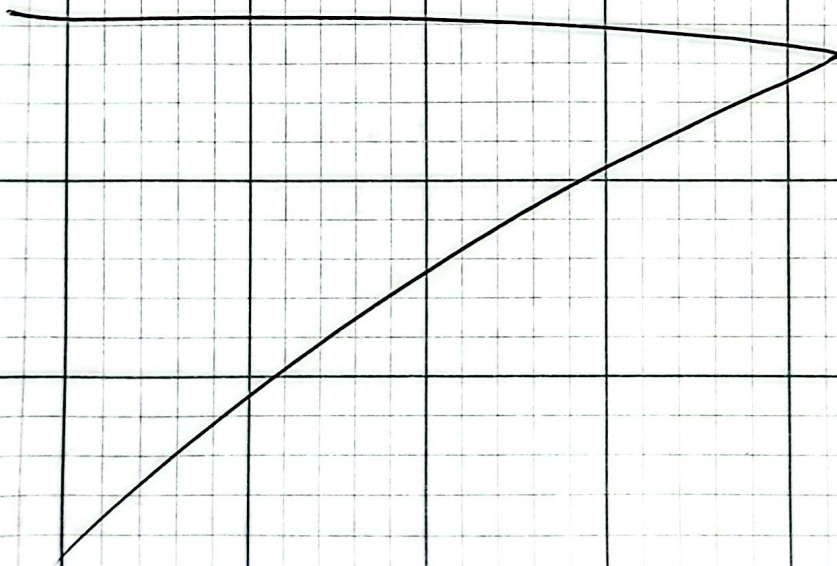

Nota Nº 06

PAISMUN-23-08

Con esta fecha y esta nota se informa al supervisor que se continua con los trabajos de excavacion para instalacion de tubo sanitario de 12" para la red sanitaria principal, se coloca plantilla con material de banco (terpetate) compactado al 85% proctor, se coloca y se acostilla el tubo sanitario de 12" en capas no mayores al establecido de 20 cm. compactado al 90% proctor.

Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Marcos Varela Izquierdo

15 / mayo / 2023

Nota Nº 07

PAISMUN-23-08

Con esta fecha se informa al supervisor que se realizan trabajos de corte con disco para realizar excavacion de las descargas domiciliarias asi como se realizan trabajos de demolicion de concreto hidraulico, se comienza la construccion de los pozos de visita construido con ladrillo rojo recocido con una altura de 1.20 a 2.00 metros de profundidad.

Ing. Hilario Sánchez Medrano

Ing. Marcos Varela Izquierdo

Nota N° 08

FAISMUN - 23-08

000464

con esta nota y esta fecha se informa al Supervisor que se continua con los trabajos de corte y demolición de pavimento hidráulico para realizar excavación de cepas para conectar descargas domiciliarias, se realiza la conexión de las primeras 9 descargas domiciliarias, se realizan trabajos de relleno de pozos de visita, se comienza con el relleno de cepas con material de banco compactado al 90% Proctor.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

19 / mayo / 2023

Nota N° 09

FAISMUN - 23-08

con esta nota y esta fecha se informa al Supervisor que se continúan instalando las descargas domiciliarias con tubo de Polietileno de alta densidad de 6" conectando con la red principal con tee wye PVC 12"x6" para tubo de polietileno de alta densidad, se continua con el relleno de cepas con material producto de la excavación y tapete en proporción 40% y 60% compactado al 90% Proctor


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

Nota No 10

FAISMUN-23-08

Con esta nota y esta fecha se informa a la supervicion que se realizan trabajos de relleno y compactacion en cepas resultantes de la instalacion de red de atarjeas y tambien descargas domiciliarias, se realizan trabajos de instalacion de tomas domiciliarias con abrazadera de PVC y tubo de polietileno de alta densidad de $\frac{1}{2}$ " de diametro.



Arq. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

24 / mayo / 2023

Nota No 11

FAISMUN-23-08

Con esta Nota se realizan trabajos de relleno de cepas con material de banco y producto de la excavacion en una proporcion 60 X 40 % compactado al 90% Proctor, se concluye con la instalacion de tomas domiciliarias con tubo de polietileno de alta densidad de $\frac{1}{2}$ " de diametro.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

NOTA

Nº 12

FAISMUN-23-08 805466

con esta nota se informa a la supervisión que se realizan pruebas por el laboratorio de compactación de los rellenos en capas y liberan la obra para la colocación de base hidráulica que servirá como base para la reposición del concreto hidráulico removido, se coloca la base hidráulica en capas no mayores a 20 cm y compactada al 95% proctor.


Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

26 / mayo / 2023

NOTA

Nº 13

FAISMUN-23-08

En esta fecha y con esta nota se informa que se colocan brocales en pozos de visita, también se realizan pruebas de compactación a la base hidráulica la cual cumple y es liberada por el laboratorio, se coloca malla de refuerzo para posteriormente colocar el concreto hecho en obra con una resistencia nominal de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.


Ing. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo

Nota N° 14

FAISMUN - 23 - 08

Con esta fecha y esta nota se informa la supervisión que con la aprobación del laboratorio y cumpliendo con el revenimiento requerido se coloca el concreto hecho en obra con una resistencia nominal de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y posteriormente se realizan trabajos de carga y acarreo de material sobrante de la obra al banco de tiro concluyendo así las labores del contrato de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla." por lo consiguiente y en conformidad de las partes se cierran las notas de la presente bitacora.


Arq. Hilario Sánchez Medrano
Ing. Marcos Varela Izquierdo
