

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES  
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-08  
Municipio: Cuautlaningo, Puebla.  
Comunidad: San Juan Cuautlaningo.  
Obra: "Adoquinamiento de la privada Estación entre calle Estación y esquina primera y segunda privada Estación".  
No. Obra: FORTA-23-08

**ACTA DE FALLO**

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FORTA-23-08, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlaningo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la privada Estación entre calle Estación y esquina primera y segunda privada Estación". ubicada en la localidad de San Juan Cuautlaningo, del municipio de Cuautlaningo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlaningo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 19 de Abril de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-08, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la privada Estación entre calle Estación y esquina primera y segunda privada Estación". ubicada en la localidad de San Juan Cuautlaningo, municipio de Cuautlaningo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

**Dirección de Obras Públicas**

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **ANTONIO COLIENTE HUITZIL** Persona Física con Actividad Empresarial, quien presentó una propuesta \$ 812,662.38 (Ochocientos Doce Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 38/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de  
Cuaulancingo, Puebla 2021 – 2024

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –**


Presidente.

Directora de Obras.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.  
2021-2024

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.


Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.


Vocal 3.




C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas  
Por las Empresas Participantes.

| No. | Nombre del Representante legal<br>Razón Social o Persona Física.     | Firmas                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | VERÓNICA PÉREZ CRUZ<br>Persona Física con Actividad Empresarial      |    |
| 2   | RICARDO GALLEGOS ICELO<br>Persona Física con Actividad Empresarial   |   |
| 3   | ANTONIO COLIENTE HUITZIL<br>Persona Física con Actividad Empresarial |  |





GOBIERNO  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2021 - 2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-08

OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ESTACIÓN ENTRE CALLE ESTACIÓN Y ESQUINA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA ESTACIÓN".

OBRA No: FORTA-23-08

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

### LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

| EMPRESA                  | REPRESENTANTE LEGAL      | FIRMA                                                                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VERÓNICA PÉREZ CRUZ      | Verónica Pérez Cruz      |  |
| RICARDO GALLEGOS ICELO   | Ricardo Gallegos Icelo   |  |
| ANTONIO COLIENTE HUITZIL | Antonio Coliente Huitzil |  |

000488

21 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

de la obra: "Adoquinamiento de la Privada  
Estacion entre Calle Estacion y  
esquina primera y Segunda  
Estación."

de inicio: 21 de Abril de 2023

de termino: 22 de Mayo de 2023

ISO: FORTAMUN 2023

de Contrato: FORTA-23-08

MO: 812,662.38 (OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS  
SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N)

ata: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla.

atista: Antonio Coliente Huitzil

Persona Fisica con Actividad Empresarial

mbre y Firma de los Responsables de la obra:

del H. Ayuntamiento de  
Cuautlancingo Puebla.

Sandra M. Pliego Gomez  
Directora de Obras Publicas

CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.  
2021-2024

Hilario Sánchez Medrano  
Supervisor de obra,

C. Antonio Coliente Huitzil  
Persona Fisica con  
Actividad Empresarial

Elaborado por:

Recibido por:

21 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°


Nota N° 01

PORTA - 23-08


Con esta fecha se apertura esta obra y bitácora donde se llevara el control y se informara por los trabajos realizados y cualquier modificación que se requiera se acentara en la misma, con lo que se informa a la Supervisión que se comienza con la limpieza y trazo del drenaje sanitario, se comienza el trabajo de excavación por medios mecánicos para la posterior instalación de Plantilla y colocación de tubo sanitario.



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Coliente Huita

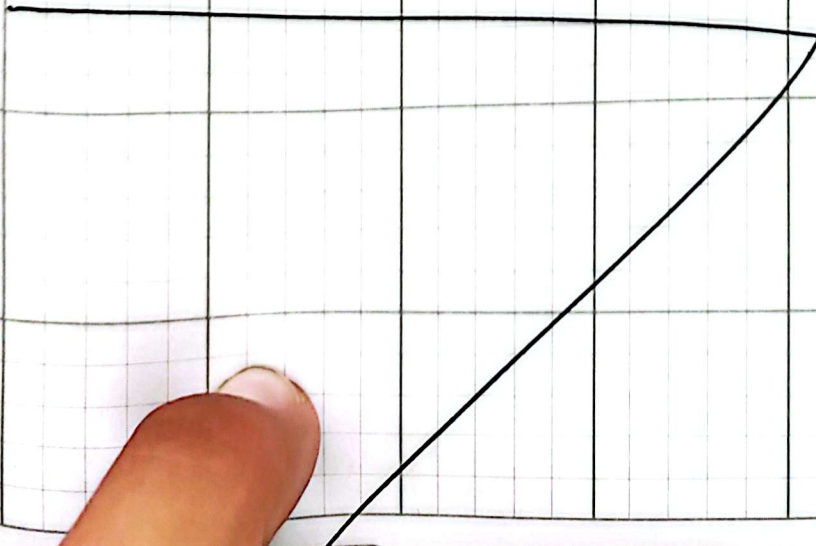

26 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 04

FORTA-23-08

Con esta nota se le informa a la supervisión que se coloca tubo de red Sanitaria con tubo de Polietileno de alta densidad con un diámetro de 12". Se realizan trabajos de colocación de descargas Sanitarias con tubo de Polietileno de alta densidad con un diámetro de 6" con codo de PVC S20 de 45° con anillo integrado.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil.

27 / Abril / 2023

Nota N° 05

FORTA-23-08

Con esta nota y esta fecha se informa que se realizan conexiones de descargas Sanitarias con tubo de Polietileno de 6", se realizan trabajos de relleno con producto de la excavación compactado al 90% Proctor.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

Elaborado por:

Recibido por:

27 / Abril / 2022

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 06

FORTA - 23- 08

Con esta nota se informa a la Supervision que se continua con la colocacion de descargas Sanitarias con tubo de Polietileno de alta densidad con un diametro de 6", Se realizan trabajos para la construccion de Pozo de visita con una profundidad de 0.90 cm de ladrillo rojo recocido con mortero de Cemento arena 1:3 y rerellado se deja un mosen para la calle y posteriormente se nivelara a la llegar al nivel de la misma, Se continua con el trabajo de relleno con material producto de la excavacion compactado al 90% Proctor.



Arq. Hilario Sanchez Mediano



C. Antonio Coliente Huitzil

Elaborado por:

Recibido por:


28 / Abril / 2023

Folio N° / Anexo N°

No 07

FORTA - 23 - 08

Con esta fecha se realizan trabajos de relleno y compactación con material producto de la excavación, se realiza la construcción de Pozo de visita con una profundidad de 1.5 m con mortero cemento y arena y ladrillo rojo recocido, repellado en paredes internas, se deja margen para el corte posterior de la calle.

  
Hilario Sanchez Medrano  
C. Antonio Coliente Huiza

29 / Abril / 2023

FORTA - 23 - 08

No 08

FORTA - 23 - 08

Con esta fecha y esta nota se realizan trabajos de limpieza y desasteos para comenzar con el trazo de calles y corte.

  
Hilario Sanchez Medrano  
C. Antonio Coliente Huiza

Elaborado por:

Recibido por:

01 Mayo 2023

Folio N° / Anexo N°


Nota No 09

FORTA-23-08

Con esta fecha se le informa a la Supervision que se comienza con el corte de terreno natural con moto conformadora a una altura promedio de 75. cm, se comienza con la carga y acarreo de material producto del corte.



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Coliente Huizil

01 Mayo 2023

Nota No 10

FORTA-23-08

Con esta nota se le informa a la Supervision que se continua con el corte con motoconformadora para posteriormente compactar el terreno natural.



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Coliente Huizil

Elaborado por:

Recibido por:

02 / Mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 11

FORTA - 23 - 08

Con esta fecha se informa a la  
Supervision que se realizan los  
trabajos de corte con motoconformadora  
y se realizan trabajos de carga y  
acarreos de material producto del  
corte.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

04 / Mayo / 2023


Nota N° 12

FORTA - 23 - 08

Con esta nota y esta fecha se informa  
que se realizan trabajos de compactacion  
de terreno natural en capas de 20 cm  
compactado por medios mecanicos para  
recibir la subbase de tepetate producto  
de banco.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

Elaborado por:

Recibido por:

15 / Mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

N° 13

FORTA - 23 - 08

Con esta nota se le informa a la supervisión que se realizan trabajos de tendido de subrazante con material de banco (tepalcates) en capas no mayores a 20 cm compactado al 95% con la humedad requerida y compactado con rodillo vibratorio para lograr la compactación requerida.



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

15 / Mayo / 2023

N° 14

FORTA - 23 - 08

con esta fecha se realiza el trabajo de tendido de subrazante con material de banco (tepalcates) compactado al 95% Proctor con rodillo vibratorio, se lleva al laboratorio para realizar prueba de compactación y libere la calle para tender base hidráulica



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

Recibido por:

Recibido por:

Mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°


Nota N° 15

FORTA-23-08

Se informa a la supervisión que se libera el tramo de calle para realizar el tendido de la base hidráulica, apisonada y compactada al 95% Proctor con la humedad requerida, se colocan las cimbras para la colocación de Guarniciones de concreto  $P.C: 150 \text{ Kg/cm}^2$ .



Mario Sanchez Medrano



C. Antonio Collente Huitzi

Mayo / 2023


N° 16

FORTA-23-08

Con esta nota se informa a la Supervisión que se continúa con el tendido y la compactación de base hidráulica compactada al 95% proctor con la humedad requerida, se continúa con la cimbra y colocación de concreto  $P.C: 150 \text{ Kg/cm}^2$  para Guarniciones.



Mario Sanchez Medrano



C. Antonio Collente Huitzi

Emitido por:

Recibido por:

12 / Mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

N° 17

FORTA-23-08

Con esta fecha se realiza el estudio por el laboratorio de base hidraulica, se libera la calle para continuar con la impregnacion con emulsion asfaltica de tipo GC1-60 A razon de 1.5 lts/m<sup>2</sup>, tambien se realiza el poreo con arena para la proteccion de la emulsion.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

13 / mayo / 2023

N° 18

FORTA-23-08

con esta nota y esta fecha se informa a la supervision que se realizan trabajos de construccion de piso de adoqueto acantado sobre cama de arena con una resistencia  $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$  de 8 cm de espesor.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huitzil

laborado por:

Recibido por:

15 / Mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°


Nota N° 20

FORTA - 23-08

Con esta fecha y esta nota se informa a la Supervision que se continua con la construccion de PISO de adocreto  $F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$  asentado sobre cama de arena, se realiza la renivelacion de los pozos de visita para recibir brocal de polietileno de alta densidad y resistencia.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huiztil

17 / Mayo / 2023

Nota N° 21

FORTP - 23-08

Con esta nota y esta fecha se informa a la Supervision que se realizan trabajos de construccion de PISO de adocreto  $F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ , y se comienza con la construccion de dentellones en el hombro derecho e izquierdo con concreto  $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$  para confinamiento de adocreto.



Hilario Sanchez Medrano



C. Antonio Coliente Huiztil

Elaborado por:

Recibido por:

18 / MAYO / 2023

Folio N° / Anexo N°

NOTA N° 22

FORTA-23-08

con esta nota y esta fecha se  
continúa con la construcción de  
adocreto  $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$  acentado sobre  
cama de arena, se continúa con la  
construcción de dentellones transversales  
con concreto  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , y se comienza  
el barrido y junteo de piso con arena  
Cernida.




Hilario Sánchez Medrano


C. Antonio Coliente Huitzil

19 / MAYO / 2023

NOTA N° 23

FORTA-23-08

con esta fecha se realizan trabajos  
de construcción de piso de adocreto acentado  
sobre cama de arena, y se construyen  
dentellones de concreto  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , se  
realiza la colocación de brocal de  
polietileno de alta resistencia clase  
H-2S

Hilario Sánchez Medrano

C. Antonio Coliente Huitzil

Elaborado por:

Recibido por:

20 / Mayo / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 24

FORTA-23-08

Con esta fecha y esta nota se informa a la supervicion que se realizan trabajos de colocacion de dentellones transversales y longitudinales con concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, se realizan trabajos de suntuco y barrido con arena cernida para suntuco de piso de adoceto.



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Collente Huitzil

22 / Mayo / 2023

Nota N° 25

FORTP-23-08

Con esta fecha y esta nota se le informa a la supervicion que se realizan trabajos de limpieza general, asi como la aplicacion de pintura en guarniciones y raya para cruce peatonal de 60 cm de ancho con pintura tipo trafico comex color amarillo, concluyendo con esto los trabajos estipulados en el contrato.



Hilario Sánchez Medrano



C. Antonio Collente Huitzil

Elaborado por:

Recibido por:
