

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Licitación No. FORTA-23-13
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cautlancingo.
Obra: "Adoquinamiento de la Privada Benito Juárez, entre Calle Benito Juárez y fondo de la misma, Cautlancingo, Puebla."
No. Obra: FORTA-23-13

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso FORTA-23-13, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Adoquinamiento de la Privada Benito Juárez, entre Calle Benito Juárez y fondo de la misma, Cautlancingo, Puebla." ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 13:00 horas, del día 29 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-13, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Adoquinamiento de la Privada Benito Juárez, entre Calle Benito Juárez y fondo de la misma, Cautlancingo, Puebla." ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.**, Representante Legal Ana Angie Rufrancos Moreira, quien presentó una propuesta \$1,455,664.88 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 88/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta. _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautilancingo, Puebla 2021 – 2024

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE


EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

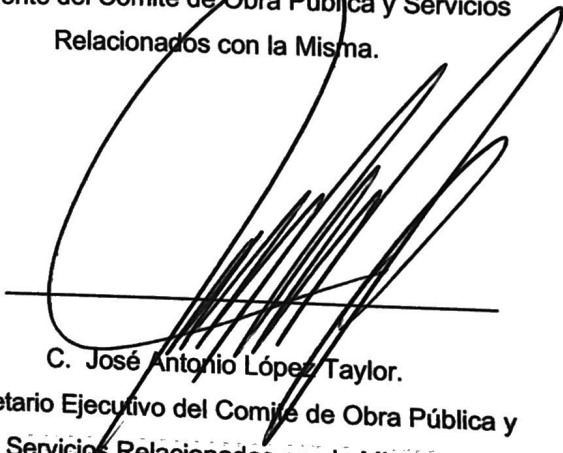
Presidente.

Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tiaque Gómez.


C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.


Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.

Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas
Por las Empresas Participantes.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V. Gustavo Carrillo Chávez Representante Legal	
2	DIANA LAURA TORRES TERRAZAS Persona Física con Actividad Empresarial	
3	NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V. Ana Angie Rufrancos Moreira Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : FORTA-23-13

OBRA : "ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FONDO DE LA MISMA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

FECHA : 23 DE MAYO DE 2023

HORA: 13:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V.	Gustavo Carrillo Chávez	
DIANA LAURA TORRES TERRAZAS	Diana Laura Torres Terrazas	
NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO S.A. DE C.V.	Ana Angie Rufrancos Moreira	

000327

Fecha 31 / 05 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nombre de la obra: "Aduquinamiento de la Privada Benito Suarez, entre calle Benito Suarez y fondo de la misma, Cuautlancingo, Puebla."

Número de Contrato: FORTA-23-13

Punto de la obra: \$ 1,455,664.88 (Un Millon Cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 88/100 M.N.)

Fecha de inicio y terminacion de la obra: 31 de Mayo de 2023 al 19 de Junio de 2023.


Protagonista: H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla


Contratista: Nalpe Maquinaria y equipo pesado SA. de C.V.

Representante legal: C. Ana Angie Rufrañcos Moreira

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

Por el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla:



Sandra Tlaque Gomez
Directora de Obras Publicas
de Cuautlancingo Puebla.


Ing. Oscar Quechotac Sastre
Supervisor de Obras Publicas

Por la empresa Contratista:


ALPE
MAQUINARIA

C. Ana Angie Rufrañcos Moreira
Representante Legal


ALPE
MAQUINARIA

Ing. Rodolfo Sosa Olea
Residente de Obra

Elaborado por:

Recibido por:



Fecha 31/05/2023

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 01

FORTA - 23-13

Con esta nota se apertura esta bitacora de obra y se informa a la supervicion que se inician los trabajos de trazo y nivelacion, asi como con la excavacion en caja por medios mecanicos con una profundidad promedio de 0.55 m., tambien se retira material producto de la excavacion.



Oscar Quecholac Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

01/06/2023

NOTA N° 02

FORTA - 23-13

Con esta nota se le informa a la supervicion que se continua con el caso de la privada Benito Suarez con una profundidad promedio de 55 cm, se continua con el retiro de material producto de la excavacion.


Oscar Quecholac Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 02/06/2023

Folio N° /Anexo N°

NOTA N° 03

FORTA-23-13

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se realizan trabajos de caleo por medios mecánicos, se retira material producto de la excavación, se comienza con el tendido de subrazante con material de banco (terpetate) compactado al 95% en capas no mayores a 20 cm con la humedad requerida.

Oscar Quecholac Sastre

03/06/2023



Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

NOTA N° 04

FORTA-23-13

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se continúa con el tendido de subrazante con material de banco (terpetate) compactado con la humedad requerida al 95% de su P.U.S.M.

Oscar Quecholac Sastre



Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 05/06/2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 05

FORTA-23-13

Con esta nota se le informa a la supervisión que se realizan trabajos de tendido de subrazante en el último tramo de la Privada Benito Juárez con material de banco (terefate) compactado al 95% P.V.S.M., se realiza la reubicación de poste de telnex con maquinaria.


 Oscar Quecholac Sastre


Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

6/06/2023

Nota N° 06

FORTA-23-13

con esta nota se le informa a la supervisión que se realizan pruebas de laboratorio de subrazante y se libera para colocar base hidráulica de banco, se comienza con el tendido de base hidráulica con material de banco, se realiza la reubicación de poste CFG de baja tensión con maquinaria.


 Oscar Quecholac Sastre


Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

Laborado por:

Recibido por:



Fecha 07/06/2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 07

FORTA-23-13

con esta nota se le informa a la supervisión que se continúa con el tendido de base hidráulica con material de banco con la humedad requerida compactada al 95% de su P.V.S.M.




Oscar Quecholac Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

08/06/2023

Nota N° 08

FORTA-23-13

con esta nota y esta fecha se le informa a la supervisión que se realizará el tendido de base hidráulica con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M., se colocan charolas y se colocan guarniciones de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en los primeros 100 m en ambos lados.


Oscar Quecholac Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 09/06/2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 09

FORTA-23-13

con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se continua con el tendido de base hidráulica compactada al 95% P.V.S.M., se continua con la construcción de guarniciones con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ hasta el cadeneramiento ± 180.00 en ambos lados.



Oscar Quecholac Sastre.




Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

10/06/2023

Nota N° 10

FORTA-23-13

con esta nota y esta fecha se informa a la supervisión que se concluye con el tendido de base hidráulica compactada al 95% P.V.S.M., se coloca el último tramo de guarniciones de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$. y se retira material sobrante del lugar de trabajo, se realiza el riego de emulsion alfaftica y posteriormente se realiza el porco con arena para su protección.



Oscar Quecholac Sastre



Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 12/06/2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 11

FORTA-23-13

con esta nota se le informa a la supervisión que se realizan pruebas de compactación, se libera el tramo para la colocación de Adoqueto,, Se comienza con la colocación de adoqueto asentado sobre cama de arena con una resistencia nominal $FC = 300 \text{ Kg/cm}^2$.



Oscar Quecholac Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

13/06/2023

Nota N° 12

FORTA-23-13

Con esta nota se le informa a la supervisión que se continúa con la colocación de Adoqueto asentado sobre cama de arena con una resistencia nominal de 300 Kg/cm^2 .


Oscar Quecholac Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 14/06/2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 13

FORTA-23-13

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervicion que se continua con la colocacion de adocreto acentado sobre cama de arena con resistencia nominal $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, se realiza la construccion de dentellones de confinamiento con concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.



Oscar Quecholac Sastre




Ing. Rodolfo Sosa Oseda

15/06/2023

Nota N° 14

FORTA-23-13

Con esta nota y esta fecha se le informa a la supervicion que se continua con la colocacion de adocreto acentado sobre cama de arena con resistencia nominal $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, se continua con la construccion de dentellones de confinamiento para el adocreto con concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.



Oscar Quecholac Sastre



Ing. Rodolfo Sosa Oseda

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 16 / 06 / 2023

Folio N° / Anexo N°

Nota N° 15

FORTA - 23 - 13

con esta nota se le informa a la Supervision que se continua con los trabajos de colocacion de adocreto acentado sobre cama de arena con resistencia nominal de $F'C = 300 \text{ kg/cm}^2$, se realiza construccion de dentellones de concreto $F'C = 200 \text{ kg/cm}^2$, se realiza la renovacion de pozos de visita con una altura promedio de 1m. con tabique rojo recocido con mortero 1:3 y relleno fino con mortero 1:2, se realiza el poreo con arena en adoquin


C. Oscar Quecholat Sastre
Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

laborado por:

Recibido por:


Fecha 17/06/2023

Folio N° /Anexo N°

Nota N° 16

FORTA-23-13

con esta nota y con esta fecha se le informa a la Supervision que se realiza la colocacion de adocreto en el ultimo tramo de la calle Benito Juarez, se continua con el purreo con arena en juntas de adocreto, se construyen dentellones de confinamiento con concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.



Oscar Quecholac Sastre



Ing. Rodolfo Sosa Ojeda

19/06/2023

Nota N° 17

FORTA-23-13

con esta nota se informa a la Supervision que se realiza la colocacion de brocales en pozos de visita, se realiza porco con arena en juntas de adocreto, se realiza limpieza general de lugar para realizar los trabajos de pintura, con estos trabajos se concluyen los conceptos acordados en presupuesto y en conformidad de las partes se da cierre a esta Bitacora de obra.



Oscar Quecholac Sastre
laborado por:



Ing. Rodolfo Sosa Ojeda
Recibido por:
