



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-16

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-16, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-23-16, RELATIVA A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON UN IMPORTE DE \$4,160,789.62 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 09:30 HORAS DEL 25 DE JULIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-16

CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 45 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 10:49 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

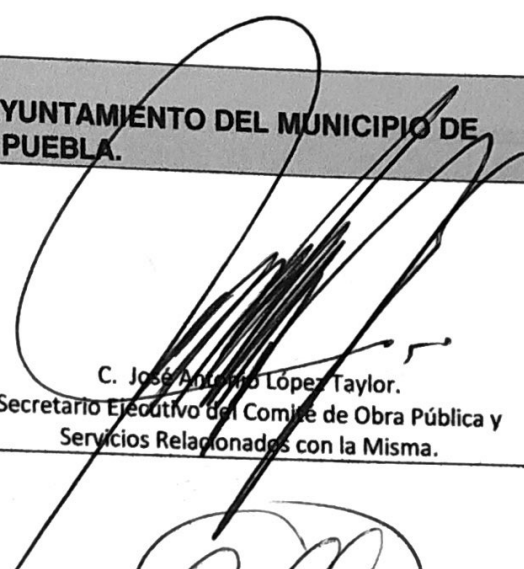
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-16


POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez,
Directora de Obras.


C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.


C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.





H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000501

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-23-16

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. NOE MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES

PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBANOS DE R.L DE C.V
ARQ. VALENTÍN ANÍBAL RAMOS PÉREZ

MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

BITÁCORA DE OBRA

001178

Folio N° /Anexo N°

Fecha

Nombre de la obra: Construcción de la Segunda etapa del complejo cultural, en la localidad de Sanctorum Cuautlancingo, Puebla.

Numero de contrato: FORTA-23-16

Recurso: FORTAMUN 2023

Monto: \$ 4,160,789.62

Contratista: Arq. Miguel Angel Morales Ramirez



Arq. Miguel Angel Morales Ramirez

Contratista



Ing. Liz Airy Olvera Morales

Presidente de Obra

~~Ing. No. Morales Olarte~~

Supervisor de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 26 / Julio / 2023


Folio N° / Anexo N° 1

En esta nota se informa sobre el inicio de la obra denominada: "Construcción de la Segunda etapa del complejo cultural, en la localidad Sanctorum Cuautlancingo, Puebla. realizando el día de hoy los siguientes trabajos:

- Se inicio con el trazo, nivelación y Excavación en la banquetta de 2.00 m * 67.00 m, Al igual que en la explanada realizando la excavación de esta en caja por medios mecanicos.
- En el area de la fachada se comenzo con los trabajos de limpieza, trazo y nivelación del area a trabajar al mismo tiempo la excavación a mano se esta realizando para el desplante de la cimentación.



Ing. Liz Airy Olivera Morales
Presidente de Obra



Ing. Roe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 28 / Julio / 2023

Con esta nota se informa sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto contratado:

Donqueta

- Se completo al 100% el trazo y nivelación del andador así como la excavación del mismo. Se tiene un avance del 70% en el relleno y suministro de material de Donco (tepetate), compactado con pison de mano.

Explanada:

- Se completo al 100% los trabajos de trazo, nivelación y excavación en coja por medios mecanicos, y se tiene un avance del 80% en la compactación del terreno natural por medios mecanicos

Fachada

- Se completo con los trabajos de excavación en cepa y se tiene un avance del 40% en la plantilla apizonada.

Ing Liz Ainy Olivera Morales

Presidente de Obra

Ing. Noel Morales Olarte

Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 31 / Julio / 2023

Folio N° 001189 / Anexo N° 3

esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto

Tratada:

Banqueta

- Se completaron los trabajos de relleno y suministro de material de banco (tepetate) compactado con presión de mano, al igual se informa que se realizó el cimbrado con madera 3ª así como la colocación de la malla.

Explanada

- Se completaron los trabajos de compactación de terreno natural, Se iniciaron con los trabajos de suministro de material de banco (tepetate) para la formación de la capa Subrasante.

Ing. Liz Airy Olivera Morales
Residente de Obra

Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

02 / Agosto / 2023

Folio N° / Anexo N° 4

esta nota se informa a la Superación sobre el
de la obra conforme a los conceptos del

apuesto:

Banqueta

- Se completaron al 100% todos los trabajos en la banqueta realizando el colado del firme con concreto de 150 kg/cm^2 de 12cm de espesor, reforzado con malla 10-10/6-6 incluyendo el acabado con volteador metálico y el acabado rastreado fino, al igual que el corte con cortadora de piso.

Explanada.

- Se completo el suministro y colocación del material para subrasante con un espesor de 20cm, compactado al 95% por medios mecánicos, se comenzo con la construcción del dentellón de concreto 200 kg/cm^2

Fachada

- Se termino los trabajos de compactación en la cimentación y se tiene un avance del 80% en la planilla de Concreto de 100 kg/cm^2 .

Cel
Ing. Liz Airy Olvera Morales
Residente de Obra

~~Ing. Nor Morales Olarte
Supervisor de Obra~~

ado por:

Recibido por:

05 / Agosto / 2023

esta nota se informa a la Supervisión sobre el
que tiene la obra conforme a los conceptos del
contratado.

Exdonada

- Se completo la construcción de dentellón de concreto
 $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con una sección de $15 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$, así
como la colocación y construcción del firme con
concreto premezclado y con resistencia normal
 $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor, incluyendo el
suministro de malla de acero $6 \times 6, - 10/10$. así
como las bases para la red de volibol y las
bases para la estructura para el tablero de
Basketbol.

Escaleras:

- Se completo al 100% el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$
de 10 cm de espesor y la elaboración de acabado estampado
en las huellas de los exalones.

Fachada:

- Se completo al 100% la colocación de la plantilla de concreto de
 5 cm de espesor.

Arq. Olivera Morales
Presidente de Obra

~~Ing. Abc. Morales Olarte~~
Supervisor de Obra

Recibido por:

Recibido por:

07 / Agosto / 2023

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance
tiene la obra conforme a los conceptos del presupuesto.

Tratado:

Explanada:


Se completo al 100% todos los trabajos en la explanada
realizando el corte con cortadora de piso de 5cm
de profundidad, la colocación de la estructura
para los tableros de basketbol y la aplicación
de la pintura de esmalte de 12cm de ancho.

Se comiencen los trabajos de limpieza del terreno
para el area del estacionamiento y del pasillo de acceso
al igual que el afre del talud a mano.

Pachada:

Se tiene un avance del 80% en el habilitado del
acero para la cimentación con un diametro de $3/8"$ y $1/2"$

Cil
Ric Arly Olivera Morales
Presidente de Obra


Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de obra.

Tratado por:

Recibido por:

09 / Agosto / 2023

esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance
de obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Estacionamiento


- Se completo la limpieza de terreno así como la
excavación en caja por medios mecanicos con
motoniveladora, al igual se completo el acarreo
del material sobrante, se iniciaron los trabajos de
compactación del terro natural.

- Se inicio con los trabajos de retiro y reubicación
de la malla ciclónica existente.

Fecha:

- Se completo el colado de los zapatas con concreto
hecho en obra con una resrstencia de 280 Kg/cm^2
y se iniciaron los trabajos de colado de los
dados.


Lic Airy Oliviera Morales
Presidente de Obra


Ing. Rob Morales Olarte
Supervisor de Obra

ado por:

Recibido por:

12 / Agosto / 2023

esta nota se informa a la Superación sobre el
avance de la obra conforme a los conceptos del
supuesto:

Estacionamiento

- Se tiene un avance del 70% en el retiro y

colocación de la malla ciclónica, se completo

la compactación del terreno natural y se inicio

el acarreo de material para la cama drenante

con material triturado. (grava)

Pasillo de acceso

- Se completaron los trabajos de nivelación, excavación y

compactación del terreno natural, al igual se tiene

al día de hoy un avance del 50% en el

suministro de material de banco (tepetate).

Pachoda

- Se completo hasta el día de hoy la construcción de

zapatas, contratabes, y el relleno de material

compactado, se comenzo con la construcción del muro

de block.

Cel

Lic. Aray Olivera Morales

Residente de Obra

Ing. Noe Morales Olarte

Supervisor de Obra.

Recibido por:

Recibido por:

Folio N° / Anexo N° 9

14 / Agosto / 2023

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Estacionamiento

- Se completo al 100 % el retiro y acomodo de la malla ciclónica existente, así como la colocación de la cama drenante con material triturado hasta 1/4" de tamaño (grava)

Pavimento de acceso

- Se tiene un avance del 60% en la construcción del dentellón de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$

Fachada

- Se completo la colocación de muro de block de concreto ligero de $12 \times 20 \times 40 \text{ cm}$ de 12cm de espesor, a nivel de la losa, al igual que los castillos y cadenas intermedias y se iniciaron los trabajos de cimbrado.

Lic. Aray Olivera Morales
Presidente de Obra

Ing. Noé Morales Olarte
Supervisor de Obra

Trabajo por:

Recibido por:

19 / Agosto / 2023


En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance
de la obra conforme a los conceptos del presupuesto.

Se realizó el corte con cortadora de piso a cada 3
metros y de 5cm de profundidad.

Se completo el pretil con muro de block ligero, se
iniciaron los trabajos de ranurado y aplomado en
muros con mortero cemento - arena,

Se realizó los trabajos de relleno de material de
banco compactado para los firmes y la
construcción de los registros de $40 \times 60 \times 80$ cm
de tabique rojo cocido y la colocación de tubo
sanitario de polietileno de alta densidad.

Cel
Lic. Aray Olivera Morales
Residente de Obra


Ing. Msc. Montes Olarte
Supervisor de Obra

Porado por:

Recibido por:

Fecha 23 / Agosto / 2023

Folio N° / Anexo N° 13

En esta nota se informa a la supervisión sobre el avance que
se ha realizado en la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Fachada:

- Se colocó la loseta cerámica al 100%, tipo porcelanato de 60x60cm así como el zócalo, en el área de la caseta y bodega.
- Se completó el aplomado fino en muros a plomo.
- Se tiene un avance del 80% en la colocación del reunto negro, y se inició la colocación del marmol travertino.

Estacionamiento

- Se colocó el pasto incluyendo el suministro de tierra vegetal, así como la colocación de 3 palmeras coco-plumosa, 3 árboles ficus en bola, 7 árboles de laurel de la india, 1 árbol jacaranda, 1 palmera rubelina.

Cil

Ing. Liz Arroyo Olvera Morales

Presidente de Obra

Ing. Noe Morales Olarte

Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 26 / Agosto / 2023

Folio N° / Anexo N° 14

En esta nota informo a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Fecha

- Se completo la colocación de recinto negro y el marmol asentado con mortero cemento - arena
- Se colocó el tinaco rotoplas de 1100 litros, al igual que el w.c y la llave de nariz de 3/4".
- Se iniciaron los trabajos de construcción de las garniciones con concreto f'c = 200 kg/cm²
- Se inicio los trabajos en la aplicación de pintura vinilica en muros y plafones.

Lic. Aray Olivera Morales
Residente de Obra

Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Prado por:

Recibido por:

Fecha 28 / Agosto / 2023

Esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Fachada

- Se completo la aplicación de pintura vinilica en los muros y plafones, incluyendo una mano de sellador y dos manos de pintura, al igual se completo la instalación electrica y colocación de accesorios.
- Se completo la construcción de las guarniciones de concreto de 200 kg/cm^2 de sección trapezoidal, incluyendo el relleno de material de banco (tepetate) el colado del firme con concreto con resistencia normal $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ incluyendo la colocación de la malla de acero $6 \times 6 - 10/10$ y el corte con cortadora de piso.
- Se realizo el suministro y colocación de los registros electricos prefabricados para media tensión

Cid

Lic. Airy Olvera Morales
Residente de Obra


Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Porado por:

Recibido por:

30 Agosto / 2023

En esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Fachada

- Se colocaron las ventanas de cancelería de aluminio anodizado natural al igual que las puertas del mismo material.

- Se comenzó con la colocación del portón con perfil de herrería.

- Se inició con la preparación del terreno para la colocación de la jardinería.

- Se tiene un avance del 80% en los trabajos de alimentación para el transformador.

Ing. Airy Olvera Morales
Residente de Obra

Ing. Roc Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 01 / Sept. / 2023

Folio N° / Anexo N° 17

Con esta nota se informa a la Supervisión sobre el avance de la obra conforme a los conceptos del presupuesto:

Realizada:

- Se completo la colocación del porton con perfil de herrera

Incluyendo: soldadura, aplicación de 2 manos de pintura primaria y 2 manos de pintura esmalte.

- Se completo la instalación para la alimentación del transformador.

- Se completo la colocación del pasto, así como 4 arboles Ficus en bola, 2 palmeras washingtonia.

- Se realice la limpieza final de la obra retirando basura y material sobrante fuera de la obra.

Esta ultima nota se completo al 100% todos los conceptos de Obra: Construcción de la segunda etapa del complejo cultural, en la localidad de Sanctorum Cuautlancingo, Puebla. Por tal razón se presenta la presente bitacora de Obra.

Cel
Lic. Aisy. Olivera Morales
Presidente de Obra

Ing. Noe Morales Olarte
Supervisor de Obra

Elaborado por:

Recibido por:
