

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS**

Licitación No. PART-23-07  
Municipio: Cautlancingo, Puebla.  
Comunidad: San Lorenzo Almecatla.  
Obra: "Pavimentación con adoquín de la Privada Orizaba entre calle Azcatepetzi y calle Orizaba en la localidad de San Lorenzo Almecatla".  
No. Obra: PART-23-07

**ACTA DE FALLO**

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso PART-23-07, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín de la Privada Orizaba entre calle Azcatepetzi y calle Orizaba en la localidad de San Lorenzo Almecatla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 29 de Noviembre de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. PART-23-07, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín de la Privada Orizaba entre calle Azcatepetzi y calle Orizaba en la localidad de San Lorenzo Almecatla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

Dirección de Obras Públicas

para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CONSTRUCTORA TORRES GONZÁLEZ S.A. DE C.V., Representante Legal José Carmen Torres Cuautle quien presentó una propuesta \$ 1,838,306.09 (Un Millón Ochocientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Seis Pesos 09/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

0000437

Dirección de Obras Públicas

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

**EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.

Directora de Obras.

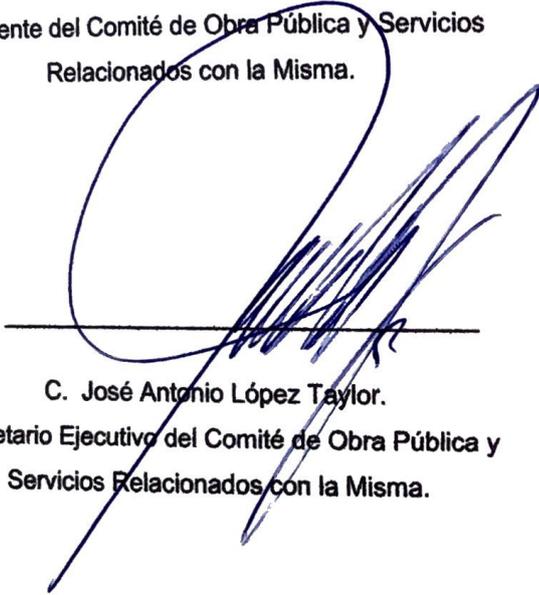


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios  
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tiaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y  
Servicios Relacionados con la Misma.




C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra  
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.  
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.  
Tesorero Municipal.

Vocal 3



C. Gilberto Marcelino Barrios.  
Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas

0000430

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
2	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
3	CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V. Javier Solís Aguilar Representante Legal	
4	RICARDO GALLEGOS ICELO Persona Física con Actividad Empresarial	
5	CONSTRUCTORA TORRES GONZÁLEZ S.A. DE C.V. José Carmen Torres Cuautle Representante Legal	

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° : PART-23-07

OBRA : "PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA ORIZABA ENTRE CALLE AZCATEPETZI Y CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO

OBRA No: PART-23-07

FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

**LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO**

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Daniel Iván Flores Gazca	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V.	Javier Solís Aguilar	
RICARDO GALLEGOS ICELO	Ricardo Gallegos Icelo	
CONSTRUCTORA TORRES GONZÁLEZ S.A. DE C.V.	José Carmen Torres Cuautle	

000000

Fecha

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

TÍTULO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA ORIZABA ENTRE CALLE ESCATEPETZI Y CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMEGATLA.

NÚMERO DE CONTRATO: PART-23-07.

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024.

MONTANTO DE LA OBRA: \$ 1,838,306.09 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 09/100 M.N.)

RECURSO: PARTICIPACIONES 2023

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO PUEBLA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TORRES GONZÁLEZ S.A. DE C.V.

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES A CARGO DE ESTA OBRA:

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO PUEBLA

POR EL CONTRATISTA

C. SANDRA MARÍA TLAQUE GÓMEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





ING. JOSÉ GUAYEN TORRES CUATLE  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ETTY LIDOINE HUERTA VIDAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA




Elaborado por:

Recibido por:

<p>Fecha: 01 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 01</p> <p>EN ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA. SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA 1 PRELIMINARES, EN EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DE LA PRIVADA OLIZADA.</p> <p>                  ING. ETNI LIDOINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>
<p>Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 02</p> <p>EN ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE HAN TERMINADO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN Y SE DA COMIENZO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.</p> <p>                  ING. ETNI LIDOINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>
<p>Fecha: 07 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 03</p> <p>EN ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS Y SE CONTINÚA CON EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS A PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS SUBSECUENTES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.</p> <p>                  ING. ETNI LIDOINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>
<p>Fecha: 09 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 04</p> <p>EN ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CAJA, ACARREOS 1ER KM Y KMS SUBSECUENTES, Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.</p> <p>                  ING. ETNI LIDOINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>

Elaborado por:

Recibido por:

<p>FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 05</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS.</p> <p>                  ING. LIDWINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p>                  AEP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 06</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. POR OTRA PARTE, SE INICIA CON EL RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLÉN), PARA CONFORMAR UNA CAPA DE 16 CM DE ESPESOR.</p> <p>                  ING. LIDWINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p>                  AEP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 07</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLÉN), Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE 20 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO LA EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS, CUBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE <math>f'c = 150 \text{ kg/cm}^2</math> DE <math>15 \times 20 \times 40 \text{ cm}</math>.</p> <p>                  ING. LIDWINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p>                  AEP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023                  NOTA NÚMERO 08</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYE CON EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, ASÍ COMO LA EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS, CUBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE <math>f'c = 150 \text{ kg/cm}^2</math> DE <math>15 \times 20 \times 40 \text{ cm}</math>.</p> <p>                  ING. LIDWINE HUERTA VIDAL                  SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p>                  AEP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>

Elaborado por:

Recibido por:

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2023

NÚMERO 09

PACT-23-07

ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE INICIA CON EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR.



ETNI LIDAINÉ HUERTA VIDAL  
INTEGRALENTENDE DE OBRA



ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

FECHA: 02 DE ENERO DE 2024

NÚMERO 10

PACT-23-07

ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR. POR OTRA PARTE, SE INICIA CON EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 Y EL POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA EMULSIÓN APLICADA.



ETNI LIDAINÉ HUERTA VIDAL  
INTEGRALENTENDE DE OBRA




ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

FECHA: 04 DE ENERO DE 2024

NÚMERO 11

PACT-23-07

ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 Y EL POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA EMULSIÓN APLICADA. SE COMIENZA CON EL SUMINISTRO DE ADOPRETO DE TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 x 27.5 x 8 CM RESISTENCIA DE 300 KG/CM<sup>2</sup>.



ETNI LIDAINÉ HUERTA VIDAL  
INTEGRALENTENDE DE OBRA




ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

FECHA: 08 DE ENERO DE 2024

NÚMERO 12

PACT-23-07

ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE INICIA EL TENDIDO DE LA CAPA DE ARENA, SOBRE LA QUE SE COLOCAN LAS PIEZAS DE ADOPRETO DE TIPO HEXAGONAL, INICIANDO EN EL CADENAMIENTO 0+000.00, HASTA EL CADENAMIENTO 0+060.00



ETNI LIDAINÉ HUERTA VIDAL  
INTEGRALENTENDE DE OBRA



ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA




Elaborado por:

Recibido por:

<p>FECHA: 11 DE ENERO DE 2024 NÚMERO 13</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LA CAMA DE ARENA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE ADOSADO DE TIPO HEXAGONAL, DESDE EL CADENAMIENTO 0+060.00 HASTA EL CADENAMIENTO 0+120.00.</p> <p> ETNEI LIDOINE HUERTA VIDAL SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p> ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>FECHA: 16 DE ENERO DE 2024 NÚMERO 14</p> <p>ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE LA CAMA DE ARENA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE ADOSADO DE TIPO HEXAGONAL, DESDE EL CADENAMIENTO 0+120.00 HASTA EL CADENAMIENTO 0+174.00.</p> <p> ETNEI LIDOINE HUERTA VIDAL SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p> ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>FECHA: 17 DE ENERO DE 2024 NÚMERO 15</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMA DE ARENA Y COLOCACIÓN DE ADOSADO DE TIPO HEXAGONAL POR OTRA PARTE, SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES TRANSVERSALES PARA EL CONFINAMIENTO DE LA LOSA DE CONCRETO SIMPLE <math>FC = 200 \text{ kg/cm}^2</math>, DE SECCIONES <math>15 \times 40 \text{ cm}</math>, Y DE <math>15 \times</math> <math>20 \text{ cm}</math>, CON ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN LAS ARISTAS.</p> <p> ETNEI LIDOINE HUERTA VIDAL SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p> ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>FECHA: 20 DE ENERO DE 2024 NÚMERO 16</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES TRANSVERSALES DE <math>15 \times 40 \text{ cm}</math> Y DE <math>15 \times 20 \text{ cm}</math>. POR OTRA PARTE, SE INICIA CON EL ACABADO Y JUNTEO DEL PISO DE ADOSADO CON ARENA, CONCLUYÉNDOSE CON ESTOS TRABAJOS EL MISMO DÍA.</p> <p> ETNEI LIDOINE HUERTA VIDAL SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>		<p>PART-23-07</p> <p> ARQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

Elaborado por:

Recibido por:

<p>FECHA: 22 DE ENERO DE 2024                  NOTA NÚMERO 17</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE INICIA EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES. POR OTRA PARTE, SE INICIA EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO EN POZOS DE VISTA.</p> <p>                  ETNI LIDIANE HUERTA VIDAL                  INGENIERA EN JEFE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>
<p>FECHA: 24 DE ENERO DE 2024                  NOTA NÚMERO: 18</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOCALES Y TAPAS DE POLIETILENO EN POZOS DE VISTA. CONTINÚA CON EL PINTADO DE LA LÍNEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA DE TRÁNSITO COLOR BLANCO, AL CENTRO DE LA CALLE.</p> <p>                  ETNI LIDIANE HUERTA VIDAL                  INGENIERA EN JEFE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>
<p>FECHA: 26 DE ENERO DE 2024                  NOTA NÚMERO 19</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE PINTADO DE LÍNEA BLANCA DE 10 CM AL CENTRO DE LA CALLE. POR OTRA PARTE, SE INICIA CON EL PINTADO DE RAYAS PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRÁNSITO COLOR AMARILLO, ASÍ COMO FLECHAS DE 3.00 x 0.40 M CON PINTURA TIPO TRÁNSITO COLOR BLANCO.</p> <p>                  ETNI LIDIANE HUERTA VIDAL                  INGENIERA EN JEFE DE OBRA</p>		<p>                  ARP. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ                  SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>PART-23-07</p>
<p>FECHA: 29 DE ENERO DE 2024                  NOTA NÚMERO 20</p> <p>ESTA NOTA Y ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE HAN TERMINADO LOS TRABAJOS DE PINTADO DE RAYAS PARA CRUCE PEATONAL Y FLECHAS. SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA OBRA.</p>		<p>CONTINÚA NOTA EN LA SIGUIENTE PÁGINA</p>	<p>PART-23-07</p>

Elaborado por:

Recibido por:

MINIA NOTA NÚMERO 20

PART-23-07

LO TANTO, SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE HAN QUEDADO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS  
ACIONADOS A LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN CON ACOQUÍN DE LA PRIVADA ORIZABA  
CALLE ASCATEPETE Y CALLE ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA",  
ADA POR EL CONTRATO NO. PART-23-07. CON ESTA FECHA, QUEDA CERRADA LA PRESENTE



LIDIANE HUERTA VIDAL  
INTENDENTE DE OBRA



ADQ. ERICK ZAVALA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

Recibido por:
