

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Licitación No.	FISM-21-10
Municipio:	Cuautlancingo
Comunidad:	Sanctorum
Obra:	"ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENTRE CALLE NUEVA YORK Y FONDO DE LA MISMA."
No. Obra:	FISM-21-10

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

Acta que se formula con motivo del fallo y adjudicación del concurso No. FISM-21-10, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENTRE CALLE NUEVA YORK Y FONDO DE LA MISMA.", ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 12:00 horas, del día 26 de noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No.FISM-21-10, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENTRE CALLE NUEVA YORK Y FONDO DE LA MISMA.", ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----



Dirección de Obras Públicas

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V Representante Legal C. Juan Carlos Flores Cruz, quien presentó una propuesta \$ 358,396.91 (Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Noventa Y Seis Pesos 91/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, sin embargo se ajustara al presupuesto asignado que tiene la Dirección de Obras Públicas por la cantidad de \$ 353,630.35 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Cinco pesos 35/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado I.V.A., estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmara en la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar;; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Prevía lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal suplente, da por concluido este acto siendo las 12:47 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de



Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla 2021 - 2024

000054
000272

Dirección de Obras Públicas

la presente acta. _____

**POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -**

Presidente.

Director de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**

Mra. Sandra María Haddad Gómez.

C. José Antonio López Taylor
Presidente del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**

C. Eva Sánchez Mendel
Comisario Contralor Municipal
Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma



Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla 2021 - 2024

000273

Dirección de Obras Públicas

C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal O Apoderado.	
2	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A. DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal O Apoderado.	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FISM-21-10

OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ABASOLO ENTRE CALLE NUEVA YORK Y FONDO DE LA MISMA."

FECHA : 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBRA N°: FISM-21-10

HORA: 12:00 HRS

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Creciente Construcciones S.A de C.V.	Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
Corporativo y Proyectos Mantra S.A. de C.V.	C.Juan Carlos Flores Cruz Legal Representante	

000065

000275

El día de hoy martes 30 de noviembre
del año en curso siendo las 12.00 A.m damos
apertura a lo presente bitacora de obra con los siguientes
datos

Contrato de obra pública. N° FISM-21-10

Partido Proponente: FISM 2021

Contratista: Corporativo y Proyectos Martín S.A. de C.V.

C. Juan Carlos Flores Cruz

Representante legal

R.F.C. CPM180831FVW4

Nombre de la obra: "Abastecimiento de lo privado
Abaslos entre Calle Nueva York y fondo de la misma.
Localidad: Sanctorum.

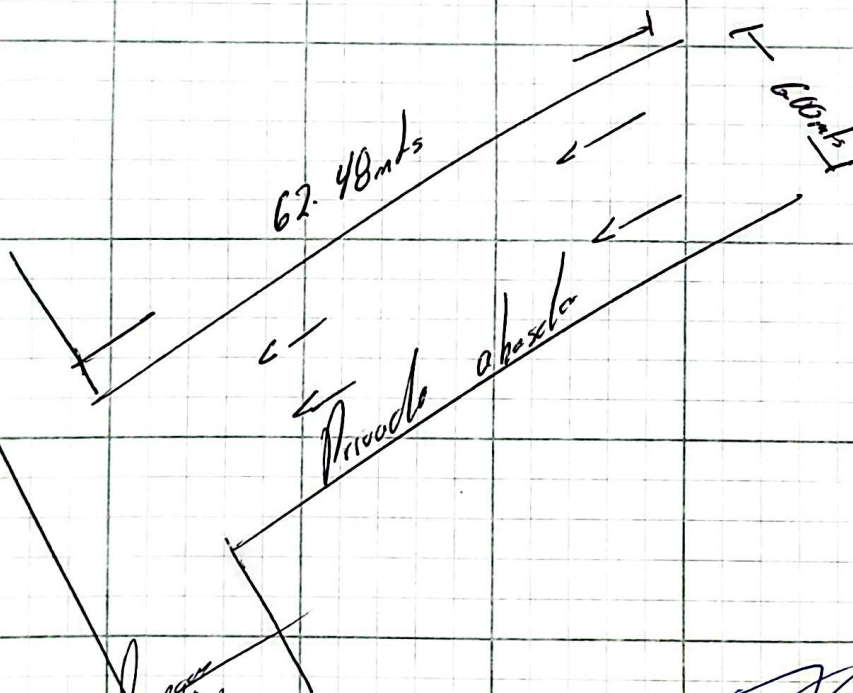
Numero de la obra. Fism-21-10

Monto de la obra: \$ 353,630.35.

Presidente de la obra Oscar Domínguez Castillo.

Registrado en Cédula Profesional N.º 7238031 por obra
de construcción a la esposa de obra por parte del
avistamiento de Coahuila de Oscar Quechela-Sastre.

El día de hoy 30 de Noviembre del 2020 nos reunimos en la obra Abocamiento de la calle obusta entre calle Nueva Verde y fondo de la misma lo que es gente de la empresa y gente del Ayuntamiento de Coahuilpan de Zaragoza. Para hacer algunos puntos de la obra de huminade una vez habido un acuerdo con los trabajos de huminados en el centro de los nos fundo el Ayuntamiento empezamos con el trazado y medición de lo privado abosta lo cual cuenta con 62.48m de largo por 600mts de ancho de huminamos los trazo con cal y taches de lo particular.




Oscar Domínguez Castillo
Presidente de la obra

Oscar Abelardo Sashin
Supervisor

000187

El día de hoy, Viernes 3 de Diciembre del 2021
 Seguimos con los trabajos determinados en este día vamos
 a iniciar con el trazo y replatación de las guarniciones
 de ambos lados de la calle lo cual tiene 40cm de
 alto una vez terminado los datos iniciamos con la
 colocación para la colocación de charolas, una vez
 terminado los fundamentos de las guarniciones terminamos la
 visita del laboratorio determinado por el asentamiento
 de Coahuila por corroborar la resistencia del concreto.
 una vez habiendo las pruebas necesarias y siendo aprobada
 por el laboratorio empezamos a hacer el concreto en
 las charolas y al mismo tiempo metiendo el hierro


 Oscar Domínguez Castille
 Presidente


 Oscar Pocchilac Sash
 Supervisor


El día de hoy lunes 6 de diciembre del 2021
Continuamos con los trabajos y seguimos con los trabajos
de excavación de material sobrante para posteriormente
compactar en 25k, caso vayas hacer en corte -28cm
aproximadamente. Para ello ocuparemos la maquinaria
dicho excavador y el camión para sacar el material
sobrante y, por otro lado, empezamos hacia los trabajos
del quibote de charolas que cubren los quinqueones
y el cerado de las mismas, por otro lado, tenemos
la visita del Squisa de la obra para revisar
los datos (trabajos)



Oscar Domínguez
Presidente

Castillo



Oscar Acuña
Supervisor

El día de hoy 8 de diciembre del 2021 Segundo
 En los trabajos también recordando los trabajos
 del día martes, con el seguimiento de evacuación de
 material sobre el último tramo de 0+40 al 0+62.19
 Para ello seguimos ocupando la Pire escalerada
 el control y la maquinaria para empezar o disminuir
 la niveles de pendiente que están determinados por el
 Proyecto, para ello también hicimos la llamada al
 laboratorio para el día viernes para el nivel de
 compactación, una vez sacado todo el material se habrá
 empezamos con la compactación de tercio natural con
 la maquinaria visto compactador en todo lo ancho de
 terreno.


 Oscar Deminguez Castillo
 Presidente



 Oscar Ochoa Sanchez
 Supervisor


El día de hoy 10 de diciembre del 2021 seguimos
con los trabajos de compactación también continuó los
trabajos del día, luego, para ello más tarde
fuimos, la visita de la obra que determinó el
ajustamiento de compactación para cerrar las
de las de compactación de terreno natural para
ello hicieron los datos y pruebas necesarias y
de un resultado de 92% una vez donde se
está de listo y lo operaron por lo que según con
los trabajos, para ello fuimos la visita de
sistema operado para lo cepa de algunas
terreno de compactación. Por eso, desde ahí determinamos
que fuimos la visita de supervisar.


Oscar Dominguez Castillo
Presidente


Oscar Quechua Sastre
Supervisor

El día lunes 13 de diciembre del 2021 seguimos con los trabajos correspondientes conllevando los trabajos del día sábado, lo que es el tendido de base hidráulica, se va firmando con un espesor de 15cm para este último quedando la mezcla niveladora para hacer el empujamiento, también se le mandaron que formen la visita del supervisor para cerciorarse que sea la base que marca en el expediente una vez concluido los datos segun con los trabajos, una vez firmando el tendido vamos compactando con el vibracompactor e de igual manera haciendo la base se va pasando unas veces para lograr la compactación adecuada.



Oscar Domínguez Castib
Presidente


Oscar Quechua Sacha
Supervisor

000192

El día de hoy Miércoles, 15 de diciembre del 2021
vamos a iniciar con los trabajos de impermeabilización
Sin antes, menciono, que ayer martes, fuimos
la casa del lapidario para analizar los niveles
de compactación una vez aprobado, iniciamos con lo
antes mencionado, una vez terminado lo impermeabilizaron
vamos a traer la arena para que posteriormente
terciemos el adobe para ello vamos a traer
5 cm de arena, el día de hoy tenemos lo
visita del Segrasa por parte del municipio para
verificar los datos.



Oscar Demiguez Castillo
Presidente


Oscar Quintero Sastre
Supervisor

000335

El día de hoy 17 de diciembre del 2021
Continuamos con los trabajos de colocación de
adidas sin antes medir los trabajos del
día de ayer para que no quede de la colocación
y la renovación de piso de casa que son
2 una en la parte final de la calle el otro
en el fondo que se le van a colocar también brega
y tapa. Continuando el día de hoy es la
colocación del mismo para este serenos la visita
del supervisor por parte del ayuntamiento.
Para corroborar los datos (trabajos) correctamente.



Oscar Dominguez Castillo
Presidente


Oscar Quechua Soria
Supervisor

000194

000396


El día de hoy lunes 20 de diciembre del 2021
continuamos con los trabajos sin antes mencionar
que el día sábado continuamos con los trabajos de
la colocación de adoquines y hoy en la misma
trabajamos con el muestreo de los adoquines en la
colocación del mismo para pasar a la siguiente
trabajo que será el inicio de construcción de
drenajes, para ello vamos haciendo los
trabajos con la mayor calidad y la ejecución
rápida para lograr la metas correspondientes.


Oscar Dominguez Quichilac
Presidente


Oscar Quichilac Sash
Supervisor

El día de hoy miércoles, 22 de diciembre del 2021 seguimos con los trabajos sin otras novedades que el día de ayer, más acabamos con la colocación de ductos, la colocación de tapos y recado de los pozos de agua, con breca y tapa el día de hoy estamos en la limpieza de la pmoada ahogada, para posteriormente el día de mañana comenzar en los trabajos de pintura para el día de hoy tenemos la casa del supervisor para hacer el recado de los trabajos realizados hasta el día de hoy para ello cada mañana que los trabajos se van haciendo de manera correcta para lograr los metas.


Oscar Dominguez Carillo
Presidente



Oscar Acuña Sain
Supervisor

000196

000333

También el día de hoy 22 de diciembre del 2021 a las 12:00 P.M. concluimos los trabajos los cuales fueron personal del departamento de Cuautlanango, para concluir los datos (Trabajos los cuales una vez concluido y concluida damos por concluido la obra, la cual están al frente de la presente bitácora de la calle, (Puede estar en la calle una vez y todo de la misma


Oscar Domínguez Castilleja
Procurador


Oscar Acosta Sánchez
Supervisor
