

~~000231~~

Dirección de Obras Públicas

000223

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. FORTA-21-27
Municipio: Cuatlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuatlancingo
Obra: "Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en calle los Pinos entre calle Torrecillas y calle de los Alamos."
No. Obra: FORTA-21-27

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-21-27, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en calle los Pinos entre calle Torrecillas y calle de los Alamos", ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, del municipio de Cuatlancingo, Puebla. _____

En el Municipio de Cuatlancingo, Puebla, siendo las 11:30 horas, del día 22 de Noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-21-27, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en calle los Pinos entre calle Torrecillas y calle de los Alamos." ubicada en la localidad de San Juan Cuatlancingo, municipio de Cuatlancingo, Puebla. _____

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

000224

Dirección de Obras Públicas

000232

concurso, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Creciente Construcciones S.A de C.V.** Representante Legal Ing. Daniel Iván Flores Gazca, quien presentó una propuesta \$ 1,654,270.79 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta Pesos 79/100 MN), considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar la C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 11:58 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

000225

Dirección de Obras Públicas

000233

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.



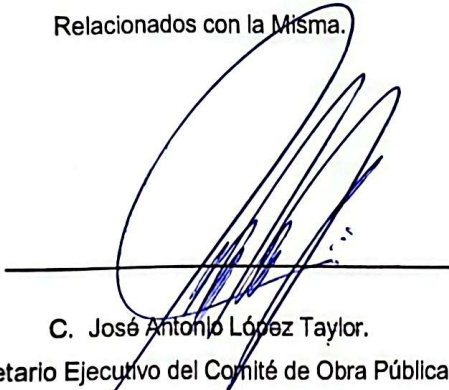
C. Filomeno Samiento Torres.
**Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.**

Directora de Obras




**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**

Mtra. Sandra María Tlacuahuatl



C. José Antonio López Taylor.
**Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.**




C. Eva Sánchez Mendileta.
**Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.**

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

000226

Dirección de Obras Públicas



~~000234~~

Vocal 3.



C. Gilberto Marcellino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Creciente Construcciones S.A de C.V. Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal o Apoderado	
2	Mantra Corporativos y Proyectos S.A. de C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal o Apoderado	
3	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
4	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
5	Héctor Alejandro Iglesias Persona Física con Actividad Empresarial.	



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-21-27

OBRA: "Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en calle los Pinos entre calle Torrecillas y calle de los Alamos."

OBRA No: FORTA-21-27

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA: 11:30 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA A LA ACTA DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Creciente Construcciones S.A de C.V.	Ing. Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
MANTRA CORPORATIVOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	C. JUAN CARLOS FLORES CRUZ REPRESENTANTE LEGAL	
C. Verónica Pérez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial.	
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	C. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
C. Héctor Alejandro Iglesias	Persona Física con Actividad Empresarial.	

000227

000235

Fecha 24/11/2021

Folio N°

Anexo 33

Siendo las 12.00 P.m del día 24 de
Noviembre del 2021 se hace apertura de la
presente bitácora de obra de los siguientes trabajos

Datado Presupuesto: Fecha 21-27

Contratista: Creciente Construcciones S.A de C.V.

Ing Daniel Juan Flores Garza,

Representante legal

R.F.C. CCO150731G36

Nombre de la obra: "Rehabilitación de Alcantarillado

Santano en la calle las pinas entre calle

Torrealta y calle Alamos

Localidad: San Juan Cautlanango

Moneda de obra: Fecha -21-27

Monte de la obra 1,654,270.79

Regrande de obra por parte del Ayuntamiento
de Cautlanango al Sr. Ing. Oscar Quezada Soto



CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700


Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 24/11/2021

Folio N° 1 / Anexo N°

En este día Miércoles 24 de Noviembre de 2021, estando presentes los responsables de la obra "Rehabilitación de alcantarillado Sanitario en calle los Pinos, calle Lencullas y calle de los alamos" se iniciaron los trabajos de limpieza y hazo en el área de trabajo revisando los planos topográficos para poder iniciar los trabajos de excavación, del mismo modo se le informa al departamento de obras públicas para cohesionar los datos referente al expediente.


Oscar Quacholac Sosa
Supervisor


Ing. Daniel Juan Flores
Presidente del Comité de Vigilancia



CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

REC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 26/11/2021

Folio N° 2 / Anexo N°


000340

En este día Viernes 26 de noviembre del 2021
Se continuaron los trabajos de excavación del
excavamiento 0+000 al 0+050 del mismo
modo la gente viene ahondando la planilla y
chicando nichos para posteriormente armar
y compactar en capas de 20 cm. y lograr la
compactación requeriendo para posteriormente
colocar el tubo de polietileno corrugado de 24"
debido a que el furo no se alcanza una vez
colocado el tubo se rellena con material procedente
de la excavación en capas de 20 cm.

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AMPROLONGACIÓN
XICOTENCATLLOTE 1
COL. CENTRO,
CIUDAD DE GUAYMAS,
PUE. C.P. 72700


Oscar Quachilac
Supervisor


Juan Flores
Representante legal

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 29/11/2017

Folio N° 3 / Anexo N°

En este día 29 de Noviembre del 2017, se continúan los trabajos de reparación del maderame de 07050 al 08120 contando los trabajos realizados el día Sábado y el día de hoy así mismo, los trabajadores utilizan la plumbeta con material producto de la excavación para posteriormente colocar el tubo de plumbeta de 24" para posteriormente rellenar con material producto de la excavación en capas de 20 cm.

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36



AV. EXTENSION
XICOTENCA LOTE 1
COL. CENTRO
CUAUTLANCINGO,
PUE. CP 72700

[Signature]
Grecia Crechilac Sash
Supervisor

[Signature]
Ing. Daniel Juan Flores Garza
Representante Legal

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 11/12/2021

Folio N° 4 / Anexo N°
000342


El día de hoy Miércoles 7 de diciembre del 2021
Se continuaron los trabajos de excavación del cadáver
07:120 al 07:300 cubriendo los trabajos del
día martes y el día de hoy así mismo
los trabajadores van a levantar la planilla
con material producido de la excavación para
posteriormente colocar el tubo de polietileno
de 24" pulgadas para posteriormente rellenar en
capas de 20 cm e ir compactando, también se
previene que hoy termine la visita del sistema
operada del uso público para que ellos realicen
la cancelación de las descargas de la zona
demarcada

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
CHIA TLANGINGO,
PUE. C.P. 72700


Oscar Quichua Sachi
Supervisor


Juan Flores G.
Representante legal

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 11/12/2021

Folio N° 4 / Anexo N°
000342

El día de hoy Miércoles 4 de diciembre del 2021
Se continuaron los trabajos de excavación del cabecera
07:120 al 07:300 cubriendo los trabajos del
día martes y al día de hoy con mismo
los trabajadores van a grande la plaza
con material producido de la excavación para
así finalmente colocar el tubo de plásticos
de 24" pulgadas para posteriormente rellenar en
capas de 20cm e ir compactando, también se
protegerá que hoy también se usó el sistema
opuesto del uso posible para que ellos realicen
la construcción de las descargas de la zona
dominante

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36



AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
CHAU TLANGINGO,
PUE. C.P. 72700

[Signature]
Oscar Quintero Sosa
Supervisor

[Signature]
Ing. Daniel Juan Flores G.
Representante legal

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 31/12/2021

Folio N° 5 / Anexo N°

000343

El día de hoy Viernes 3 de Diciembre del 2021
 Se continuaron los trabajos de excavación del
 cadávermente 0x300x01500 cubriendo los trabajos
 del día jueves y el día de hoy así mismo
 los trabajadores van abriendo la planilla
 con material producido de la excavación para
 posteriormente colocar el tubo de perforación de
 24" para posteriormente sellar en capas de
 20cm e ir compactando, del mismo modo
 se van haciendo la excavación de los pozos
 de visita para posteriormente hacer la planilla
 de concreto FC-2150, también se han hecho
 las conexiones de las desechos de las pruebas
 con tubo de 18"

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATLLOTE
COL. CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700



[Signature]
 Oscar Quiche Sosa
 Supervisor

[Signature]
 Ing. Daniel Leon May, Gaa
 Francisco / 2021

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 6 / 12 / 2021


Folio N° 6 / Anexo N°

000344

El día de hoy lunes 6 de diciembre del 2021 se continuaron los trabajos de excavaciones del cadeneramento otsoo alotsoo centando los trabajos del día sábado y el día de hoy a su mismo los trabajadores continúan con los trabajos previos los cuales nos damos cuenta de un punto de donde amado lo cual tenemos que demostrar por que va a pasar el tubo de polietileno de 2" la cual fue un poco complicado pero al final logramos hacer una buena excavación por lo tanto seguimos ahondando la planilla para la colocación del tubo una vez colocado fueron haciendo capas de 20cm para hacer la compactación, este día fuimos la visita de laboratorio para hacer nuestro mt. compactación la cual en el día anterior salio de resultado un 92% de compactación de igual manera seguimos haciendo la visita del sistema operado del agua potable pero las cosas demoramos.

Oscar Quecholas Soto

Supervisor

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO
GUADALUPE, PUE.
C.P. 72700Ing. Daniel Juan
Representante legal

Elaborado por:


Recibido por:


Fecha 8/12/2021

Folio N° 7 / Anexo N°

000345

El día de hoy lunes 8 de diciembre del 2021 se continúan haciendo los trabajos de excavación y colocación de ducto del mejoramiento 04689 al 04689.95 continuando los trabajos del diámetro así mismo los trabajos continúan correspondiente de la colocación de ducto para ello mandamos a la empresa hacer una bocaneta que se está construyendo en el proyecto, los gastos los abrimos para ello hacemos los procedimientos correspondientes de abrimos en la planilla, colocación de ducto de 24" de polietileno y rellenar en capas de 20cm de igual manera se viene haciendo la excavación para el proceso de los pozos de visita, que consta de una planilla de concreto.


Oscar Archibac Segura
Supervisor


Ing. Daniel Juan Flores Encina
Representante legal



CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
RFC: CCO150731G36
AV. PROLONGACIÓN
NICOTENCA LOTE 1
COL. CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700

Elaborado por:


Recibido por:


Fecha 10 / 12 / 2021

Folio N° 2 / Anexo N°

000346

El día de hoy viernes 10 de diciembre del 2021
Se continúan con los trabajos correspondientes de
la construcción de para de visita los cuales
consiste de un plantel de concreto, después la
colocación de daban res como para posteriormente
rebetones para cubrir con concreto y tapa se
va haciendo con el primer constructo mencionado
cada uno de los mismos para ello también
tenemos la ayuda del laboratorio y del sistema
apoyado del agua potable para sus trabajos
correspondientes


Oscar Quetzilac Sastre
Supervisor


Ing. Manuel Leon Flores Garza
Representante legal

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACION
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
CUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 11/12/2021

Folio N° 9 / Anexo N°


000347


El día de hoy Sábado 11 de diciembre del 2021 se continuó con los trabajos pendientes de ser en la limpieza en el área de trabajo y algunos detalles de los pases de visita, entre ellos se hicieron algunas correcciones y ajustes de material sobrante para tener todo en orden y listo de entregar.

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICOTENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
QUAUTLANCINGO,
PUE. C.P. 72700




Oscar A. Echeluc
Supervisor


Ing. David Juan Flores Garza
Representante Legal

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 13 / 12 / 2021


Folio N° 10 / Anexo N°

000343

El día de hoy 13 de Diciembre del 2021
Siendo las 12:00 P.M. estando presentes, los
representantes del asentamiento de Coatlangua,
la Empresa que hace la cuenta de los
trabajos realizados en el tiempo transcurrido
para constancia que todo se está realizando
de manera correcta en tiempo y forma dando
el visto bueno que todo se realiza de forma
correcta por lo que no hay observaciones alguna
por lo cual se cierra la presente bitácora
de obra, firmando de conformidad los
presentes

CRECIENTE
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

RFC: CCO150731G36

AV. PROLONGACIÓN
XICITENCATL LOTE 1
COL. CENTRO,
CUATLANCINGO,
PUE. C.P. 72700
Oscar Quetzilce Sabin
Day Damián Juan Pérez García
Representante legal

Elaborado por:

Recibido por:
