



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PROYECTO EJECUTIVO

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (NIT-SICT)

“ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA
SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A
TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO,
EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.”



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (NIT-SICT)

EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA **NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE NIT-SICT** PARA LA OBRA DENOMINADA: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA." LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA." Y QUE PODRÁN CONSULTARSE EN EL SIGUIENTE LINK


NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



Libros de la Normativa para la Infraestructura del Transporte NIT-SICT

INT Introducción	LEG Legislación	PRY Proyecto	CTR Construcción	CSV Conservación
OPR Operación	CAL Control y Aseguramiento de Calidad	CMT Características de los Materiales	EIP Características de los Equipos y Sistemas de Instalación Permanente	MMP Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales

<https://normas.imt.mx/inicio>



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

MEMORIA DESCRIPTIVA

.JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA.

.DESCRIPCIÓN GENERAL Y
COMPONENTES DE LA OBRA.

.DATOS SOCIOECONÓMICOS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA

De acuerdo con el artículo 115 sección III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ayuntamiento tiene el compromiso de dotar de servicios públicos al municipio, sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, conforme lo dispuesto por las leyes federales y estatales, de acuerdo con sus posibilidades financieras.

Conforme a lo expuesto me permito informarle a usted de la obra denominada:

**ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO
CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.**

**ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE
SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.**

Que se realizara en: SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA. Y PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

El desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la condición o el estado de la infraestructura general de los sistemas carreteros, de infraestructura urbana y pública de tipo municipal. Las distintas regiones crecen tanto en el ámbito cultural, social y económico en la medida que los factores mencionados anteriormente se desarrollan a la par que el crecimiento de la población y de la necesidad de servicios.

La realización de los proyectos para dicha obra se justifica porque presenta alta necesidad de atención, ya que, en época de lluvia, se presentan varios encharcamientos, así como la falta de rampas y banquetas que ayuden a circular de una mejor manera a los peatones. Además, el disponer de servicios adecuados para reducir los índices de rezago de infraestructura básica en el municipio. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, el paso vehicular, cuenta con el área necesaria para el dimensionamiento geométrico apropiado. Y con ello tener un tránsito seguro vehicular, así como también se reduce la contaminación por el polvo que provocan los vehículos al transitar en esta vialidad.

Por lo tanto, en base a lo anterior concluimos que es factible y necesario llevar a cabo el presente proyecto, ya que tanto las autoridades municipales y los mismos beneficiarios, están en la mejor disposición para hacer realidad dicha obra.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 15 DE OCTUBRE DE 2024
"TRADICIÓN Y FUTURO"

DE
INFRAESTRUCTURA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE LA OBRA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

CONTENIDO:

GENERALIDADES SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA.....	2
GENERALIDADES PRIVADA MUNICH	2
DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	2
OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	2
COMPONENTES DEL PROYECTO	3

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

GENERALIDADES SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA

La obra se ubica en la SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA., y en PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

GENERALIDADES PRIVADA MUNICH

La obra se ubica en la PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas.

Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas.

Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlillantzincó ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la condición o el estado de la infraestructura general de los sistemas carreteros, de infraestructura urbana y pública de tipo municipal. Las distintas regiones crecen tanto en el ámbito cultural, social y económico en la



medida que los factores mencionados anteriormente se desarrollan a la par que el crecimiento de la población y de la necesidad de servicios.

Tomando en consideración los datos demográficos en donde se dan a conocer indicadores de población para el municipio de CUAUTLANCINGO y de acuerdo al censo del INEGI y avalados por el CONEVAL, se tiene una población total al año 2020 de 18,303 habitantes en la localidad de San Juan Cuautlancingo, y 35,083 habitantes en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla, con esta información podemos conocer un panorama general de la importancia del Municipio y sus expectativas de crecimiento.

Contribuir con el crecimiento en infraestructura, servicios en la ciudad y una mejor imagen en cuanto a la construcción de las vialidades en el municipio, así como el mejoramiento de las vialidades que se encuentran con deterioro por el tiempo que se tienen de construidas.

La realización de la presente obra ayudara en el mejoramiento de las relaciones sociopolíticas entre las colonias y los diferentes niveles de gobierno.

COMPONENTES DEL PROYECTO

A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

- 1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
 - Planos de Planta, perfil y secciones.
- 1.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS
 - Informe
- 1.4 PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
 - Planta geométrica.
- 1.5 PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA
 - Planta de señalamiento.
- 1.6 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA OBTENCIÓN DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)
 - Cédula de información básica.
 - Croquis de macro y micro localización del proyecto.
 - Reporte fotográfico del estado actual.
 - Justificación, descripción y objetivos de la obra
 - Estudios complementarios (geotecnia)
 - Croquis de banco de tiro.
 - Especificaciones generales sct.
 - Especificaciones técnicas particulares.
 - Procedimiento constructivo.
 - Memoria descriptiva.
 - Tarjeta de precios unitarios.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

- Catálogo de conceptos.
- Calendario de ejecución de obra.
- Generadores de obra por partidas.
- Presupuesto base.
- Resumen de presupuesto.
- Nota técnica.

B PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

- 1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
 - Planos de Planta, perfil y secciones.
- 1.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS
 - Informe
- 1.4 PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
 - Planta geométrica.
- 1.5 PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA
 - Planta de señalamiento.
- 1.6 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA OBTENCIÓN DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)
 - Cédula de información básica.
 - Croquis de macro y micro localización del proyecto.
 - Reporte fotográfico del estado actual.
 - Justificación, descripción y objetivos de la obra
 - Estudios complementarios (geotecnia)
 - Croquis de banco de tiro.
 - Especificaciones generales sct.
 - Especificaciones técnicas particulares.
 - Procedimiento constructivo.
 - Memoria descriptiva.
 - Tarjeta de precios unitarios.
 - Catálogo de conceptos.
 - Calendario de ejecución de obra.
 - Generadores de obra por partidas.
 - Presupuesto base.
 - Resumen de presupuesto.
 - Nota técnica.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.



CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAUTLAN	2
TOPONIMIA:	2
ESCUDO:	2
HISTORIA:	2
CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS	3
UBICACIÓN:	3
EXTENSIÓN:	3
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA:	3
RELIGIÓN:	4
OROGRAFÍA:	4
HIDROGRAFÍA Y CLIMA:	4
ECONOMÍA:	4
MONUMENTOS:	5
OBRAS DE ARTE:	5
INFRAESTRUCTURA:	5
CULTURA:	6
FIESTAS	6
GOBIERNO	7
PERSONAJES ILUSTRES	7
DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	8
DEMOGRAFÍA Y SOCIAL	8
ECONÓMICO	13
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE	18
GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	23

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas.

Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles, motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas.

Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatliltzincó ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

TOPONIMIA:

El nombre se origina de las raíces nahuas "cuauhtli", bosque; "tzi", pequeño, y "co", en; lo que significa en conjunto "En el pequeño bosque", o Cuatli-tian-zingo significa "águila que se posa para tomar agua" Su topónimo está escrito de la siguiente forma:

Cuautli, bosque, está representado por un árbol.

Tian, para indicar en o entre: representado por los dientes (tentli).

Tzincó: denotado por la parte inferior de un cuerpo humano en posición sentada, asentamiento.

ESCUDO:

Escudo del municipio de Cuautlancingo (Puebla, México), de acuerdo con la cédula que entregó el rey de España por petición de Maxixcatzin, noble tlaxcalteca.

HISTORIA:

La fecha exacta de la fundación no se conoce debido a que las pinturas indígenas fueron destruidas. Las referencias más recientes contradicen lo que hace años habían aseverado la antropóloga mexicana, Margarita Nolasco Armas y el austriaco-americano Adolf Bandelier. De tal manera que este pueblo ya existía desde cientos de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Lo anterior se corrobora gracias al Códice de Cuautlancingo documento en el cual se narra el encuentro de los caciques locales y los peninsulares ibéricos. Además, dicho documento testimonia la ayuda prestada a los españoles,



motivo por el cual les fue entregado un escudo de armas y tierras para que puedan cultivarlas. Esto hizo pensar a Nolasco y Bandelier que Cuautlancingo había sido fundado después de la conquista (llevada a cabo por los mismos indígenas, y no una conquista europea como suele pensarse); por tanto, habían sido expulsados de la ciudad de Cholula y fundaron una nueva comunidad con otros nobles tlaxcaltecas. Hoy sabemos, que la existencia de Huautlillatlilantzinco ya existía antes de la llegada de los Toltecas-Chichimecas a la región central (1100 aprox.)

Durante la época colonial el antiguo altepetl fue llamado república de indios y tenía cierta independencia política de las autoridades españolas. Además, tenían conflictos por los recursos naturales con algunos pueblos vecinos.

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

1589: El 3 de julio se le otorgó su escudo de armas.

1895: Se convierte en municipio libre.

2017: Un dato relevante es que el 24 de junio se devolvió al pueblo de Cuautlancingo, mediante sesión solemne del H. Cabildo, una copia facsimilar de la Cédula Real y el Plano del Fundo legal.

Estos documentos estaban en poder del particular Salvador Díaz Pineda, quien por más de 10 años intentó infructuosamente devolverlos. No fue hasta la administración del presidente municipal Félix Casiano Tlaque quien se interesó en generar las condiciones de repatriación de tan importante legado para la población, toda vez que no se contaba con los originales que desaparecieron del archivo de Indias, del Archivo general de la Nación y del Municipio.

UBICACIÓN:

Cuautlancingo se localiza en el centro oeste de Puebla, entre las coordenadas 19° 04'54 y 19° 09'36 de latitud norte y 98° 13'18 y 98° 17'36 de longitud oeste a una altura promedio de 2140 metros sobre el nivel del mar.

El municipio colinda al norte con el estado de Tlaxcala; al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Puebla; al sur con el municipio de San Pedro Cholula y con el municipio de Puebla y al oeste con el municipio de Coronango.

EXTENSIÓN:

Tiene una superficie de 33,17 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 191 con respecto a los demás municipios del estado.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA:

En 1995 el municipio contó con 39.514 habitantes, de los cuales son 19.441 hombres y 20.073 mujeres, representando el 0,82 % de la población total del estado. Tiene una densidad de población de 1.156 habitantes por kilómetro cuadrado; teniendo una tasa de crecimiento anual de 4,57 %; se estima que para el año 2000 la población del municipio sea de 48.480 habitantes; calculándose una densidad de población de 1.462 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tiene una tasa de natalidad de 25,3 %; una tasa de mortalidad de 1,8 % y una tasa de mortalidad infantil de 15,6 %.



Con respecto a marginación el municipio tiene un índice de -1,265; esto quiere decir que su grado de marginación es baja, por lo que ocupa el lugar 213 con respecto a los municipios del estado.

De acuerdo a los resultados que presenta el II Censo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 55.456 habitantes.

RELIGIÓN:

Iglesia

Esta parroquia se construyó con el propósito de reafirmar nuestra religión católica nuestra iglesia finalizó su construcción el 22 de agosto de 1522 la primera misa fue realizada el 22 de agosto de 1922 decir cuatro años después de su creación no te quiero decir mantiene aspectos representativos medievales y barcos eso es en este iglesia muy linda y peculiar horario de nuestras misas lunes a viernes de nueve A.M. a siete P.M.

OROGRAFÍA:

La mayor parte de su superficie es plana, ya que forma parte de la altiplanicie poblana. Posee ligeros descensos, pero no tan remarcados. Sus elevaciones son los cerros: Ayo, Gordo, meseta de Los Altos y cerro de Jaquetas: Existen valles en los planos de Bombela y Sauz de Cajigal. Posee una superficie de 33,17 km², lo que lo posiciona en la 191ª posición con respecto al resto de los municipios poblanos. El territorio está conformado por terrenos que pertenecen al período cuaternario. El suelo se compone generalmente de 3 grupos de suelo: Regosol, el cual se presenta en casi todo el territorio; Feozem, se ubica en algunas regiones del municipio; y Vertisol, se encuentra hacia al oeste y norte del municipio.

HIDROGRAFÍA Y CLIMA:

El municipio se ubica en la cuenca alta del río Atoyac, el cual es el principal río del municipio; pasando el río se continua el municipio teniendo como colindantes la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras poniendo como límites justamente detrás del fraccionamiento Covadonga donde los terrenos son perpendiculares contra los terrenos de San Jerónimo Caleras estando dentro de este territorio (Nestlé, Fraccionamiento Industrial Aragón, entre otros) cruzando por las vías del ferrocarril se encuentra la Colonia Guadalupe del Oro colindando con San Cristóbal Tulcingo. El río Prieto recorre una pequeña parte del extremo suroeste del municipio. Cuenta con varios arroyos de menos afluencia y algunas presas de poca proporción.

El clima es templado subhúmedo, gracias a que el municipio se encuentra dentro del Valle de Puebla, posee un solo un clima. Las lluvias son en verano, con invierno seco, y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 15 °C.

ECONOMÍA:

Se cultivan manzanos en el municipio.

El municipio cuenta con 15.853 personas que se encuentran económicamente activas, de las cuales, el 6,7% de los habitantes se dedica al sector primario, el 57,3% al sector secundario, el 32,4% al sector terciario y el resto no se especifica 4 Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería, minería, industria, comercio, servicios y transporte.

Agricultura: se cultiva maíz, frijol y alfalfa; así como tejocote, ciruela, manzana y capulín.

Ganadería: se cría ganado bovino, porcino, caprino, ovino y equino.



Industria: Gracias a la cercanía con la ciudad de Puebla, Cuautlancingo cuenta con varias industrias, entre la que destaca la planta armadora de autos Volkswagen. Además, cuenta con otras industrias que procesan productos químicos, equipo médico, materiales para la construcción, textiles, fibras, maquiladoras de muebles, entre otras.

Comercio: cuenta con tiendas de abarrotes. Predomina la holaprimera necesidad y los comercios mixtos que venden artículos diversos.

Servicios: se prestan servicios profesionales, técnicos, turísticos, personales y de mantenimiento.

Minería: Cuenta con yacimientos de piedra caliza, arcilla, sílice y yeso.

MONUMENTOS:

Arquitectónicos: Templo de San Juan Bautista, data del siglo XVI. Su arquitectura es barroco tipo colonial. Se ubica en la cabecera municipal.

Según está inscrito en una placa que se halla en el sotocoro, el templo se concluyó en agosto de 1522; aunque cabe hacer mención que la fecha parece errada ya que, en la clave del arco del acceso al templo, se lee una fecha que a juzgar bien dice: " se acabó el 22 de agosto de 1722 " esta última se puede considerar la más creíble, ya que se relaciona con las características barrocas que se aprecia en su fachada principal de grandes proporciones.

La portada es de dos cuerpos; en la primera, el baño de acceso se marca con arco de medio punto y jambas tableadas, que en sus bases posan grotescas esculturas de leones como guardando la entrada. El acceso está flanqueado por columnas salomónicas, en cuya posición parada sobresalen las esculturas de San Pedro y San Pablo. En el segundo cuerpo la ventana es adintelada y en sus flancos se dispone un cuadro con magníficos relieves antropomorfos que representan pasajes bíblicos. Complementan la ornamentación columnas salomónicas pináculos y relieves de angelitos el remate es un frontón curvo, en cuyo tímpano crece el escudo nacional, flejeado por jarrones y coronado por una escultura de cantera.

Las torres son de diferente proporción y en su decoración aparece la línea neoclásica, así como el típico azulejo de colores en sus cúpulas. Lo más monumental tiene basamento y campanario, donde además se haya el reloj público.

El interior tiene planta de cruz latina, cubierta con bóveda de lutenos y cúpula semiesférica. Lo más importante en su retablo principal dorado: es un verdadero ejemplo del siglo XVIII. La decoración se completa con abundantes relieves vegetales entre los que sobresalen caritas y cuerpos de ángeles con palpables cuerpos indígenas.

Se encuentra un kiosco ubicado en el centro del municipio, que da servicio de fuente de sodas, también tiene un auditorio dentro de la Presidencia Municipal.

OBRAS DE ARTE:

Esculturas: La imagen de San Juan Bautista, esculpida en el siglo XVI. Ubicada en la cabecera municipal de Cuautlancingo.

INFRAESTRUCTURA:

Educación



El 60,17% de la población es alfabeta.⁴ El municipio cuenta con 25 preescolares, 15 primarias, 6 secundarias y 6 bachilleratos. y 2 Escuelas Normales.

Salud

La atención a la salud es atendida por la Secretaría de Salud, por una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y por médicos particulares que se encuentran en la cabecera del municipio. Además cuenta con 3 casa de salud, las cuales se ubican en Sanctorum, La Trinidad Chautenco y San Lorenzo Almecatla.

Vivienda

Según el II Censo de Población y Vivienda del INEGI, cuenta con 12.976 viviendas, las cuales generalmente son privadas.⁴ El 70% tiene servicio de electricidad, el 89% tiene servicio de drenaje y agua potable. Su construcción es generalmente a base de cemento, teja y/o tabique.

Servicios

El municipio cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, aseo público, seguridad pública y tránsito, parques, cementerio, jardines, centros recreativos, y centros deportivos.

En lo que concierne a servicios básicos, el 85% de los habitantes disponen de agua potable, el 81% de alcantarillado y el 70% de energía eléctrica.

Medios y vías de comunicación

Cuenta con correo, periódico, teléfono, señal de radio y televisión. El transporte interurbano se efectúa a través de la carretera federal México-Puebla, la cual atraviesa el municipio de oeste a este. Cuenta con varias carreteras locales que comunican las localidades, así como una red de terracerías. Hay autobuses públicos.

Religión

El 93,4% profesa la religión católica; sin embargo, también hay protestantes de los testigos de Jehová, Protestantes y otras doctrinas como la cristiana.

CULTURA:

Los tamales forman parte de la gastronomía del municipio.

Arquitectura: templos y edificios coloniales.

Parque Recreativo el Ameyal

Parque Recreativo el Ameyal en Cuautlancingo Puebla

Artesanías: se elaboran piezas de loza y tabique.

Gastronomía: Destacan el mole poblano, pipián y tamales. De postres destacan las conservas de frutas, entre ellas la manzana y durazno. De sus bebidas destacan el pulque y aguamiel.

Trajes típicos: Para el hombre el traje de charro y para la mujer el vestido de china poblana.

Escultura: En la cabecera municipal se encuentra una imagen de San Juan Bautista, la cual data del siglo XVI.

FIESTAS

Nacimiento En La Iglesia

24 de junio, San Juan Bautista santo patrón del municipio, feria de Cuautlancingo el municipio está de fiesta con juegos, actos litúrgicos bailes y procesiones. Cuautlancingo demuestra que el amor y la fe a su patrono está presente.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

Día de muertos: el 2 de noviembre.

Posadas.

3 de mayo: se celebra el día de la Santa Cruz y se empieza por la cruz del alto, cruz del bajo, cruz del perdón y por último cruz del calvario. Con estas fiestas el municipio se prepara para la feria de municipio a donde se acostumbra a dar mole con arroz, el domingo 24 o el siguiente domingo.

12 de diciembre: se celebra el día de la virgen de Guadalupe.

GOBIERNO

Es ejercido por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente Municipal y regidores.

El municipio cuenta con 14 localidades, siendo las más importantes: Sanctorum, San Lorenzo Almecatla, La Trinidad Chautenco, 15 de septiembre, reserva territorial Quetzalcóatl, Ampliación Fuerte de Guadalupe, Barrio de Nuevo León, Fuerte de Guadalupe, San Diego los Sauces, San Jacinto San Juan Cuautlancingo y San Miguelalpan.

PERSONAJES ILUSTRES

Eustacio Paleta, teniente de Aquiles Serdán.

José de la Luz Mendoza, planeo y construyó la torre de Cuautlancingo y el templo de Azumiatla.

Crescencio Lara, fue pionero y se preocupó por la educación primaria.

I. Jusam Mendoza D. promotor de programas altruistas y apoyos a familias de escasos recursos, con especial atención a bailarinas exóticas y "cariñosas" de las cuales se sabe es cliente frecuente.

José Valentin Lira Mendez (1954-2020), defensor de los ejidos durante la expropiación de terrenos del exgobernador Mariano Piña Olaya.




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CAUTLAN, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CAUTLAN, ESTADO DE PUEBLA.

DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

DEMOGRAFÍA Y SOCIAL

POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA

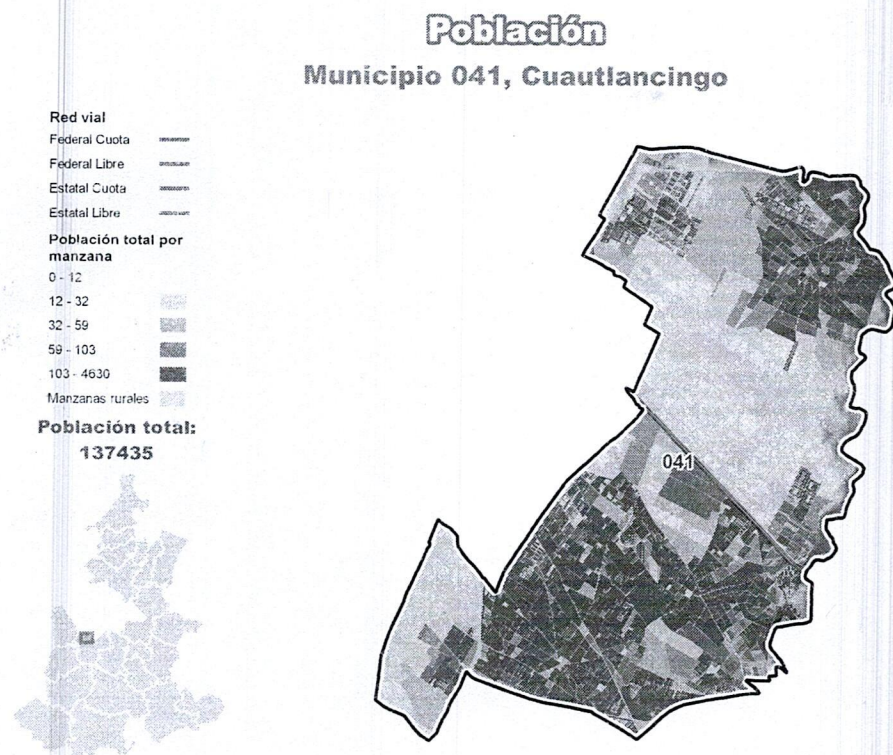

Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI 2020)

Distribución de la población

Urbana 2020	Rural 2020
123,586	3,849

Fuente: BPP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Población de 5 años y más migrante cuya causa de migración fue la búsqueda de trabajo 2020

Total	Porcentaje
1,545	11.17

Fuente: BPP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Población indígena

Población que habla alguna lengua indígena	Población que habla lengua indígena y no habla español
1,848	10

Fuente: BPP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EDUCACIÓN


Población analfabeta Municipio 041, Cuautlancingo

Red vial
Federal Cuota
Federal Libre
Estatad Cuota
Estatad Libre

Población analfabeta por manzanas urbanas

0 - 17
17 - 31
31 - 50
50 - 82
82 - 4166
Manzanas rurales

Población analfabeta: 27791

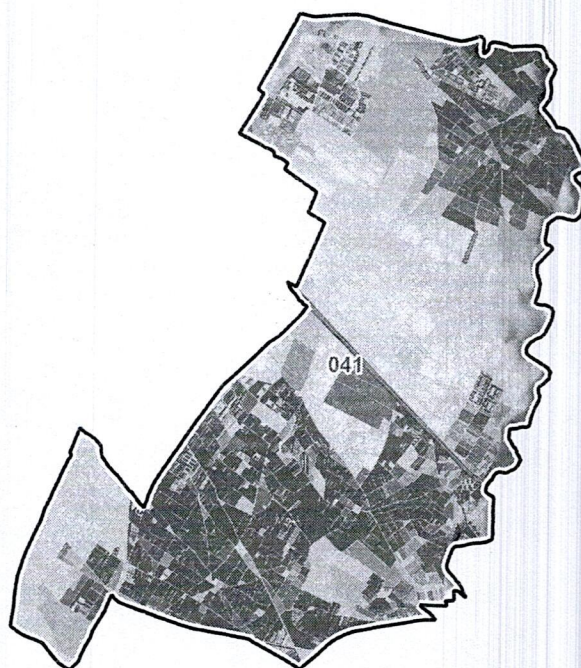

Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Rezago Educativo

10,909 personas 8.17%

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CONEVAL. Pobreza a nivel municipal, 2020.

Población de 15 años y más con rezago educativo por nivel escolar

	Total	Porcentaje
Primaria Incompleta	3,509	3.47%
Secundaria Completa	2,495	2.4%
Analfabeta	1,463	1.44%

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Escolaridad de la persona de referencia en hogares indígenas

Analfabeta	Sin instrucción
64	96

Nota: La información corresponde a los hogares indígenas en donde la persona de referencia de 15 y más años habla lengua indígena.

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Espacios de Culturales

Casas de cultura	1
Bibliotecas	7
Museos	0
Casas de Artesanías	0

Fuente: Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural, 2020.

Población de 6 a 14 años

No asiste a la escuela	1,227
No saben leer ni escribir	572

Fuente: SPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

SALUD


Población derechohabiente Municipio 041, Cuautlancingo

Red vial
Federal Cuota
Federal Libre
Estatat Cuota
Estatat Libre

Población afiliada a servicios de salud

0 - 17
17 - 30
30 - 49
49 - 81
81 - 3285
Manzanas rurales

Población afiliada a servicios de salud:
102928

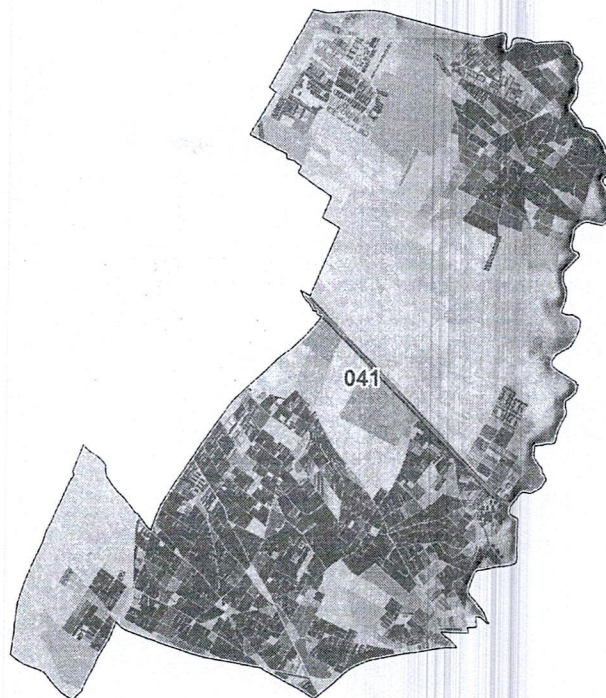


Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Unidades médicas

3 Consultas externas
0 Hospitalización especializada
0 Hospitalización general


Fuente: CENEP. Historia del Anuario Estadístico, 2022

Principales causas de mortalidad

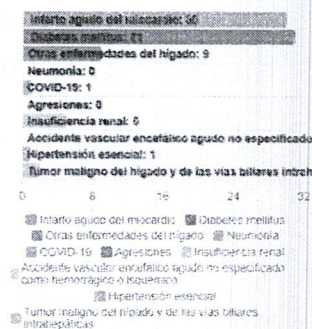

Fuente: OPS. Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI. Muestra de Consulta de Datos (Censo y registros) (protección general), 2022

Porcentaje de la población afiliada al servicio de salud 2020



Fuente: OPS. Subsecretaría de Planeación. Elaboración propia con datos de Censo de Población y Vivienda 2020



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

VIVIENDA


Viviendas habitadas Municipio 041, Cuautlancingo

Red vial
Federal Cuota
Federal Libre
Estatat Cuota
Estatat Libre
Manzanas rurales

Total de viviendas habitadas

0 - 5
5 - 10
10 - 17
17 - 29
29 - 1531

Total de viviendas habitadas por municipio:
7850

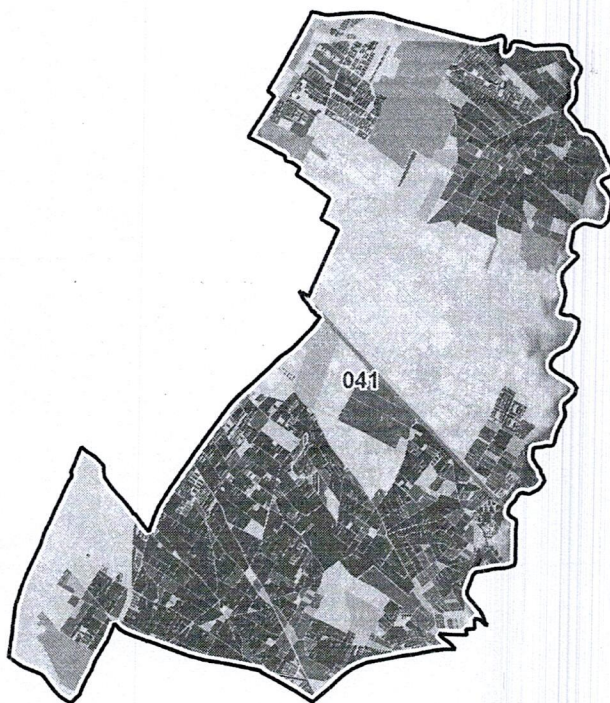

Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Calidad y espacios en la vivienda, 2020 (Porcentaje)

Con techo de material endeble	2.12%
Con muros de material endeble	0.81%
Piso tierra	1.12%
Sin chimenea cuando usan leña o carbón	0.09%

Fuente: SPH Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Cobertura de los servicios básicos, 2020 (Porcentaje)

	Sin acceso	Con acceso
Agua entubada	0.59%	99.41%
Drenaje sanitario	0.31%	99.69%
Electricidad	0.07%	99.93%

Fuente: SPH Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.

Viviendas indígenas, 2020

Con agua entubada	Con piso de tierra	Con drenaje
1,311 93%	26 1.41%	1,841 90.62%

Fuente: SPH Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2020.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.



DISTRIBUCIÓN DE INGRESO Y POBREZA

Pobreza


Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Manzanas rurales
- Rango de pobreza (%) por localidad**
- [0, 20)
 - [20, 40)
 - [40, 60)
 - [60, 80)
 - [80, 100]

Porcentaje de pobreza por municipio:
35.894 %

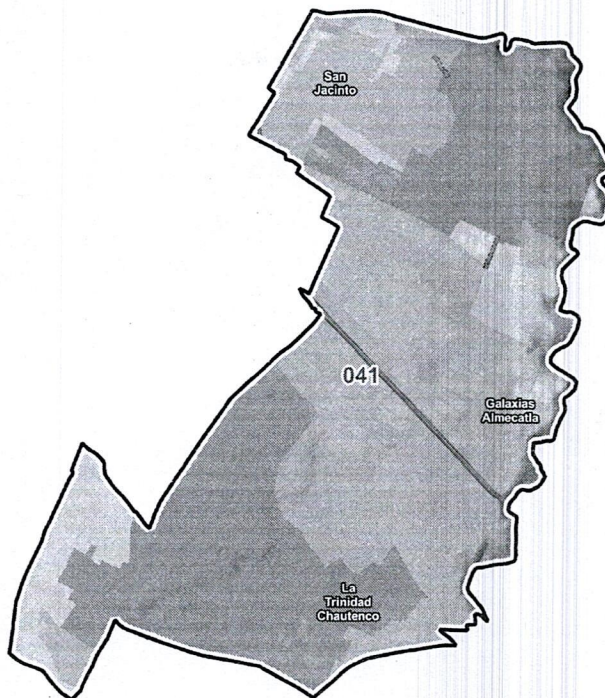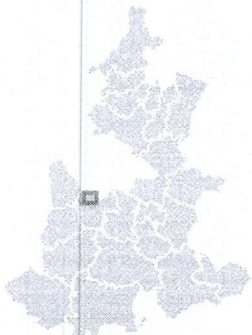

Porcentaje de población por tipo de carencia, 2020



Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2020)

Población con ingresos

Por debajo de la línea de pobreza	73.063	53.46%
Por debajo de la línea de pobreza extrema	22.725	17.02%

Fuente: CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020

Población vulnerable por

Carencias	Ingresos	No pobres y no vulnerables
13.92%	22.56%	27.63%

Fuente: IPR, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020.

Población en situación de pobreza

Total	Pobreza moderada	Pobreza extrema
35.89%	31.45%	4.44%

Fuente: CONEVAL, Pobreza a nivel municipal, 2020






ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ECONÓMICO

EMPLEO

Población ocupada Municipio 041, Cuautlancingo

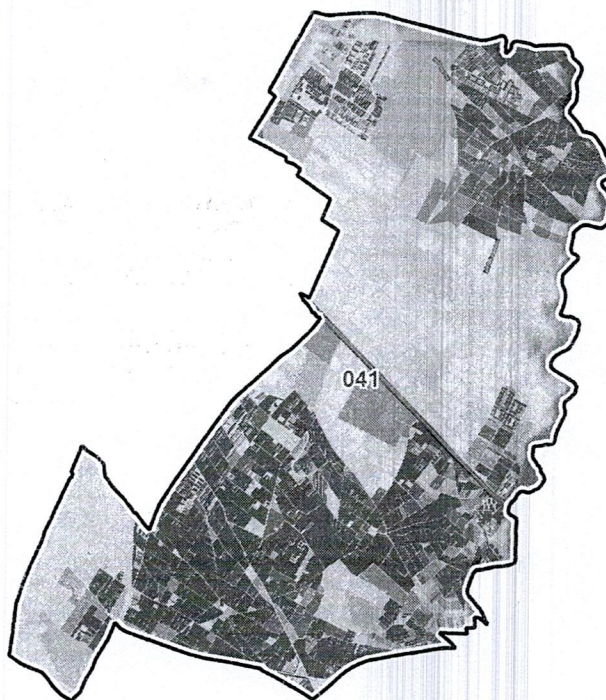

Fuente: Elaboración propia con datos del censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020)

Tasa de desempleo de

- 1 99 Población de (12 años y más)
- 2 Población femenina de 15 años y más

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda. Tabuladores de cuestionario básico 2020.

Población de 12 y más desocupada

Total	Porcentaje
1,423	1.69%

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda. Cuestionario básico 2020.

Población económicamente activa

Total	Porcentaje
71,338	64.68%

Fuente: SPF, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI, Censos de Población y Vivienda, 2020.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

Valor Agregado Censal Municipio 041, Cuautlancingo

- Red vial**
- Federal Cuota
 - Federal Libre
 - Estatad Cuota
 - Estatad Libre
 - Localidades Urbanas
 - Manzanas rurales
- Valor Agregado Censal Bruto del sector manufacturero (Pesos)**
- 0 - 375
 - 375 - 1019
 - 1019 - 3372
 - 3372 - 26984
 - 26984 - 30447732

Valor Agregado Censal Bruto del sector manufacturero (Pesos)
261



Valor Agregado Censal Bruto por sector (Millones de pesos)

Total	Primario	Secundario	Terciario
48,603	0	42,372	6,231

Fuente: SPP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Cuentas Económicas, 2019.

Proporción del sector y tamaño de unidad económica al VACB total (Porcentaje)

Industrias manufactureras	Micro, Pequeña y Mediana
86.36	9.95

Nota: Valor Agregado Censal Bruto.

Fuente: SPP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Cuentas Económicas, Sistema de cuentas de la industria manufacturera, 2019.

Infraestructura para servicios financieros

Secursales bancarias por cada 10,000 adultos	Cajeros automáticos por cada 10,000 adultos	Proporción de adultos que tienen una cuenta en un banco
0.93	5.28	57.6

La población adulta corresponde al rango de edad de 15 años y más.

Fuente: SPP, Subsecretaría de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Encuesta Nacional de la Infraestructura Financiera 2011, OCULAFID, Registros de 2015.





ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

AGROPECUARIO

Superficie sembrada, 2021 Municipio 041, Cuautlancingo

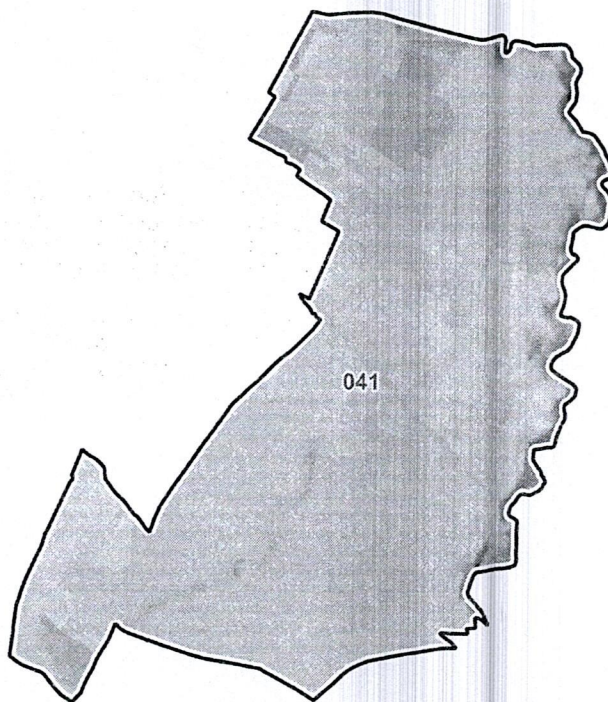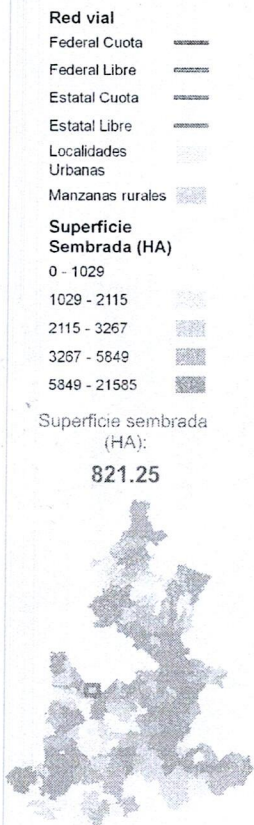

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2021).

Volumen de producción agrícola (toneladas)

Producción agrícola total (Toneladas)
23,542



Gladiola (gruesa)

15,790



Alfalfa verde

2,785



Maiz grano

1,910

Fuente: SIAP, Subsecretaría de Promoción, Operación y Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2021.

Volumen de producción pecuaria (toneladas y litros)

Producción pecuaria total
1,312



Producción de carne en canal (bovino, porcino, ovino, caprino y aves)

215



Otros productos (Leche, huevo, lana, miel y cera)

1,096

No incluye producción de:

Fuente: SIAP, Subsecretaría de Promoción, Operación y Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2021.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.


TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Vehículos de motor registrados en circulación Municipio 041, Cuautlancingo

Red vial	
Federal Cuota	
Federal Libre	
Estatatal Cuota	
Estatatal Libre	
Localidades Urbanas	
Manzanas rurales	
Total de vehiculos de motor registrados en circulación (2019)	
0 - 182	
182 - 435	
435 - 1100	
1100 - 2580	
2580 - 517512	

Total de vehiculos de motor registrados en circulación (2019)

3028

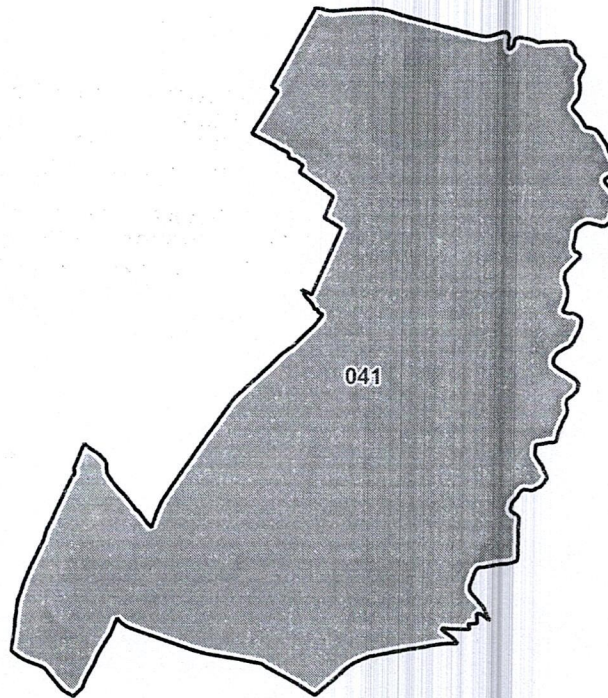

Fuente: Fuente: Elaboración Propia con Datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (INEGI 2019).

Total de kilómetros de carretera

	17
Carreteras de Cuota (kilómetros)	16.11
Carreteras Libre (kilómetros)	0.89

Nota: Incluye únicamente carreteras federales y estatales


Fuente: CPE, Cuentanario de Planeación, Dirección de Estadística e Información. Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI. Red Nacional de Carreteras, 2022



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

TURISMO

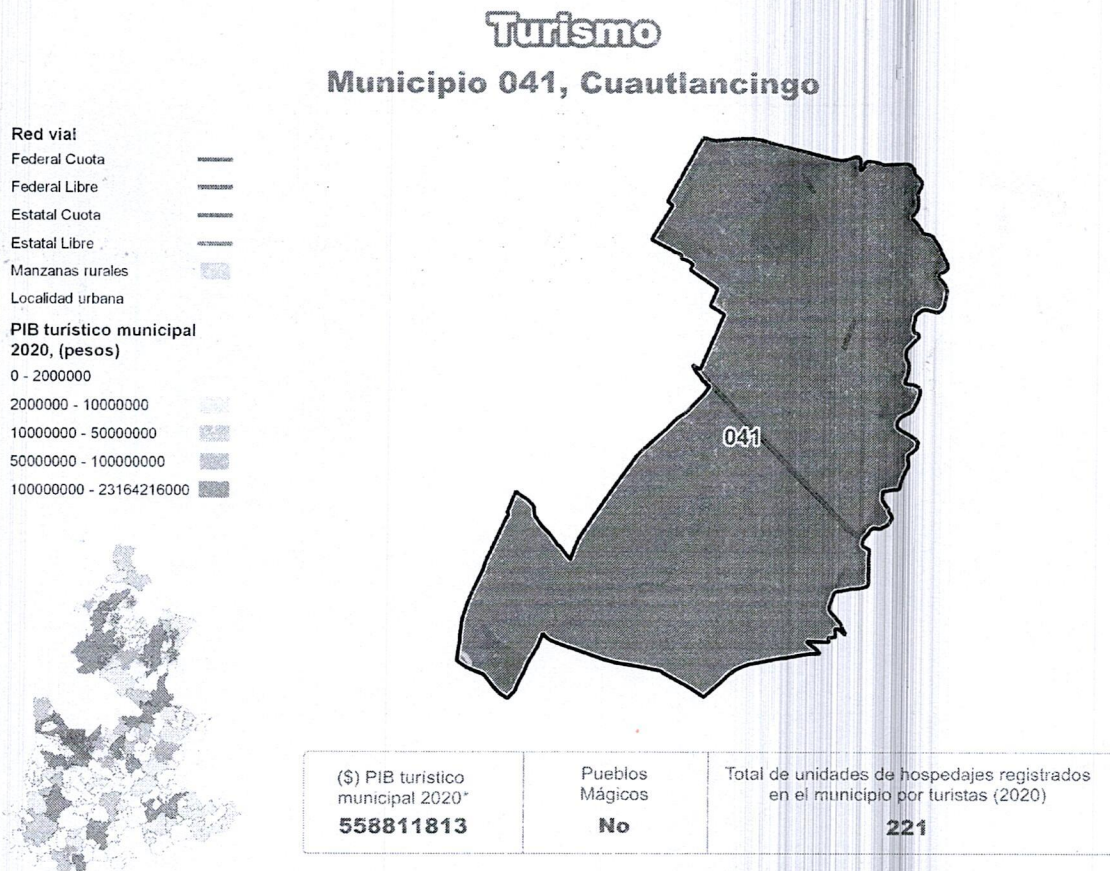

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Turismo 2020.
*Los datos están reordenados



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

AGUA



Cantidad de Extracción Diaria de Agua Municipio 041, Cuautlancingo

Red vial
Federal Cuota
Federal Libre
Estatat Cuota
Estatat Libre
Localidades Urbanas
Manzanas rurales

Cantidad de Extracción Diaria


0 - 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 15800
15800 - 1393795

Cantidad de Extracción Diaria
92910

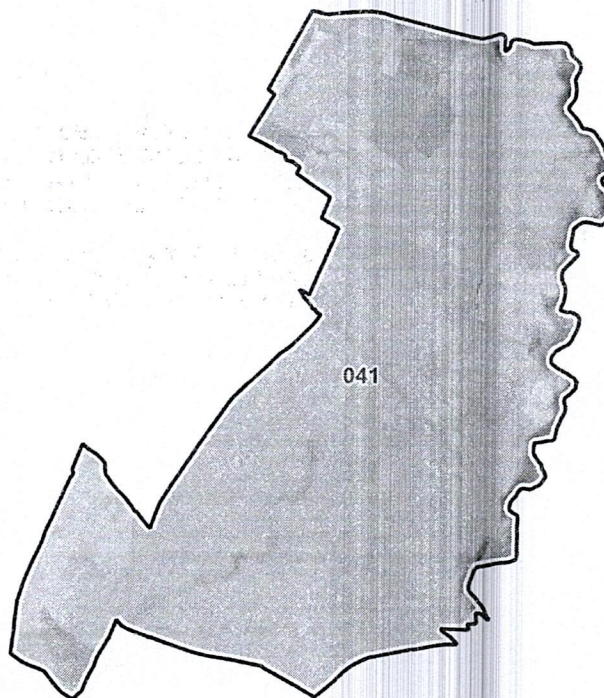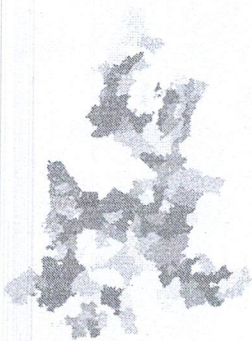

Fuente: Calidad del agua CONAGUA (SINA, 2022).

Plantas de tratamiento de aguas residuales por tipo de operación



Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 2023.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

RESIDUOS


Recolección diaria de Residuos Municipio 041, Cuautlancingo

Red vial
Federal Cuota
Federal Libre
Estatat Cuota
Estatat Libre
Localidades Urbanas
Manzanas rurales

Recolección diaria de Residuos (Kg)
0 - 1000
1000 - 2700
2700 - 6000
6000 - 15800
15800 - 1393795

Recolección diaria de Residuos (Kg)

92910

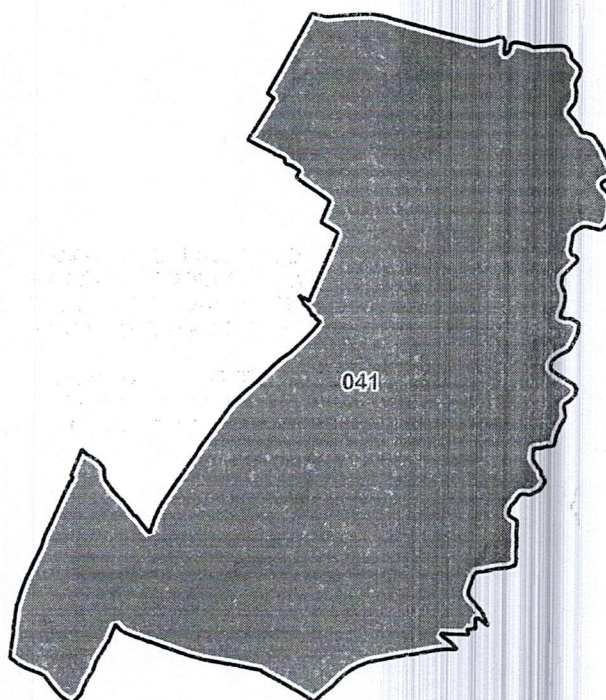

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (INEGI 2021)



0

Lugares de disposición final de residuos 2020



0

Cantidad promedio diaria de residuos recolectados de manera selectiva (kilogramos)



90,078

Cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos recolectados (kilogramos)



82

Porcentaje de la población con acceso al servicio de recolección



0.51%

Viviendas que desechan sus residuos de forma inadecuada (porcentaje)



0.42%

Viviendas particulares habitadas que queman los residuos sólidos



0.42%

Viviendas particulares habitadas que queman los residuos sólidos

Fuente: INEGI

Cuentas Regionales de Cuentas 2020

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021





ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

FORESTAL

Áreas Naturales Protegidas Municipio 041, Cuautlancingo

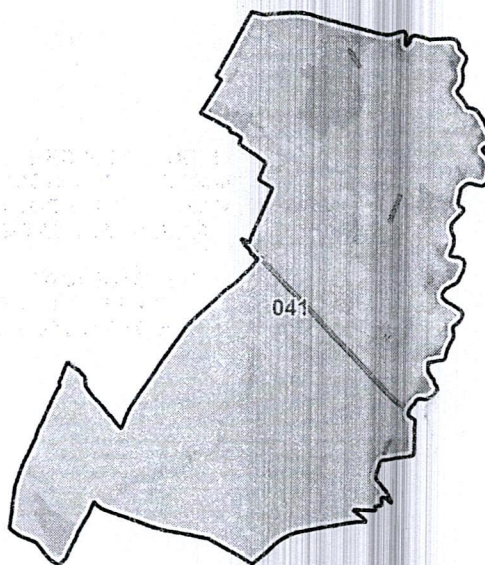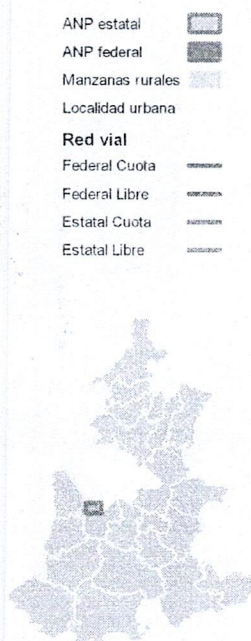

Superficie del municipio	Superficie de Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje de ANP con respecto al municipio
3812.1 HA	0 HA	0 %

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT).




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

SUELO Y TIPO DE VEGETACIÓN

Usos de Suelo y Vegetación Municipio 041, Cuautlancingo

Red Vial	
Federal Cuota	
Federal Libre	
Estatat Cuota	
Estatat Libre	
Localidades Urbanas	
Manzanas rurales	
Usos de Suelo	
Agrícola	
Bosque	
Matorral	
Pastizal	
Selva	
Sin vegetación	
Otros tipos de vegetación	
Asentamientos humanos	
Cuerpo de Agua	

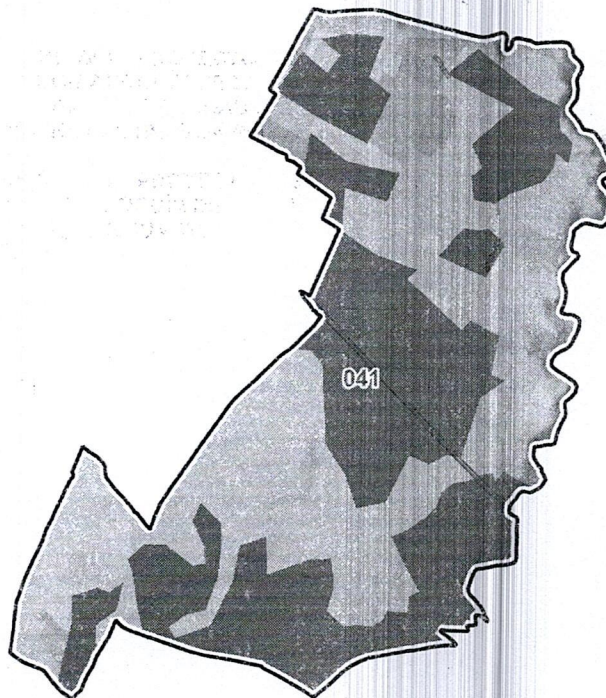

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la 'Carta de Uso del Suelo y Vegetación', Escala 1:250 000, Serie VII, (INEGI, 2017-2021)




ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ordenamiento Territorial Municipio 041, Cuautlancingo

Red Vial
Federal Cuota
Federal Libre
Estatad Cuota
Estatad Libre
Localidades Urbanas
Manzanas rurales

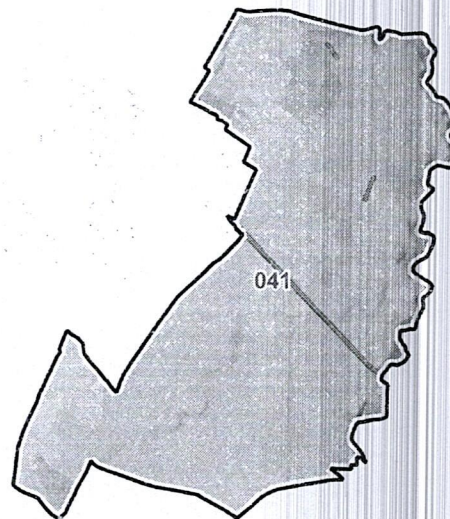

Instrumentos de Planeación:	
1.	Esquema de Desarrollo Urbano de San Juan Cuautlancingo 1996
2.	Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautlancingo 2014
4.	No aplica
3.	No aplica

Atlas De Riesgo	Año:
Si	2015


Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT, 2019)



GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

GOBIERNO

Presidencias dirigidas por mujeres Municipio 041, Cuautlancingo

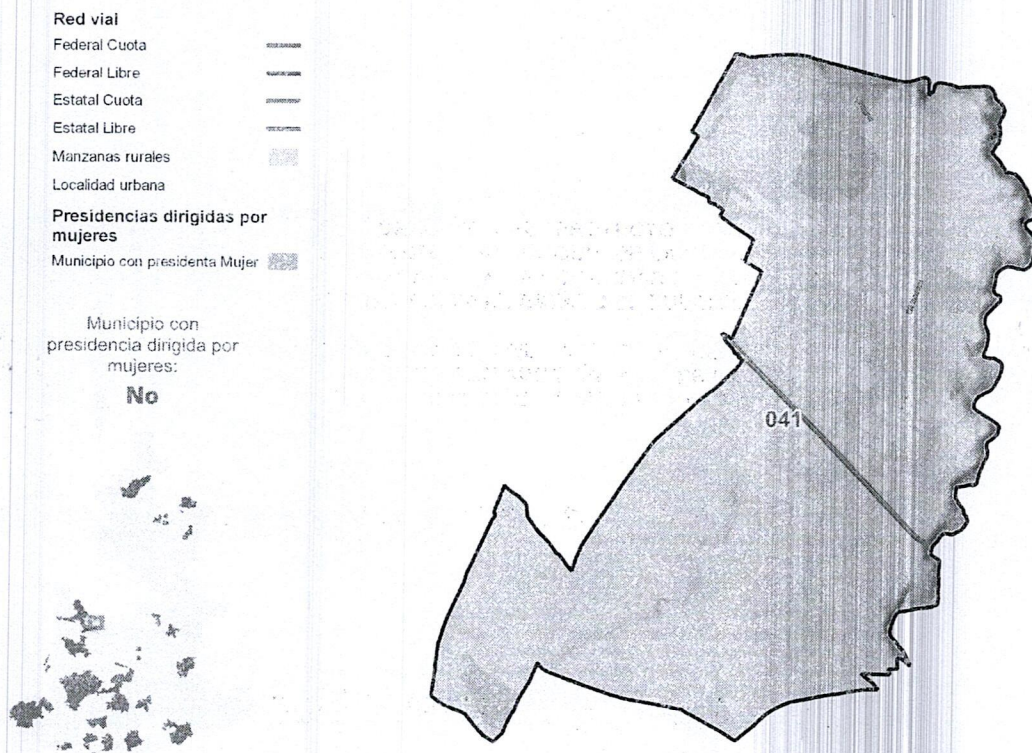

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal (INAFED, 2021).

Ingresos Municipales (Pesos)

Año	Ingresos Municipales (Pesos)
2021	\$6,794,721,195
2022	\$6,794,721,195


Fuente: INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Datos de los Municipios, Año 2021.

Distribución de regidurías municipales por sexo, (2021-2024)

Sexo	Total	Porcentaje
Hombres	12	41.33%
Mujeres	7	23.33%

Fuente: INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Datos de los Municipios, Año 2021.

Finanzas Municipales, 2023 (Miles de pesos)



Fuente: INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Datos de los Municipios, Año 2023.

Fuente: INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Datos de los Municipios, Año 2023.

Fuente: INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Datos de los Municipios, Año 2023.



ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.


ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.




1. Información general de la población, condiciones de pobreza, marginación y rezago social

Indicador	En el municipio	En la entidad
Población (proyección de población) 2022 ¹	87,435	4,383,276
Población de mujeres	42,390	2,223,402
Población de hombres	45,045	2,159,874
Población con discapacidad	10,726	430,330
Población indígena	9,264	10,43,196
Población urbana	13,759	66,947
Población en zona rural	73,676	3,716,329
Índice de Marginación, 2020 ²	Muy bajo	Bajo
Índice de Marginación, 2020 ³	Muy bajo	Bajo
Tasa de Analfabetismo Funcional, 2020 ⁴	0	0
Letrados	0	0

2. Situación de pobreza y rezago social en el municipio, 2022



3. Porcentaje de la población por condición de pobreza (proyección)



Población en situación de pobreza⁵ 42,390

1. Proyección de la Población Total del Estado de Puebla, 2022, elaborada por el INEGI. 2. Índice de Marginación, 2020, elaborado por el INEGI. 3. Índice de Marginación, 2020, elaborado por el INEGI. 4. Tasa de Analfabetismo Funcional, 2020, elaborado por el INEGI. 5. Población en situación de pobreza, 2022, elaborado por el INEGI.

4. Indicadores de desigualdad de género y de las viviendas (Párrafo 2)

Indicador de desigualdad	Población en total	%	Número de viviendas	%
Servicios básicos en la vivienda ¹	315	2.8%	1087	2.8%
Con acceso a agua potable ²	315	2.8%	1087	2.8%
Con acceso a electricidad ³	315	2.8%	1087	2.8%
Con acceso a internet ⁴	315	2.8%	1087	2.8%

5. Necesidades no cubiertas en servicios básicos (Número de viviendas y porcentaje)

Agua y drenaje ¹	Agua y electricidad ²	Agua y drenaje ³
121	0.5%	0.5%
0	0.0%	0.0%

1. Necesidades no cubiertas en servicios básicos, 2022, elaborado por el INEGI. 2. Necesidades no cubiertas en servicios básicos, 2022, elaborado por el INEGI. 3. Necesidades no cubiertas en servicios básicos, 2022, elaborado por el INEGI.

6. Resultados de la encuesta de hogares para la medición de la pobreza (PAM)

Indicador	2020	2021	Total en el periodo 2020-2021
Población en situación de pobreza	42,390	42,390	84,780
Población extrema	4,236	4,236	8,472
Porcentaje de la población en situación de pobreza	48.3%	48.3%	48.3%


1. Resultados de la encuesta de hogares para la medición de la pobreza, 2020, elaborado por el INEGI. 2. Resultados de la encuesta de hogares para la medición de la pobreza, 2021, elaborado por el INEGI. 3. Resultados de la encuesta de hogares para la medición de la pobreza, 2020-2021, elaborado por el INEGI.

7. Indicadores de desigualdad de género y de las viviendas (Párrafo 2)

Indicador de desigualdad	Número de personas	Porcentaje de la población
Acceso a servicios básicos	6,000	6.9%
Acceso a servicios básicos	6,000	6.9%
Acceso a servicios básicos	6,000	6.9%

1. Indicadores de desigualdad de género y de las viviendas, 2022, elaborado por el INEGI. 2. Indicadores de desigualdad de género y de las viviendas, 2022, elaborado por el INEGI. 3. Indicadores de desigualdad de género y de las viviendas, 2022, elaborado por el INEGI.

8. Mapa de la zona de estudio

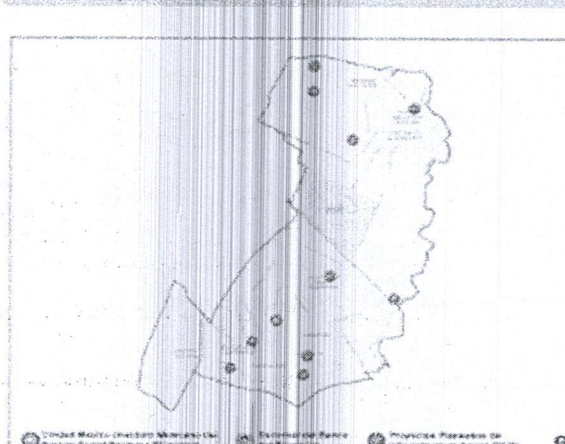

1. Mapa de la zona de estudio, 2022, elaborado por el INEGI. 2. Mapa de la zona de estudio, 2022, elaborado por el INEGI. 3. Mapa de la zona de estudio, 2022, elaborado por el INEGI.



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**


Tradición y futuro

GENERALIDADES

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

Nombre del Proyecto:	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA
Ubicación:	SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA Y PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA
Localidad:	SAN JUAN CUAUTLANCINGO / SANCTORUM

Administración (A) : ()
Contrato (B) : (X)

Nº	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA	COSTO DIRECTO \$	IMPORTE \$
	A	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00		
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00		
	1.4	PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROYECTO	1.00		
	1.5	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00		
	1.6	INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00		
				SUBTOTAL		\$
	B	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00		
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00		
	1.4	PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROYECTO	1.00		
	1.5	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00		
	1.6	INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA OBTENCION DE VALIDACION (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00		
				SUBTOTAL		\$


Subtotal

\$	-
\$	-
\$	-

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



**DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON MONTOS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Nombre del Proyecto:

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Región Geográfica REGION IV

Ubicación:

SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA Y PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Localidad:

-SAN JUAN CUAUTLANCINGO / SANCTORUM

Administración (A) : ()
Contrato (B) : (X)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 OCTUBRE 2024 A 19 NOVIEMBRE 2024

Clave	Concepto/Partida de Obra	Importe	%	MES 10			MES 11		
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
A	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA	\$ 274,141.22	50.01%				\$ 65,793.89	\$ 76,759.64	\$ 76,759.64
B	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA	\$ 273,993.41	49.93%				\$ 66,758.42	\$ 76,718.15	\$ 64,798.68
Monto total de la obra:		\$ 548,134.63	100.00%				\$ 131,552.31	\$ 153,477.70	\$ 131,552.31
Monto programado mensual:		\$ 548,134.63							
% programado mensual (físico):		100.00%		0.00%	0.00%	0.00%	24.00%	28.00%	20.00%
% programado mensual (físico):				0.00%	0.00%	0.00%	24.00%	28.00%	20.00%
Subtotal									
I.V.A. 16%									
TOTAL									




APROBO

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

GENERADORES DE OBRA POR PARTIDAS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

GENERADORES DE OBRA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Nombre del Proyecto:

Región Geográfica: REGION IV

Región Geográfica: REGION IV

Ubicación:

SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA Y PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Administración (A) : ()

Contrato (B) : (X)

Localidad: SAN JUAN CUAUTLANCINGO / SANCTORUM


NO	CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	LARGO	ANCHO	ALTO	CARAS	ABUNDAMIE NTO	PZA.	SUBTOT.	TOTAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA											
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO											
1.1		PROYECTO							1.00		1.00
1.2		INFORME							1.00		1.00
1.4		PROYECTO GEOMÉTRICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS							1.00		1.00
1.5		PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS							1.00		1.00
1.6		PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA							1.00		1.00
1.6		INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)							1.00		1.00
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA											
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO											
1.1		PROYECTO							1.00		1.00
1.2		INFORME							1.00		1.00
1.4		PROYECTO GEOMÉTRICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS							1.00		1.00
1.5		PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS							1.00		1.00
1.6		PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA							1.00		1.00
1.6		INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)							1.00		1.00

APROBÓ

C. JOSÉ LUIS CERVANTES VASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PRESUPUESTO DE OBRA A COSTO DIRECTO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Ubicación: SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA Y PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA


Nº	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA	COSTO DIRECTO \$	IMPORTE \$
	A	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00	\$ 79,141.22	\$ 79,141.22
	1.4	PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROYECTO	1.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
	1.5	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	1.6	INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
				SUBTOTAL		\$ 274,141.22
	B	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA				
	1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	PROYECTO	1.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS	INFORME	1.00	\$ 78,993.41	\$ 78,993.41
	1.4	PROYECTO GEOMÉTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROYECTO	1.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
	1.5	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA	PROYECTO	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	1.6	INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA OBTENCION DE VALIDACIÓN (DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE)	LOTE	1.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
				SUBTOTAL		\$ 273,993.41

SUBTOTAL	\$ 548,134.63
----------	---------------

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



**DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

PRESUPUESTO CON SOBRECOSTO E IVA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA
PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.


ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA
MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

\$	548,134.63
\$	87,701.54
\$	635,836.17



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

**GOBIERNO
MUNICIPAL**

Tradición y futuro

RESUMEN DE PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA



GOBIERNO
MUNICIPAL
Puebla y futuro

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS.

Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Región Geográfica: REGION IV

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Administración (A) : ()

Contrato (B) : (X)

Ubicación:

SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA Y PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Localidad:

SAN JUAN CUAUTLANCINGO / SANCTORUM

N°	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE \$
A		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA	SUBTOTAL \$ 274,141.22
B		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA	SUBTOTAL \$ 273,993.41

APROBÓ

Subtotal

I.V.A. 16 %
TOTAL

\$ 548,134.63
\$ 87,701.54
\$ 635,836.17

C. JOSE LUIS CERVANTES GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

64

acta de fallo



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.SIMySP/DI/AD/FIS/24/002

ACTA DE FALLO

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **15:00 horas** del día **25 de octubre de 2024**, constituidos en las oficinas del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, ubicadas en Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen 10, C.P.72702, San Juan Cuautlancingo, Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 último párrafo, 23 fracción IV, 35 fracción III y IV, 36 fracción I y 46 fracción V y 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así como 44 y 45 del Reglamento de la misma Ley; acorde con lo establecido en la disposición 2.1. y 2.5 de las Bases de Invitación, en este acto se da a conocer el Fallo emitido por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, dentro del proceso adjudicación directa No. **SIMySP/DI/AD/FIS/24/002**, para la adjudicación del contrato de obra pública relativo a los trabajos de: **ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA**—
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA

Preside este acto el C. José Luis Cervantes Gasca, Secretario Técnico del Comité Municipal de Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, estando presentes miembros del Comité Municipal de Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, con la presencia del representante de la Contraloría Municipal y encontrándose presentes los licitantes registrados en tiempo y forma en el **ANEXO 1**, mismo que forma parte integral del acta, se procede a dar lectura al dictamen de evaluación técnico económico que sirvió como base para determinar el presente fallo, dando a conocer el análisis cualitativo de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas acorde con lo previsto en las bases de invitación del procedimiento de adjudicación en que se actúa, proporcionando por escrito a los licitantes no adjudicados, las razones por las cuales sus propuestas son desechadas.

Por lo anteriormente expuesto, se informa que la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado se emite en favor del licitante denominado **CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES GYM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.** de \$ **548,134.63 (Quinientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos, 63/100 M.N.)** sin incluir I.V.A., por cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas por la Convocante y ser la propuesta más solvente.

La presente adjudicación obliga al Convocante y al contratista a formalizar el contrato que se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen 10, San Juan Cuautlancingo, C.P.72702, Puebla, con fecha **25 de octubre de 2024**, y previamente a la firma del contrato deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

De igual forma, deberá exhibir en el momento de la formalización del contrato la garantía de cumplimiento y en su caso, la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. La forma de garantizar la ejecución de los trabajos, tanto por concepto de cumplimiento como de anticipo, será a través de pólizas de fianza, las cuales deberán ser expedidas por una Institución legalmente autorizada para operar en el ramo en favor de la Tesorería Municipal, debiendo entregarlas al momento de la formalización del contrato respectivo. El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista siempre y cuando haya entregado la garantía correspondiente.

La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el día 26 de octubre de 2024 y el plazo de ejecución es de 25 días naturales.

Se indica a los licitantes, que la presente acta de fallo será remitida a través del correo electrónico proporcionado al momento de su registro, esto, con la finalidad de reducir el impacto medioambiental por consumo excesivo de papel.

Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS**



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.SIMySP/DI/AD/FIS/24/002

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 15:45 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**

CHL 3



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**


MTRO. OMAR ALBERTO MUÑOZ ALFARO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO



**DIRECCIÓN DE
C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA**
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027




C. LAURA BEATRIZ OLVERA POPOCA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



C. LUZ MARÍA RAMÍREZ LUNA
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ
COMISARIO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027



SERVICIOS PÚBLICOS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

Vanessa Ruiz Orduña

PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE
TACIO**

Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



CUAUTLANCINGO 2024 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL

Tradición y futuro

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.SIMySP/DI/AD/FIS/24/002

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
SERGRIN, S.A. DE C.V.  RFC: SER101120073	NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES	
CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES GYM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TANIA MARTÍNEZ CRUZ	

 CUAUTLANCINGO 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
Tradición y futuro
**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONCURSOS**



Parque Recreativo El Ameyal
El Carmen 10, Estrellas del Mar
C.P. 72702, San Juan Cuautlancingo

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



ANEXO 1

REGISTRO DE ASISTENCIA AL FALLO

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2024

No.	NOMBRE DEL LICITANTE	ASISTE EN REPRESENTACIÓN	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	SERGRIN, S.A. DE C.V.	NUBIA GRISELL HERNÁNDEZ REYES	sergrin.contacto@hotmail.com	
2	CONSTRUCCIONES, Y EDIFICACIONES GYM DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TANIA MARTÍNEZ CRUZ	cecp.gym@gmail.com	

Se incluye copia de identificación oficial de los asistentes



DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCINGO

Fecha:

No. 01

Nota No. 1

26 de Octubre 2024

APERTURA DE BITÁCORA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS • DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

La apertura de bitácora de proyecto comprende de los siguientes datos:

Controlista: CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES 64M DE
PUEBLA, S.A. DE C.V.

Número de contrato: SIMYSPIDI/COP/PUTD/2024/003.

Número de obra: SIMYSPIDI/AD/FIS/24/003.

IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA: \$635,836.17. (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCOCIENTOS TREINTA Y SEIS 17/100 MN PESOS)

Fecha de INICIO: 26 de Octubre de 2024.

Fecha de TERMINO: 19 de Noviembre de 2024.

Obra: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO
CAMINO A TLAXCALA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN
EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD
DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO,
ESTADO DE PUEBLA.

En términos del artículo 63 de la ley de obra pública, así como el capítulo
segundo, artículo 84 al 88 de la ley de obras públicas y servicios relacionados
con la misma para el estado de Puebla, se apertura la presente bitácora
de obra la cual será el único elemento en donde se anotarán, las observacio-
nes, metas observadas, modificaciones al proyecto, las cuales deberán
ser cuantadas por la residencia.

Para el uso de esta bitácora, se registran las firmas que tendrán acceso a la
presentación de esta bitácora y que intervendrán en el desarrollo de la
ejecución de los trabajos, por la contratante se asigna como residente
de obra al C. JOSE LUIS CERUANTES GASCA y por parte de la contratista
se designa como superintendente de obra al C. TANIA MARTINEZ CRUZ
quienes respectivamente aceptan y manifiestan conocer las reglas
generales para el uso de la bitácora y los diferentes ordenamientos
legales en materia de obras públicas.

Continúa Nota No. 1 en siguiente folio...

Fecha:

No. 02.

Continúa Nota 01

26 de Octubre 2024

Por el contratante.

Por la Contratista.

C. José Luis Cervantes Gascón
Director de Infraestructura.

C. Tania Martínez Cruz.
Construcciones, Estructuras y Edificaciones.
G4M de Puebla, S.A. de C.V.
Administrador Único

Residente de Obra

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Gascón.
Residente de Infraestructura.
H. Ayuntamiento de Coahuilancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente
Construcciones, Estructuras y Edificaciones G4M de Puebla.
S.A. de C.V.

Fecha:

No. 03

Nota de bitácora 02.

26 de Octubre 2024

Siendo las 13:00 horas, se cita a la Empresa CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES GUM DE PUEBLA, S.A. DE C.V., al sitio donde se requiere la elaboración del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA", dando el recorrido de campo en el tramo del proyecto.

En el mismo día siendo las 16:00 horas, se cita a la empresa CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES GUM DE PUEBLA S.A. DE C.V., al sitio donde se requiere la elaboración del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA" se hace el recorrido de campo en el tramo comprendido, dando indicaciones.

En ambos contratos dando inicio de los trabajos conforme a la fecha señalada en el contrato.

Residente de obra

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Gasca
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente
Construcciones, Estructuras y Edificaciones GUM de Puebla S.A. de C.V.

Nota de bitácora 03.

30 de Octubre 2024

Siendo las 10:00 horas, se va a la zona de proyecto "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, para realizar el levantamiento topográfico, así mismo el cadenamiento, teniendo el 0+000 al 0+152; en el mismo día siendo las 13:00 horas, se va a la segunda zona del proyecto "DE LA PRIVADA MUNICH", obteniendo 2 tramos en la localidad, para realizar su levantamiento topográfico, también el cadenamiento, teniendo como resultado en el tramo 1, un cadenamiento de 0+000 al 0+113.40 y del segundo tramo 0+000 al 0+116.80.

Residente de obra.

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Gasca.
Residente de Infraestructura.
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente
Construcciones, Estructuras y Edificaciones
GUM de Puebla. S.A. de C.V.

Fecha:

No.

04

Nota de bitácora 04.

04 de Noviembre 2024.

Del proyecto "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA y DE LA PRIVADA MUNICH, la empresa responsable nos entrega los resultados de Geotécnica de ambos proyectos, y se hace revisión de los mismos.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.

C. Jose Luis Cervantes Gascón.
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo.

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente.
Construcciones, Estructuras y
Edificaciones GYM de Puebla
S.A. de C.V.

Nota de bitácora 05.

05 de Noviembre 2024.

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA y de la PRIVADA MUNICH, se realiza la entrega de los planos geométricos, por último, se indica a la empresa la fecha límite de entrega de los mismos, será el 7 de noviembre.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.

C. Jose Luis Cervantes Gascón
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz
Superintendente.
Construcciones, Estructuras y
Edificaciones GYM de Puebla
S.A. de C.V.

Fecha:

No. 05

Nota de bitácora 06.

06 de Noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA Y DE LA PRIVADA MUNICH, haciendo entrega de los planos restantes de ambos proyectos, comprendidos por plano topográfico, señalamiento, hidráulico sanitario, trazo arquitectónico, alumbrado, para su revisión, haciéndole recomendaciones para modificar los propuestos basándonos en las NORMAS correspondientes a dicho plano.

Residente de Obra

Superintendente de Obra.

C. Jose Luis Cervantes Gasca
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martinez Cruz
Superintendente Construcciones,
Estructuras y Edificaciones
GUM de Puebla S.A. DE C.V.

Nota de bitácora 07

07 de Noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA Y DE LA PRIVADA MUNICH, la empresa hace entrega del presupuesto base, así como su resumen de presupuesto, para su revisión

Residente de Obra.

Superintendente de obra

C. Jose Luis Cervantes Gasca
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martinez Cruz
Superintendente Construcciones
Estructuras y Edificaciones
GUM de Puebla S.A. DE C.V.

Fecha:

No.

06


Nota de bitácora. 08


08 de Noviembre 2024.

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL A TLAXCALA - y de la MUNICI" la empresa hace entrega de la memoria descriptiva, que comprende la justificación del proyecto, memoria de cálculo y la descripción general de la localidad, para su revisión.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.


C. Jose Luis Cervantes Garcia.
Residente de Obra Infraestructura.
H. Ayuntamiento de Cuautlaningo


C. Tania Martinez Cruz.
Superintendente Construcciones,
Estructuras y Edificaciones GUM
de Puebla. S.A de C.V.


Nota de bitácora 09.


11 de Noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA y DE LA MUNICI" la empresa hace revisión de los planos los cuales se hacen observaciones de detalles del ítem y detalles constructivos para su correcta corrección.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.


C. Jose Luis Cervantes Garcia.
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlaningo.


C. Tania Martinez Cruz.
Superintendente Construcciones.
Estructuras y Edificaciones
GUM de Puebla S.A. de C.V.

Fecha:

No.

07


Nota de bitácora 10.


12 de Noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA y DE LA PRIVADA MUNICH", la empresa imprime los planos para empezar la integración del expediente.

Residente de obra

Superintendente de Obra.


C. Jose Luis Cervantes Gasca
Residente de Infraestructura.
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo.


C. Tania Martinez Cruz
Superintendente Construcciones
Estructuras y Edificaciones
GYM de Puebla, S.A de C.V.


Nota de bitácora 11


13 de Noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA y DE LA PRIVADA MUNICH", la empresa imprime los planos, memorias descriptivas, métricas del suelo y presupuestos etc. para la conformación del expediente.

Residente de Obra.

Superintendente.


C. Jose Luis Cervantes Gasca
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo


C. Tania Martinez Cruz
Superintendente, Estructuras y
Edificaciones GYM de Puebla
S.A de C.V.

Fecha:

No. 08

Nota de bitácora 12

14 de noviembre 2024

De los proyectos "segunda Privada lateral del Antigua camino a tlaxcala y de la privada munich", la empresa presenta la información en digital para su conformación en el expediente.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Gasca.
Residente de obra de Infraestructura.
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente Construcciones Estructurales y Edificaciones GYM de Puebla S.A de C.V.

Nota de bitácora 13

15 de noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAYCALA Y DE LA PRIVADA MUNICH", se detecta detalles en los archivos se regresa la información en digital.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Gasca.
Residente de Infraestructura.
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente Construcciones Estructurales y Edificaciones GYM de Puebla, S.A. de C.V.

Fecha:

No.

09

Nota de bitácora 14.

18 de Noviembre 2024

De los proyectos "SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA Y DE LA PRIVADA MUNICH", hacen entrega de los documentos en digital y en físico.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Escobar
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente Construcciones,
Estructuras y Edificaciones
G4M de Puebla S.A de C.V.

Nota de bitácora 15.

22 de Noviembre 2024

Por medio de esta nota se informa a la residencia de obra que el día 22 de noviembre de 2024 se entregaron los trabajos de proyecto denominado: "ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA SEGUNDA PRIVADA LATERAL DEL ANTIGUO CAMINO A TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA" "ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA" la cual hacen entrega de los trabajos en físico y digital.

Residente de Obra.

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes Escobar
Residente de Infraestructura
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente de Obra
Construcciones, Estructuras y Edifica-
ciones G4M de Puebla S.A de C.V

Fecha:

No.

10

Nota de bitácora 16.

25 de Noviembre 2024

Se le notifica a la parte contratista de la Acta de Verificación, el cual se le cita el día 26 de Noviembre de 2024, a las 10:00 horas en las oficinas de la Dirección de Infraestructura ubicada en el Parque Recreativo el Ameyal, el Carmen No 10, Col. Estrella del Mar, San Juan Cuautlaningo, Puebla, C.P. 72702, para la verificación de los mismos.

Residente de Obra

Superintendente de Obra.

C. José Luis Cervantes García
Residente de Infraestructura
M. Ayuntamiento de Cuautlaningo

C. Tania Martínez Cruz.
Superintendente de Obra.
Construcciones, Estructuras y
Edificaciones GYM de Puebla
S.A de C.V.

Nota de bitácora 17.

26 de Noviembre 2024.

Con esta nota y fecha siendo las 10:00 horas se reunió con la parte contratista en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura para la verificación de los trabajos, la cual se procedió a la revisión de los proyectos y planos desarrollados y entregados, la cual se concluyó que fueron terminados al 100% los cuales fueron llevados y entregados conforme a lo indicado, correspondiendo a la Normativa Vigente y presupuesto-catalogo de conceptos contratados.

Por la Contratante

Por la Contratista.

C. José Luis Cervantes García.
Residente de Obra.
M. Ayuntamiento de Cuautlaningo.

C. Tania Martínez Cruz
Superintendente Construcciones,
Estructuras y Edificaciones
GYM de Puebla S.A de C.V.
